

12-3

시민중심 자족도시

행정지원과 인사팀

시장직속 시민사회소통관 신설

추진상황	검토/추진/ 완료 /지속추진	사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 시 <input type="checkbox"/> 기타	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후

1 사업개요

○ 시민사회소통관 임용

- 신 분: 시간선택제임기제(나급^{6급} 상당) 공무원
- 인원: 1명

○ 기구표




○ 시민사회소통관 주요직무

- 현장민원 및 민생현안에 관한 사항, 시장 직소민원 상담 운영
- 주요 갈등 및 위기관리 조정 등

2 추진성과 및 계획

○ 주요추진성과



* 향후, 시민사회소통관 역할의 확대·강화 필요 시, 조직개편(부서 신설) 방안 검토

○ 연차별 목표 및 실적

공약달성을 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
시민사회소통관 임용	계획	시민소통관 임용				
이행완료도	실적	임용완료				
완료	달성도%	100				

3 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
270	270	270	30	60	60	60	60			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
270			270							

4 향후계획

○ 시민사회소통관 임용

- 최종 합격자 대상으로 신원조회 실시 후 임용완료

공약사항 정책실명제	주관부서	자치행정과	과 팀 주 무	장 장 관	이 학 임 이	현 공 현 수	940 - 4100 940 - 4128 940 - 4123
---------------	------	-------	------------------	-------------	------------------	------------------	--

12-8-①

시민중심 자족도시

공공건축과 공공건축건립1팀

조리읍 행정복지센터 조기 증축 완료

추진상황	검토/추진/ 완료 /지속추진	사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 시 <input type="checkbox"/> 기타	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후

1 사업개요

- 위 치: 조리읍 봉일천로 64(봉일천리 188-6, -9)
- 사 업 량: 연면적 4,581.69m²(지하 1층 / 지상 4층)
- 사 업 비: 145억원(건축비 133, 기타부대비 등 12)
- 사업기간: 2019. 5. ~ 2022. 8.

2 추진성과 및 계획

- 주요추진성과
 - '19. 4. 지방재정 투자사업 심사
 - '19. 9. 건축설계공모
 - '19. 11. 중기지방재정계획 반영
 - '20. 5. 지방재정투자 재심사
 - '20. 10. 기존 청사 철거
 - '20. 12. 공사 착공
 - '22. 8. 공사 준공

- 연차별 목표 및 실적

공약달성을 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
조기 준공	계획	준공				
이행완료도	실적	완료				
완료	달성도%	100%				


3 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
15,000	14,524	3,346	3,346					

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	기타	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
14,524			13,924	600	4,467	4,467				

4 관련자료

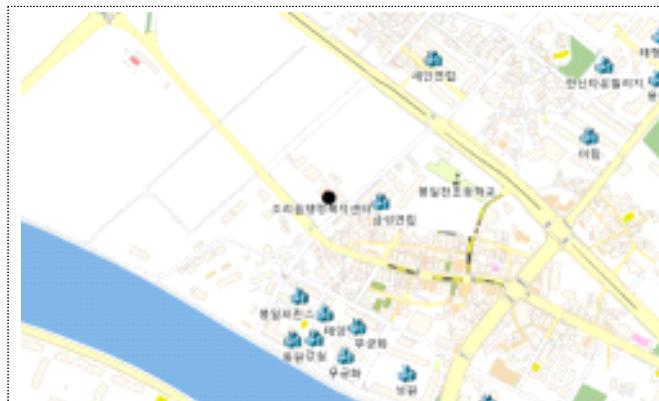

위치도



조감도

5 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과 팀 주 무	장 장 관	최 이 정 영	정 정 훈	석 현	940 - 5270 940 - 5278 940 - 5276
---------------	------	-------	------------------	-------------	------------------	-------------	--------	--

12-8-②

시민중심 자족도시

공공건축과 청사건립TF팀

광탄면 행정복지센터 증축 조기 증축 완료

추진상황	검토/추진/ 완료 /지속추진	사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 시 <input type="checkbox"/> 기타	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후

1 사업개요

- 위치: 파주시 광탄면 혜음로 1044 / 대지면적 6,611m²
- 시설규모: 연면적 1,194m², 지상2층, 주차48대
- 주요시설: 주민자치센터, 창고
- 사업기간: 2021. 1. ~ 2022. 8.
- 사업비: 38.88억원(시비)

2 추진성과 및 계획

- 주요추진성과
 - '19. 8. 경기도 지방재정 투자심사 승인
 - '19. 12. 공유재산관리계획 승인
 - '20. 11. 설계공모 공고
 - '21. 9. 기본 및 실시설계 완료
 - '21. 12. 공사착공
 - '22. 8. 공사완료
 - '22. 12. 시설개선 공사
- 연차별 목표 및 실적

공약달성을 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
준공	계획	준공				
이행완료도	실적	준공				
완료	달성을%	100%				

3 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
3,288	3,888	2,858	2,858							
3) 확보금액										
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,888			3,888		2,831	2,831				

4 관련자료



위치도



현장사진

5 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과 팀 주 무	장 장 관	최 정 석 박 선 민 양 호 성	☎ 940 - 5270 ☎ 940 - 5757 ☎ 940 - 5754
---------------	------	-------	------------------	-------------	---	--
