

## 1. 발전계획 총괄



### 기본현황(2016년 12월말 기준)

- 인구 : 89,767명(남 45,489, 여 44,278)
- 학령인구
  - 초등(6개교) : 5,611명
  - 중등(3개교) : 2,722명
  - 고등(2개교) : 2,309명
- 노인인구(65세 이상) : 9,556명

### 산업구조 : 177개 기업체(2,477명 근무)

### 공공시설

- 동주민센터(45명)
- 경찰서(241명), 지구대(40명)
- 119안전센터(20명)
- 학교(교직원 827명)

### 지역특성

- 시청 소재지로 행정·경제의 중심지
- 도시와 농촌이 공존하는 도농복합지역

### 발전방향 : 행정·경제의 중심

- 지역연계 교통망 확충
- 도시 재생사업
- 주민의 삶의 질 향상

## 추진사업

### 1단계

- 완료) GTX 파주연장(16.6.27 국가철도망 구축계획 반영)**  
- 고양 킨텍스~운정(6.1km / 4,400억원) → 지속관리
- 완료) 서울-문산 고속도로 건설(2015.10.30 착공)**  
- 금촌IC 설치 / '16년 보상, '17년 공사추진
- 완료) 제2외곽순환도로 금촌IC 설치(실시설계 미반영)**  
- 김포~파주 구간 실시설계 승인 후 보상, 착공
- 금촌천 생태복원(17년 준공)**  
- 금촌 제1교~공릉천(1.9km, 260억원)
- 전통시장 활성화(17년 완료)**  
- 고객센터 건립('16년, 7억원), 문화관광형 시장 육성(18억원)
- 완료) 스타디움 보조구장 인조잔디 교체(15.5.27)**
- 완료) 금촌1동 주민센터 공간부족 문제해결(16.11.14 주차장조성)**
- 일몰) 경의선 고가하부 체육시설 조성(주변 유사시설 중복)**
- 완료) 금촌택지 중앙보행로 개선(15.4.20 / 1.2km)**
- 완료) 금촌2동 주민쉼터 조성(16.4)**
- 금촌동 들레길 및 커뮤니티 숲 조성(18년 완료)**  
- 면산~월롱산~들녘~학령산길(21km), 커뮤니티 공간 조성
- 문산제일고 통학로 개선(17년 완료)**  
- 통로박스 개선 완료('15년), 통학로 정비('17년)
- 완료) 금빛로 거리 활성화(15.12 완료)**  
- 걷고싶은 거리 조성, 청소년 북카페 설치
- 파주병원 시설개선(17년 검진센터 신축)**  
- 음압병상 설치, 건강검진센터 신축, 주차장 조성 / 166.5억원
- 금촌문화체육센터 건립(18년 착공)**  
- 스포츠센터, 문화시설 등(지하3층, 지상7층 / 438억원)

### 2단계

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>완료) 금촌역 앞 도시계획 정비</li> <li>일몰) 공릉천 내 체육공원 조성</li> <li>완료) 김산동 사격장 소음해결</li> <li>완료) 금산초교 인근 정화조 설치</li> <li>추가) 통일시장 공영주차장 설치</li> <li>추가) 이동동 공영주차장 배후관 정비</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>완료) 금화공원 운동시설 설치</li> <li>완료) 금촌택지 내 공원 정비</li> <li>완료) 공릉천 자전거 도로 연결로 설치</li> <li>완료) 금촌-월롱간 도로 개통</li> <li>추가) 공릉천 휴식공간 조성</li> <li>완료) 금촌역 주변 인근 상가 활성화</li> <li>일몰) 금릉역 뒤편 농로 포장</li> <li>일몰) 맥금동 산업도로 확장</li> </ul> |
|---|---|

## 금촌동 발전계획 구상도



## 2. 1단계 추진사업

사업연번	사업명	담당부서
1	GTX(수도권광역급행철도) 파주연장 (‘16.6.27 제3차 국가철도망 구축계획 반영)	철도교통과
임기내 목표	2016년도 파주연장안으로 대상사업 선정	추진현황 <b>완료(지속관리)</b>

### □ 사업개요

- 노 선 : 고양 킨텍스~운정신도시
- 노선연장 : 6.1km(파주시 1.4, 고양시 4.7), 정거장 1개소
- 총사업비 : 4,400억원
- ※ GTX를 운정까지 연장 반영 이후, 문산차량기지 공용은 민자가 제안하여 추진할 수 있도록 협의 추진


### □ 추진실적

- ‘14. 3.31 : ‘대광법 시행령’의 광역철도 거리제한 개정(법적문제 해결)
- ‘15. 4. 8 : GTX 파주연장 계획 의견 제출(市→경기도)
- \* 운정신도시까지 GTX 연장과 문산차량기지 공용 방안 적극 검토요청
- ‘15. 6. 3 : 「GTX, 3호선 파주연장 시민 추진단」 발족
- ‘15. 8. 6 : GTX 파주출발 11만인 청원서 제출(청와대, 기재부, 국토부)
- ‘15.10.12 : 3차 국회토론회 개최(1차 : ‘14.12월 / 2차 : ‘15. 2월)
- ‘15.11.17 : ‘GTX 민자 타당성 분석’ 의뢰(국토부 → 기재부, KDI)
- ‘16. 2.11~2.12 : ‘파주 新 철도시대’ 보고회 개최
- ‘16. 3. 3 : GTX 파주연장 예상노선대 현장 확인(기재부, 국토부)
- ‘16. 6.27 : ‘제3차 국가철도망 구축계획’ 확정·고시
- \* 파주시 3개노선 반영[GTX, 지하철3호선(운교선), 문산~도라산 전철화]
- ‘16.10.20 : GTX ‘A’ 노선 파주 연장선 기술용역 착공(국토부 주관)
- ‘16.12. 6 : GTX 파주연장 예·타 대상사업 선정
- ※ 철도사업 추진을 위한 관계기관 협의 추진(총 342회 / ‘14. 7. ~ ‘16.12.)  
    (청와대 1회, 국회 33회, 기재부 29회, 국토부,경기도,연구원 등 협의 279회)

### □ 향후계획

- ‘17. 3 : 예비타당성 조사 완료(파주~일산)
- ‘17. 9 : 국토부 ‘민자시설사업 기본계획’에 파주~삼성 구간으로 노선 확정 추진
- ‘18.12 : 착공

□ GTX 파주연장 계획도

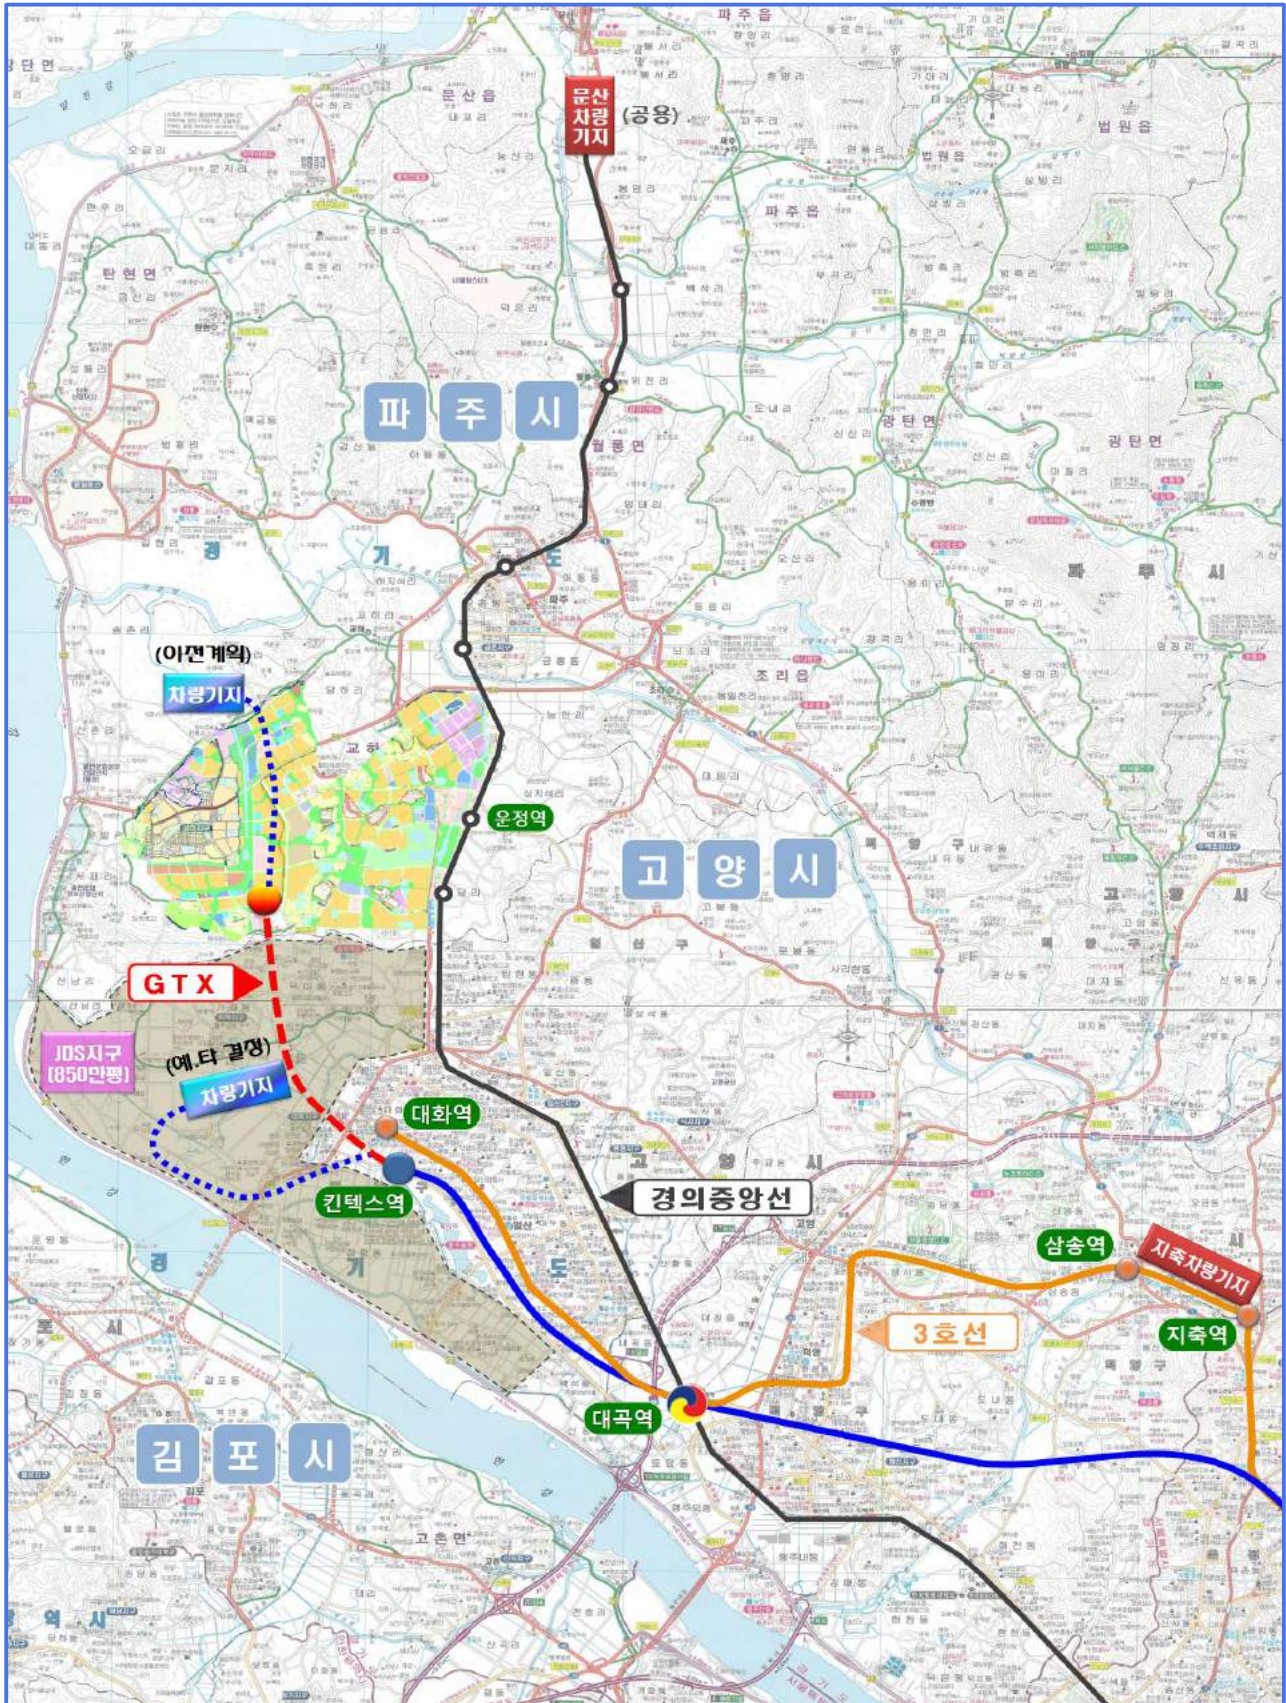

사업연번	사업명	담당부서
2	서울-문산 고속도로 건설(15.10.30 착공)	건설과
임기내 목표	2015년도 보상, 착공	추진현황
		완료(지속관리)

#### □ 사업개요

- 위 치 : 서울 강서구 가양동 ~ 문산읍 내포리(고속국도 제17호)
- 사업규모 : L=35.6km, B=16.2~30.6m(2~6차로) [파주구간 L=13km]  
 ※ 내포IC-산단IC-월릉IC-금촌IC-설문IC
- 사업기간 : 2007 ~ 2020
- 사 업 비 : 2조 2,941억원(공사 11,841, 보상 11,100)

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2015	2016	2017	2018	향후투자
계	22,941	276	3,313	6,089	4,686	2,898	5,679
국 비	12,272		3,270	5,392	3,016	594	
민 자	10,669	276	43	697	1,670	2,304	5,679

#### □ 추진실적

- '11. 8. : 사업시행자 지정[서울문산고속도로(주)] / 실시협약체결
- '12. 7. 18 : 환경영향평가(초안) 주민공청회(2회)
- '14. 12. 10 : 환경영향평가 협의 완료(조건부)/ '15년 예산(1천억원) 확보
- '15. 5. 15 : 파주시 사업계획반영 건의사항 협의(서울청, 파주시, 사업자)
- '15. 8. 7 : 실시계획 승인(총 연장 35.6km 중 고양시 국사봉 구간 1.9km 제외)
- '15. 8. 29 : 보상계획공고
- '15. 10. 20 : 1차 감정평가 및 보상협의 추진
- '15. 10. 30 : 기공식 개최(착공)
- '15. 12. 10 : 2차 감정평가 및 보상협의 추진
- '16. 3. 18 : 3차 감정평가 및 보상협의 추진
- '16. 12. 31 : 보상추진 중

#### □ 향후계획

- '17. 3 : 공사추진(토공, 구조물)
- '20. 11 : 사업준공

사업연번	사업명	담당부서
3	제2외곽순환도로 금촌IC 신설(실시설계 미반영)	건설과
입기내 목표	실시설계 반영	추진현황 <b>완료(지속관리)</b>

## □ 사업개요

- 위 치 : 파주시 문발동 ~ 법원읍 삼방리
- 사업규모 : L=26km, B=23.4m(4차로) 【김포~포천 L=51km】
- 사업기간 : 2008 ~ 2024
- 시 행 자 : 한국도로공사
- 사 업 비 : 파주구간 1조3,771억원【김포~포천 2조 7,000억원】  
 ※ 기투자 1,368 '17년 1,609 향후 24,023  
 【김포~파주 15억(국 6, 도로공사 15), 파주~포천 1,580억(국 1,064, 도로공사 516)】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2015	2016	2017	2018	향후투자
계	27,000	537	317	514	1,609	3,000	21,023
국 비	27,000	537	317	514	1,609	3,000	21,023

## □ 추진실적

- '10. 12. ~ '11. 12. : 타당성 조사(국토부)
- '12. 2. 29 : 기본설계 착수(한국도로공사)
- '13. 10. 23 : 문화재청 형상변경 심의결과 → 부결
- '14. 1. 15 : 환경영향평가(초안) 주민설명회
- '14. 3. 19 : 파주-포천 실시설계 착수(용역기간 : 21개월)  
 \* 법원 나들목 설치계획 설계반영
- '14. 12. 30 : 김포-파주 기본설계완료(한강통과구간 제외)  
 \* 교하 나들목 기본설계 계획반영
- '15. 2. 11 : 타당성 재조사결과 협의 / 교량설치(안)  
 - 3개 부처 교량설치(안) 반대 / 하저터널 추진검토
- '15. 3. 26 : 김포~파주 구간 실시설계 착수(용역기간 : 420일)  
 \* 하저터널 구간 - 턴키방식 추진(국토부)
- '15. 12. 23 : 파주~포천 실시설계 완료  
 ※ 파주 나들목 신설 건의(파주시 → 국토부, 도공 / 6회)  
 - 교하 나들목 반영 / 파주 나들목 실시설계 협의의견 제시
- '16. 6. 1 : 김포~파주 환경영향평가 주민설명회 개최
- '16. 7. 7 : 국방부 협의완료('16.12월 환경부 협의)

□ 향후계획

【김포 ~ 파주구간】

- '17. 6 : 실시설계 완료
- '17. 12 : 실시계획 승인(국토부)
- '18. 6 : 보상 및 공사착공('24년 사업준공 및 개통)

【파주 ~ 포천구간】

- '17. 1 : 실시계획 승인(국토부)
- '17. 2 : 보상협의 및 착공('22년 사업준공 및 개통)

□ 위치도



사업연번	사업명	담당부서
4	금촌천 생태복원	건설과
임기내 목표	2017년 준공	추진현황
		<b>추진중</b>

□ 사업개요

- 위 치 : 공릉천 ~ 금촌 제1교
- 사업량 : L=1.9km(호안조성, 식물식재, 친수공간)
- 기 간 : 2012 ~ 2017
- 사업비 : 260억원(기투자 211, '17년 49)
- 시행자 : 파주시

□ 추진실적

- '11. 6. 10 : 협약(MOU)체결(환경부+파주시+한국환경공단)
- '12. 6. 12 : 위·수탁협약 체결(파주시+한국환경공단)
- '14. 2. 24 : 공사착공
- '15. 12. 31 : 공릉천~순달교 제방 및 수목식재 완료(0.94km)
- '16. 12. 31 : 금촌천교~금촌제1교 제방 정비 완료(0.49km)

□ 향후계획

- '17. 6 : 순달교~금촌천교 제방 0.5km 정비
- '17. 12 : 공사준공



사업연번	사업명	담당부서
5	금촌 전통시장 활성화	지역경제과
임기내 목표	문화관광형 시장 육성	추진현황 추진중

## □ 사업개요

### ○ 추진방향

- 문화관광형시장 육성을 통한 시장 활성화
- 전통시장 시설 및 경영현대화 지원 통한 영업기반 조성
- 교육이나 경영자문을 통한 상인들의 자생력 강화

### ○ 사업내용

#### 【고객지원센터 건립】

- 위치/규모 : 파주시 금정24길 18-5/190㎡
- 사업비 : 694백만원(국 302.4 시 391.6)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 2016. 7
- 사업내용 : 금촌 통일시장 고객편의 제공

#### 【문화관광형시장 육성지원사업】

- 사업비 : 1,800백만원(국900 시900)
- 사업기간 : 2015 ~ 2017(3년)
- 사업내용 : ICT융합 + 자생력 강화 + 기반설비 + 이벤트 행사

## □ 추진실적

#### 【고객지원센터 건립】

- '15. 1~3 : 지적측량, 감정평가, 사업부지 보상
- '15. 8 : 사업변경(부지추가)
- '15. 9~10 : 실시설계 및 추가 사업부지 보상
- '16. 3 : 공사발주 및 착공
- '16. 7 : 금촌시장 고객지원센터 준공, 개소식

#### 【문화관광형시장 육성지원사업】

- '15. 3 : 문화관광형시장 육성지원사업 공모 선정
- '15. 6 : 문화관광형시장 사업수행자 선정



- '15. 10 : 2015년 문화관광형시장 사업 승인
- '16. 3 : 2016년 문화관광형시장 사업계획 수립 및 추진  
    금촌통일시장 협동조합 설립
- '16. 5 : 파주JC와 MOU체결 및 JTBC 천하장사 촬영
- '16. 8 : 상인 협동조합 및 상인 아카데미 교육
- '16. 10 : 2016 전국 우수시장 박람회 참가

□ **향후계획**

**【문화관광형시장 육성지원사업】**

- '17. 2 : 2차년도 문화관광형시장 사업 마감
- '17. 3 : 3차년도 문화관광형시장 사업계획 수립 및 추진

□ **현장사진**



사업연번	사업명	담당부서
6	파주스타디움 보조구장 인조잔디 교체('15.5.27)	체육청소년과
임기내 목표	2015년 준공	추진현황 <b>완료</b>

□ 사업개요

- 위 치 : 파주시 금릉동 186-5번지
- 사 업 량 : 인조잔디 교체 1식(8,030㎡)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 2015. 5
- 사 업 비 : 6억원(道 특별조정교부금 6억 확보)

□ 추진실적

- '15. 1. 20 : 설계착수
- '15. 2. 18 : 설계완료
- '15. 3. 9 : 공사착공
- '15. 5. 27 : 공사준공

□ 완료사진



사업연번	사업명	담당부서
7	금촌1동 주민센터 공간부족문제 해결 추진 <sup>(15.12.16 부지매입)</sup>	회계과
임기내 목표	2015년도 부지매입	추진현황
		<b>완료(지속관리)</b>


#### □ 사업개요

- 위 치 : 새꽃로 215(아동동 351-5번지)
- 규 모 : 지하2층/지상4층, 연면적 4,176㎡  
- 주변 부지 매입 후 기존 건축물 노후도 도래 시 신축
- 사업비 : 105억원('15년 7.2, 향후 97.8)

#### □ 추진실적

- '15. 2. 4 : 주민의견 수렴(금촌1동→회계과) 후, 계획수립  
\* 주민의견 : 시 재정 여건상 단기적으로 청사 이전신축이 어렵다면 현청사와 인접한 부지를 먼저 추가 확보한 후 예산이 확보되는 대로 현 위치에 신축 건의
- '15. 7. 24 : 부지매입비 확보(1회 추경)
- '15. 12. 16 : 부지매입 완료
- '16. 11. 14 : 주차장 조성 완료


#### □ 현장사진

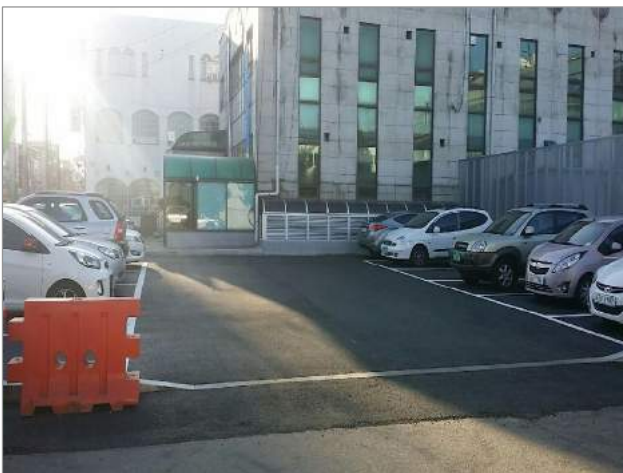

사업연번	사업명	담당부서
8	경의선 고가하부 체육시설 조성	체육청소년과
임기내 목표	2018년 체육시설 조성	추진현황
		<b>일몰</b>

□ 사업개요

- 위 치 : 파주시 아동동 308-2번지
- 사업량 : 고가하부 7구간(P43~P50) 체육시설 조성 1식(4,668㎡)
  - 체육시설 족구장 4면, 다목적 운동장 2면
  - 휴게쉼터(공원, 화장실) 및 주차장(32대)
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업비 : 3.3억원(기투자 0.5 / 향후 2.8)

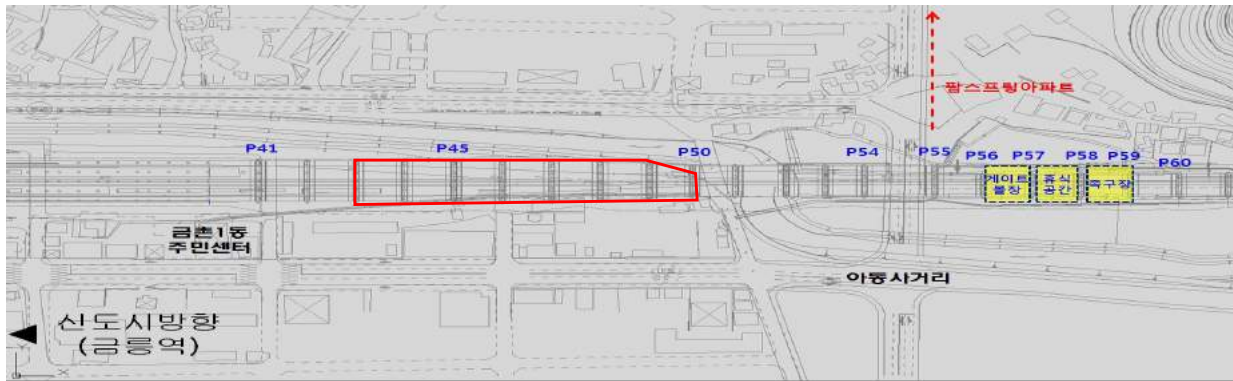

□ 추진실적

- '14. 7. 3 : 족구장 설치완료
- '15. 12. : 사업일몰



※ 일몰사유 : 5개 구간(P45~P50)체육시설(휴게쉼터, 다목적운동장 등) 조성사업은 국유재산 사용료 부담, 주변지역 유사시설 중복, 유지관리상의 문제가 있어 일몰함

사업연번	사업명	담당부서
9	금촌택지 중앙보행로 개선('15.4.20)	도로관리사업소
임기내 목표	보행로, 자전거도로 정비	추진현황
		<b>완료</b>

□ 사업개요

- 위 치 : 파주시 금촌동 978-23번지 일원(금촌택지 내 중앙보행로)
- 사업량 : L=1,139m, B=3m
- 기간 : 2015. 3. 12 ~ 4. 20
- 사업비 : 138백만원

□ 추진실적

- '15. 3. 12 : 공사 착공
- '15. 4. 20 : 공사 완료

□ 완료사진



사업연번	사업명	담당부서
10	금촌2동 주민 쉼터 조성	금촌2동
임기내 목표	2016년 주민 쉼터 조성	추진현황 <b>완료</b>


□ 사업개요

- 위 치 : 금릉동 452번지(舊 씨름연습장)
- 면 적 : 628.2m<sup>2</sup>(약 190평)
- 사업내용 : 주민이 원하는 편익시설 설치 및 쉼터 조성  
↳ 파고라, 체육시설, 조경수 식재 등
- 사업기간 : 2015 ~ 2016.4
- 사 업 비 : 40백만원(시비)

□ 추진실적

- '15. 2. : 주민의견 수렴
- '15. 5. 26 : 주민참여예산 사업 결정(금촌2동 주민참여예산 지역회의)
- '15. 12. 21 : 사업예산 확보
- '16. 3~4 : 쉼터 조성

□ 현장사진

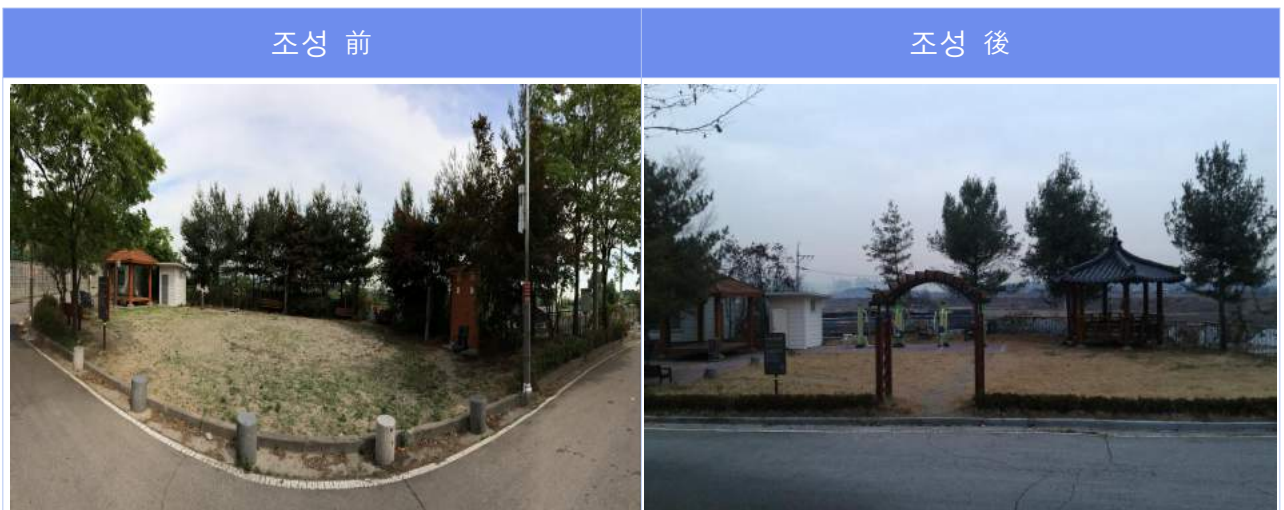

사업연번	사업명	담당부서
11	금촌동 둘레길 및 커뮤니티 숲 조성	공원녹지과
임기내 목표	2016년 둘레길 조성 2018년 커뮤니티 숲 조성	추진현황 추진중

□ 사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2018
- 사 업 비 : 38.2억원
- 사업내용

구분	사 업 내 용	사업비 (억원)	목 표	부서
둘레길 (21km)	금촌3동 <sup>14km</sup> → 금촌1동 <sup>2km</sup> → 금촌2동 <sup>5km</sup>	1.5	'15.10 노선확정 '16. 4 착공 '16.12 준공	공원녹지과
커뮤니티 숲	체험, 소통, 운동공간 및 커뮤니티 공간 조성	36.7	'15. 12 용지보상 '16. 7 설계완료 '16.8~ 토지매입 공사추진	공원녹지과

□ 추진실적

- '14. 5. 12 : 공원조성계획 수립 용역('15. 5. ~ '16. 9.) 착수
- '14. 6. 16 : 착수보고
- '14. 12. 22 : 1차 착수보고
- '15. 3. 12 : 2차 중간보고
- '15. 3. 23 : 시의회 사전보고
- '15. 5. 29 : 2015년도 1차 추경 예산 신청(203백만원)
- '15. 6. 23 : 전략환경영향평가서(본안)제출(市→한강유역환경청)
- '15. 6. 29 : 공원조성계획 결정 신청(市 도시계획위원회)
- '15. 8. 28 : 공원조성계획 결정
- '15. 10. : 둘레길 노선 확정
- '15. 12. : 1차 용지보상(3필지 981㎡, 203백만원)
- '16. 2. : 실시설계 착수
- '16. 3. : 2차 용지보상(5필지 4,320㎡, 450백만원)/ 주민설명회 개최

- '16. 4. 둘레길 조성 착수
- '16. 9. 공원조성계획 변경 결정
- '16. 12. 둘레길 준공(21km), 커뮤니티 숲 실시설계, 공원 실시설계 완료

□ 향후계획

**커뮤니티 숲**

- '17.12 : 토지매입 완료
- '18. 3 ~ 11 : 공사추진

□ 계획도





사업연번	사업명	담당부서
12	문산제일고 통학로 개선	건설과, 도로관리사업소
임기내 목표	2017년 통학로 개선	추진현황 <b>추진중</b> 통로박스 개선('15.6.1)

□ 사업개요

- 위 치 : 팜스프링아파트 ~ 문산제일고
- 사업내용
  - 통학로 개선 : L=1.5km, B=1.5m(양측)
  - 보강토 옹벽 개선 : H=4.1m, L=12.2m, 교통호 1식(야동동 89-2)
- 기 간 : 2015 ~ 2016('15년 0.9, 향후 5)
- 사업비 : 5.9억원(통학로 정비 5, 옹벽정비 0.9)

□ 추진실적

**【보강토 옹벽 개선 : 공사 완료】**

- '15. 4. 3 : 공사 착공
- '15. 6. 1 : 공사 완료



공사 전



공사 후

**【통학로 개선】**

- 자전거보행자겸용도로 시범사업 대상 선정 ⇒ 경기도 미반영

□ 향후계획

- 자전거보행자겸용도로 경기도 시범사업 지속건의 → 예산확보 후 사업추진

사업연번	사업명	담당부서
13	금빛로 거리 활성화	금촌2동
임기내 목표	걷고싶은 거리 조성, 청소년 문화시설 설치	추진현황
		완료('15.12)

## □ 사업개요

- 위 치 : 파주시 금촌동 일원
- 사업량 : 소상공인 지원, 번영회등 구성, 아파트 둘레길, 걷고싶은 거리 조성, 금연거리 지정, 아파트 둘레길 조성, 청소년문화시설 설치(금릉역, 북카페)
- 예산/기간 : 701백만원(시비) / 2015. 3 ~ 2015. 12

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2015	2016	2017	2018	향후투자
계	701	0	551	50	50	50	0
도비	0	-	-	-	-	-	-
시비	701	-	551	50	50	50	-

## ○ 사업내용

(단위 : 백만원)

사업명	내용	사업비	목표	부서
소상공인 지원	소상공인 운전자금 지원 등	200	연중	기업지원과
깨끗하고 안전한 거리문화 조성	민관협의체 구성 방법초소 등 설치	20	'15.10 완료	금촌2동
금연거리	주민 의견수렴 및 홍보 금연구역 지정 고시	10	'15.6 완료	보건행정과
번영회 등 구성	상가번영회 및 상인회 구성	-	'15.5 완료	금촌2동
공연 및 거리축제	찾아가는 음악회, 동호회 공연 나눔장터 거리축제화 추진	10	하절기	문화관광과 금촌2동
아파트 둘레길 조성사업	3개 코스 8.3km 꽃길조성, 출입구 및 이정표 설치	40	'15.12 완료	금촌2동
걷고싶은 거리조성사업	보행로 및 자전거 도로 정비	205	'15.4.27 완료	도로관리사
	테마별 시설물 설치 및 가꾸기 조형물, 야외무대, 운동기구 등	73	'15.12 완료	업소 금촌2동
그린공원 조성	꽃동산, 어린이 동물동산 조성 벤치등 휴게시설 및 편의시설 확충	15	'15.12 완료	금촌2동
청소년 문화시설 설치	청소년카페 설치(125.5㎡) 금릉역 임차, 북카페	143	'15.12 완료	금촌2동

□ 추진실적 및 향후계획

**설문조사 실시**

- 조사기간 : 2015. 3. 10. ~ 4. 10.(1개월)
- 조사방법 : 표본조사
- 조사대상 : 700명(주민, 학생, 경로당, 사회단체, 상인 등)
- 설문내용 : 금빛로 활성화 방안 등

**깨끗하고 안전한 거리문화 조성**

- '15. 5 민관협의체 구성
- '15. 10 방범초소 설치 및 자율방범활동 개시

**금연거리**

- '15. 5. 금연구역 지정 안내 현수막 게시(8개), 전단지 홍보활동실시
- '15. 6. 전단지 홍보활동 2회 실시, 금연구역 지정 고시
- '15. 6. ~ '16. 6. 계도기간 운영
- '15. 7. 1 금연구역 지정
- '16. 7. 지도단속 실시(위반 시 과태료 5만원 부과)



**금빛로 상가번영회 등 구성**

- '15. 4. 23 추진위원회 구성(임원 8명)
- '15. 5. 번영회 회원 확보 및 창립총회(임원선출, 회칙 등)
- '15. 6. 창단식 및 초대회장 취임식

---

## 소상공인 지원

- '15. 연중 소상공인 운전자금 지원
- '15. 4월, 9월 소상공인 창업교육

## 걷고싶은 거리

- '15. 4. 27 중앙보행로 보도 및 자전거도로 정비완료(아스콘 포장)
- '15. 9. 테마별 시설물 설치(야외무대, 야외 운동기구, 조형물, 포토존 등)
- '15. 12. 걷고싶은 거리 조성 완료

## 소공원 공연 및 거리축제

- 찾아가는 음악회(2회 실시(3,4월), 매월 마지막 주 수요일 12:30~13:10)
- 색소폰동호회 등 정기공연(하절기, 토요일 19:00~22:00)
- 나눔장터 거리축제화\*추진(1회 실시(4월), 매월 셋째주 토요일 10:00~15:00)  
\* 장터거리, 볼거리, 즐길거리, 먹을거리 등 주민 및 사회단체 참여형 추진

## 그린공원 조성

- '15. 5 ~ 11 꽃동산, 어린이 친화 동물동산, 편의시설 확충

## 아파트 들레길

- '15. 5. 민·관 협의체 및 추진위원회구성 주민자치위원회 사업 병행 추진
- '15. 5. ~ 12 코스별 사업시행 및 완료

## 청소년 문화시설(금릉역 북카페)

- '15. 3. 12 벤치마킹(고양시 아동청소년과, 톡톡톡 등 3개소)
- '15. 3. 12 임대가능자산 현장확인 및 협의(금촌2동, 한국철도공사)
- '15. 3. 23 임대가능자산 자료 조회 완료(금촌2동, 한국철도공사)
- '15. 9. 30 실시설계 용역 착수
- '15. 12. 청소년 문화시설 설치완료(금릉역, 125.5㎡)
- '16. 1. '금릉역 청소년 북카페' 운영 개시(파주청년회의소 위탁)

## 걷고싶은 거리 및 금연거리



## 아파트 돌레길 조성



## 보행로 및 자전거 도로 정비



## 청소년 북카페 설치(금릉역)



## 시계탑 설치(금릉역앞 공원)



## 조형물 설치(중앙보행로)



자율방범초소 설치(후곡공원)



야외무대설치(금릉역앞 공원)



어린이동물원 설치(쇠재공원)



야외운동기구 설치(후곡공원)



사업연번	사업명	담당부서
14	파주병원 시설개선	보건행정과
임기내 목표	음압병상 설치, 건강검진센터 신축, 주차장 조성	추진현황 <b>추진중</b>

□ 사업개요

- 위 치 : 파주시 중앙로 207(파주병원)
- 기 간 : 2016 ~ 2017
- 사 업 비 : 166.5억원
- 사업내용 : 건강검진센터, 음압병상 설치, 실버형 행복주택 및 주차장 신축

구분	건강검진센터	실버형 행복주택+주차장	음압병상
위치	파주병원 후문 주차장	파주병원 옆 주차장 내	파주병원 5층 5병동
규모	지상2층(983.16㎡)	지상3층 186면(철골)	5실(367㎡)
사업비	26.5억원	130억원	10억원
사업기간	2016.1~2017.2	2017.4~2018.10	2016.8~11

□ 추진실적

- '16. 1 : 음압병상 설치 설계, 건강검진센터 설계완료, 건강검진센터 공사 착공
- '16. 12 : 음압병상 준공

□ 향후계획

- '17. 1 : 음압병상 운영
- '17. 2 : 건강검진센터 준공, 운영(3월)
- '17. 4 : 실버형 행복주택 + 주차장 건립 착공
- '18. 10 : 실버형 행복주택 + 주차장 건립 준공



사업연번	사업명	담당부서
15	금촌 문화체육센터 건립	회계과 체육청소년과
입기내 목표	2018년 착공	추진현황 <b>추진중</b>

□ 사업개요

- 위 치 : 금촌동 771-2번지(구 파주경찰서 보훈회관 옆 주차장 부지)
- 규 모 : 지하3층, 지상7층(연면적 18,612㎡)
- 사 업 비 : 438억원
- 사업기간 : 2016 ~ 2020
- 주요시설 : 스포츠센터(수영장, 운동교실 등), 문화시설, 복지시설 등

□ 추진실적

- '13. 11. ~ 2014. 1. : 중기지방재정계획, 공유재산심의 및 타당성 용역
- '14. 3. : 지방재정투자심사 통과(적정, 경기도)

□ 향후계획

- '17. : 국비 확보방안 마련 및 지방재정투자심사(변경)
- '18. : 실시설계 및 공사착공
- '20. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진








### 3. 1단계 병행 및 2단계 추진사업

구분	사업명	추진실적 및 향후계획
1단계 병행추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>(완료) 금촌역 앞 도시계획 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치 : 금촌역 일원(A=36,454m<sup>2</sup>)</li> <li>• 용도지역 : 제1종 일반주거지역(상업시설로 용도변경)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '15.4.10 : 파주도시기본계획 수립용역 착수</li> <li>- '15.12.3 : 주민대표 의견 수렴</li> <li>- '15.12.23~'16.2.4 : 희망파주 거버넌스(71명) 회의 개최(3회)</li> <li>- '16.11.18 : 2030 파주도시기본계획(안) 승인신청 (市→경기도)</li> </ul> </li> <li>(단기) 개발사업 계획수립 시 시가화예정용지 물량 우선 배분하여 시가지 확대방안 마련</li> <li>(장기) 금촌중생활권에 대한 인구배분(239→214천명), 시가화예정용지 물량 확보(주거상업 32km<sup>2</sup> / 공업 20km<sup>2</sup>)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(완료) 금화공원 내 운동시설 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치 : 금촌동 789-1(금화공원)</li> <li>• 사업량 : 운동기구 3종 설치 (큰휠차머신, 워킹트레이너머신, 트위스트머신)</li> <li>• 사업비 : 6백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '15.3.26 : 설치완료</li> </ul> </li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <span style="margin: 0 10px;">⇒</span>  </div>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(일몰) 공릉천 내 체육공원 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공릉천은 한강에 비해 폭이 좁고 지대가 낮아 집중호우시 침수되는 지역으로 하천구역 내 체육시설 설치 불가(서울지방국토관리청 협의)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(완료) 택지 내 근린공원 2개소 찾고싶은 공원 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 쇠재공원(금촌2동 주민센터 인근) 후곡공원(중앙도서관 인근)</li> <li>• 사업내용 : 편의시설, 체육시설 정비, 자율방범초소 설치, 어린이동물원 설치, 아파트 둘레길 조성 등               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '15 : 아파트 둘레길 조성(2개 노선) 쇠재공원 어린이 동물원 설치(공작 2마리, 새 30마리, 토끼 5마리) 후곡공원 야외운동기구 증설(3개) 후곡공원 자율방범초소 설치 및 방범활동</li> <li>- '16 : 꽃나무 및 야생화 식재 편의시설 및 체육시설 정비</li> </ul> </li> </ul>

구분	사업명	추진실적 및 향후계획
1단계 병행추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (완료) 검산동 사격장 소음 해결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시간 조정 및 대체사격장 사용 → 소음해결</li> <li>- '15 : 야간 및 여명 사격훈련 시간 조정</li> <li>    대체사격장 사용(광탄면 마장리 흥도개비 사격장)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (완료) 검산동 아파트 앞 농로에서 공릉천 자전거도로 직접 연결로 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 야동동 대방, 성원, 유승 아파트 일원</li> <li>• 사업량 : 자전거도로 및 산책로연결공사(140m)</li> <li>• 사업비 : 1.8억원</li> <li>- '14.12.23 : 서울국토청 사업승인, 사업비확보</li> <li>- '15. 5.30 : 실시설계완료</li> <li>- '15. 7. 3 : 착공 → '15. 9. 30 : 완공</li> </ul> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (완료) 금신초교 인근 정화조 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 금촌동 금신초등학교</li> <li>• 사업량 : D150mm L=135m, D80mm L=130m</li> <li>• 사업비 : 78백만원</li> <li>- '15. 4 : 오수관로 연결사업 조사 완료</li> <li>- '15. 7 : 착공 → '15. 8. 31 : 준공</li> </ul> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (완료) 금촌-월롱간 도로 개통</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구간 : 야동동 ~ 파주읍 봉암리 일원</li> <li>- 규 모 : L=4.75km, B=20m(4차로)</li> <li>- 사업비 : 1,145억원</li> <li>• '14.12.19 : 시점~둔전교차로 2.3km 개통</li> <li>• '15.11.30 : 전 구간 4.75km 개통</li> </ul> 

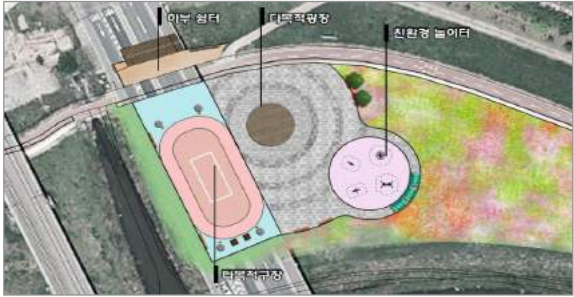구분	사업명	추진실적 및 향후계획
1단계 병행추진	(추가) 금촌통일시장 공영주차장 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 금촌동 324-24외 9필지 1,762㎡</li> <li>• 사업량 : 철골 3층 주차장(132면)</li> <li>• 사업비 : 49.5억원(국비 29.7, 지방비 19.8) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '17.1 : 전통시장 주차환경 개선 공모추진</li> <li>- '17.5 : 토지 및 건물 매입</li> <li>- '17.7 : 실시설계 용역완료</li> <li>- '17.8~12 : 철골식주차장 조성공사</li> </ul> </li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
	(추가) 공릉천 휴식공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 공릉천 일원(칠간다리 하부)</li> <li>• 사업량 : 다목적 체육시설 및 휴식공간 조성 등</li> <li>• 사업비 : 10억원(도비) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '16.10.19 : 용역 착수</li> <li>- '16.12.19 : 용역 준공</li> <li>- '17.3. : 공사 착공 → '17.6. : 공사 준공</li> </ul> </li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
	(추가) 야동동 공장밀집지역 배수관 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 야동동 305-1 일원</li> <li>• 사업량 : 우수관 30m</li> <li>• 사업비 : 20백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '17.2 : 착공 → '17.7 : 준공</li> </ul> </li> </ul>
2단계 추진	• (추진중) 舊 경찰서 인근 상가 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인정시장 등록추진 → 고객편의, 기반시설 지원</li> <li>• 주변 공공기관 참여 → 상가주변 활성화 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '15.4 : 소상공인 창업교육</li> <li>- '16.12~ : 활성화 추진위원회 구성</li> <li>- '17.1~ : 인정시장 등록 추진</li> </ul> </li> <li style="padding-left: 40px;">찾아가는 문화행사 등 마케팅행사 지원</li> </ul>

구분	사업명	추진실적 및 향후계획
2단계 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>(추진중) 재개발지역 행정지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>금촌2동제2지구 : 사업시행인가 등 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '16.2.17 : 뉴스테이 연계형 공모 선정</li> <li>- '16.9.6 : 우선협상대상자 선정</li> <li>- '17.4 : 정비계획 변경(용적률 상향, 세대수 증)</li> <li>- '17.7 : 사업시행 인가</li> </ul> </li> <li>울목지구 : 사업시행인가 등 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '16.8.30 : 뉴스테이 연계형 공모 선정</li> <li>- '17.1 : 우선협상대상자 입찰 공고</li> <li>- '17.3 : 우선협상대상자 선정</li> <li>- '17.4 : 정비계획 변경(용적률 상향, 세대수 증)</li> <li>- '17.7 : 사업시행 인가</li> </ul> </li> <li>새말지구 : 사업계획 변경 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '15.12.5 : 정비계획 변경                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사업계획변경(용적률 및 소형평형 변경, 세대수 1,970→2,668)</li> </ul> </li> <li>- '17 : 뉴스테이, 지역주택조합 등 사업방식 변경 강구</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(완료) 금릉역 뒤편 농로 포장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 치 : 금촌동 611-7번지</li> <li>사업량 : L=850m B=3m</li> <li>사업비 : 40백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '15.11.23 : 잡석부설 공사 착공(600m)</li> <li>- '15.12. 7 : 잡석부설 공사 준공</li> <li>- '16. 3. 1 : 콘크리트 포장 공사 착공</li> <li>- '16. 4.30 : 콘크리트 포장 준공(250m)</li> </ul> </li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <span style="margin: 0 10px;">⇒</span>  </div>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(추진중) 지하철 3호선 연장(금촌조리선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>금촌역~지축역(16km) 연장</li> <li>조리읍의 캠프하우스 개발 및 고양시의 통일로 인근 개발계획과 연계하여 향후 국가철도망 구축계획에 반영 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '16.12.16 : 국가계획 반영을 위한 용역착수</li> <li>- '17년~ : 국가계획 반영을 위한 타당성 확보</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(임박) 맥금동 산업도로 확장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 치 : 맥금동 1223일원</li> <li>사업량 : L=2.2km, B=3~5m→7m(비법정도로)</li> <li>사업비 : 13억원(보상비 5, 공사비 8)</li> <li>노선확장 타당성 검토→국토부(서울청)에서 2013년 하천기본계획에 의거 하천정비완료구간으로 산업도로 확장 불가 회신</li> </ul>
