

미래도약 경제도시

-교통은 편하다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[1-9]	야당동·상지석동 도시계획도로 정비	 도 로 건 설 과
[1-11]	부르미버스(똑버스) 확대 시행	 버 스 정 책 과
[1-15]	능안리~운정역 도로 확충	 도 로 건 설 과
[1-17]	캠프하우즈 입구~대원리 간 도로개설 조속 추진	 도 로 건 설 과
[1-20]	소방진입로 확보(마을 및 공장밀집지역, 전통시장 등)	 도 로 건 설 과
[1-21]	장기미집행 도시계획시설 조기 집행	 도 로 건 설 과
[1-22]	공영주차장 확충으로 역세권·지역상권 활성화	 주 차 관 리 과
[1-24]	야당역 연결도로 개설	 도 로 건 설 과

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계			
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
▶ 교통취약지역으로 향후 김포~관산간 도로와 연계한 교통망 확충	달성연도 2023 달성목표 공사 착공

1

사업개요

- 사업명: 야당~상지석 동측 연결도로 개설
- 위치: 파주시 야당동 및 상지석동 일원
- 사업량: 도로개설 L=1.2km, B=12m (왕복2차로 / 양측보도)
- 사업기간: 2019. 1. ~ 2025. 12.
- 사업비: 279억원 (공사비 71, 보상비 205, 설계비 3)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	도시관리계획 및 실사계획인가(변경 결정 토지보상	토지보상 완료 공사 착공	공사 추진	공사 완료		

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	27,900	9,300	4,700	6,800	5,826	1,274	
국비	6,000		500	3,481	1,000	1,019	
시비	21,900	9,300	4,200	3,319	4,826	255	

4 재정 집행실적


(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
19,500	27,900	27,900	14,000	6,800	5,826	1,274				
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
20,800	3,981		16,819		20,257	14,000	6,257			

5 추진현황 및 계획

- 2018. 11. 다수인민원 제기 (윤** 외 2,341인)
- 2019. 1. 사업 추진 결정
- 2019. 3. 2019년 제1회 추경예산 편성
- 2019. 5. 실시설계용역 착수
- 2019. 10. ~ 12. 주민설명회 개최 (2회)
- 2021. 3. 소규모재해영향평가 용역 완료
- 2021. 5. 도로관리계획 결정 및 실시계획인가 완료
- 2021. 7. 특수상황지역개발 사업 선정 (국비 60억원)
- 2022. 9. 도시관리계획(변경) 결정 및 실시계획인가(변경) 완료
- 2023. 7. 공사 착공
- 2025. 12. 공사 완료

6 관련자료

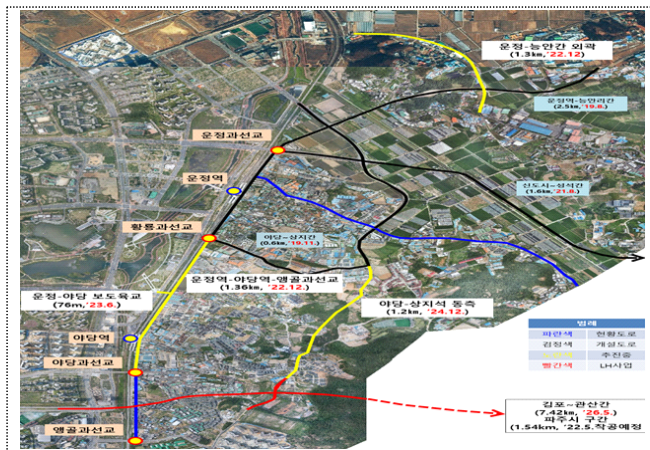

<위 치 도>



<현장사진>

7 문제점 및 대책

- 해당 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로건설과	과 팀 주	장 장 무	조 배 노	동 준 상 현	☎ 940 - 4640 ☎ 940 - 4657 ☎ 940 - 4655
---------------	------	-------	-------------	-------------	-------------	------------------	--

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
【 부르미버스 확대시행을 통한 시민만족도 향상 】 부르미버스의 종합적인 분석을 통한 운행 효율화를 달성하여, 운정3지구 입주민 증가를 고려한 증차를 추진하고, 교통불편지역(소외지역) 개선을 위해 농촌형 부르미버스 신설 추진	달성연도 달성목표 2023 부르미버스 확대 (12대)

1
현황

○ (기존) 도시형 똑버스 운영 → (변경) 도시형 똑버스 + 농촌형 똑버스 확대 운영

구분	운행개시	운행지역	인가대수
도시형 똑버스	2021.12.21	운정1,2,3지구 및 교하지구	14대
농촌형 똑버스	2023.12.18	광탄면, 탄현면, 운정4동	9대

2
추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획(9대→23대로 확대 운영)

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	9대 운영	23대 운영	23대 운영	23대 운영	23대 운영	

3
연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	18,378	225	1,506	4,371	4,092	4,092	4,092
국비	5,800			1,906	1,298	1,298	1,298
도비	4,662	68	452	377	1,255	1,255	1,255
시비	7,916	157	1,054	2,088	1,539	1,539	1,539

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026	2026~
19,293	18,378	18,378	1,731	4,371	4,092	4,092	4,092	4,092

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
118,378	5,800	4,662	7,916		3,324	1,463	1,861			

5 추진현황 및 계획

- 2021. 8. 경기도 DRT 시범사업 선정
- 2021. 10. DRT 운송사업자 선정
- 2021. 12. 운송개시(9대)
- 2022. 9. 23년 스마트빌리지(농촌형 수요응답) 보급 및 확산사업 선정

사업개요

- 총사업비: 8,983백만원(국비80%, 시비20%)
- 사업위치: 파주시 광탄면, 탄현면, 운정4동
- 사업대수: 총9대(지역별 각3대)
- 사업기간: '23년 ~ '27년(국비보조 사업기간)
- 사업내용: 농촌이동 활성화를 위한 AI기반 수요응답버스 개발 및 확산

- 2023. 10. 운정신도시 톡버스 5대 증차(9대→14대) 운송개시 완료
 - LH 광역교통부담금 확보를 통한 DRT 운영 확대
- 2023. 12. 농촌형 톡버스(DRT) 보급('23년 스마트빌리지보급 및 확산사업)
 - 광탄, 탄현, 운정4동 9대 / 사업비 8,983백만원(국비 80%, 시비20%)

6 관련자료

- 해당 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	버스정책과	과장	장	박한수	☎ 940 - 5760
			팀장	장	유정현	☎ 940 - 2488
			주무관	관	정동운	☎ 940 - 2481
					이 다은	☎ 940 - 2483

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
신도시 및 철도교통시설 접근 향상을 위한 운정 신도시와 조리읍 능안리간 연결도로 확충	달성연도 2022 달성목표 도로개통

1 사업개요

- 사업명: 운정역-능안리 도로확포장
- 위치: 상지석동 1411-2번지 일원
- 사업량: 도로확포장 L=1.3km, B=10m(시도55호선)
- 사업기간: 2020. ~ 2022.
- 사업비: 8,250백만원(국 4,525 / 시 3,725)

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	공사진행 및 도로개통					

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	8,250	8,250					
국비	4,525	4,525					
시비	3,725	3,725					

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
8,250	8,250	8,250	8,250					

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
8,250	4,525		3,725		8,250	8,250				

5 추진현황 및 계획

- 2021. 1. 도로구역(변경)결정 고시
- 2021. 5. 공사 착공
- 2021. 9. 보상 완료
- 2022. 12. 도로개통 완료(공사완료)

6 관련자료



<위치도>



<현장사진-도로개통 완료>

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로건설과	과	장	조	준	동	☎ 940 - 4640 ☎ 940 - 4658 ☎ 940 - 4651
			팀	장	오	태	원	
			주	무	오	재	호	
			관					

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계			
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
【 캠프하우스 도시개발사업으로 인한 봉일천 시내 및 통일로 교통정체 해소를 위한 우회도로 개설】 ▶ 우회도로 개설을 통해 국도1호선 교통정체 및 서울-문산 간 고속도로 접근성 개선	달성연도 2023 달성목표 공사착공

1

사업개요

- 사업명: 캠프하우스 도로개설
- 위치: 조리읍 봉일천리(캠프하우스 입구)~대원리
- 사업량: 도로개설 L=1.42km, B=10~20m, 교량 L=180m 1개소
- 사업기간: 2018.~2025.
- 사업비: 285억원(국50%, 시50%)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	도시관리계획 결정 및 실시설계용역	보상 추진 및 공사착공	보상 완료 및 공사진행	공사 완료		

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	28,500	1,900	3,026	12,474	11,100	-	
국비	14,250	650	1,566	6,484	5,550	-	
시비	14,250	1,250	1,460	5,990	5,550	-	

4

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
28,500	28,500	28,500	4,926	12,474	11,100					
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
17,400	8,700		8,700		11,044	4,741	6,303			


5

- 2020. 3. 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 착수
- 2021. 5. 도시관리계획 입안 요청
- 2021. 10. 건설사업관리(설계단계) 용역 착수
- 2021. 11. 보상업무 위·수탁 협약 체결(한국부동산원)
- 2023. 1. 도시관리계획 결정(변경) 고시(파주시 고시 제2023-12호)
- 2023. 4. 보상계획 공고
- 2023. 9. 실시계획인가 고시
- 2023. 10. 공사 및 관급자재 계약 의뢰
- 2023. 12. 공사 계약 및 착공
- 2025. 12. 공사 완료

6



<위 치 도>

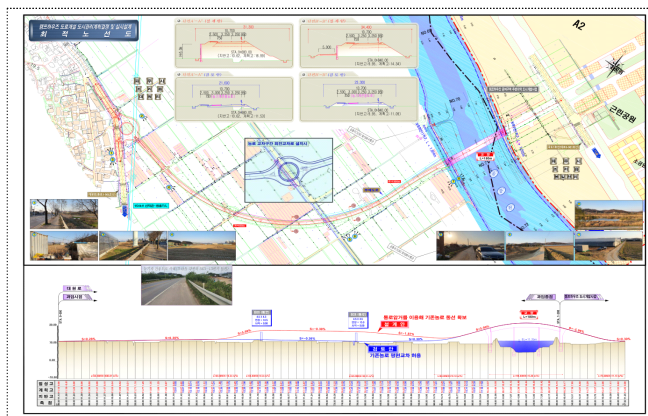

<계획평면도>

7

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로건설과	과 팀 주 문	장 장 관	조 오 강	춘 태 신	동 원 구	☎ 940 - 4640
								☎ 940 - 4658
								☎ 940 - 4652

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표				
【 연차별 계획수립 및 시행 】 협소한 마을 및 공장밀집지역, 전통시장 등 화재시 조속한 진압을 위해 4m 이상의 소방 진입도로 연차별 확보 (최소 폭: 4m , 권장 폭: 6m)	<table> <tr> <th>달성연도</th><th>달성목표</th></tr> <tr> <td>2023</td><td>연차별 사업시행 착수</td></tr> </table>	달성연도	달성목표	2023	연차별 사업시행 착수
달성연도	달성목표				
2023	연차별 사업시행 착수				

1

사업개요

- 목 적: 마을골목길, 공장밀집지역·전통시장 등 협소한 도로 확장
 - * 화재(또는 재난·응급상황) 발생 시 신속한 차량 접근이 가능토록 4~6m 이상의 도로 폭 확보 【소방차 폭 3m】
- 내 용: 소방 진입도로 확보 (수요조사 및 계획수립 ➡ “연차별 시행”)
 - (장기미집행)도로계획도로 개설(장기미집행 9개소^{도시계획}, 오도동^{마을안길}, 초리골^{농어촌})
 - 소규모 공단 밀집지역 기반시설 확충·지원(기업지원과 연계)
 - 전통시장 연결·접근도로 우선순위 정비
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2025. 12.
- 사 업 비: 53,527백만원

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	수요조사 및 계획수립	연차별 시행	연차별 시행	연차별 시행		

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	53,527		8,390	20,070	16,378	8,689	
국비							
도비							
시비	53,527		8,390	20,070	16,378	8,689	
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
49,227	53,527	53,527	8,390	20,070	16,378	8,689		

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
28,260	2,366		25,894		20,632	8,390	12,242			

5 추진현황 및 계획

- 2022. 9. ~ 10. 수요조사 실시
- 2023. 2. ~ 3. 우선순위 선정 및 단계별 추진계획 수립
- 2023. ~ 2025. 12. (단계·연차별) 예산 확보 및 사업 시행

6 관련자료

- 해당 없음

7 문제점 및 대책

- 해당 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로건설과	과 팀 주 무	장 장 관	조 배 허	준 준 권	동 우 준	☎ 940 - 4640 ☎ 940 - 4657 ☎ 940 - 4654
---------------	------	-------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

장기미집행 도시계획시설 조기 집행

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표				
【 장기미집행 도시계획도로 보상(44개소) 및 착공(9개소) 】 도시계획시설 결정으로 토지를 용도대로 사용할 수 없거나 사실상 토지의 활용이 불가능하게 된 토지소유자의 침해된 재산권을 적절하게 보상하기 위함	<table> <tr> <th>달성연도</th><th>달성목표</th></tr> <tr> <td>2023</td><td>보상 및 착공</td></tr> </table>	달성연도	달성목표	2023	보상 및 착공
달성연도	달성목표				
2023	보상 및 착공				

1사업개요

- 사업명: 장기미집행 도시계획도로 개설
- 위치: 금촌, 문산, 파주, 법원, 광탄, 적성
- 사업량: 장기미집행 도시계획도로 44개소(보상35 / 보상·개설 9)
- 사업기간: 2019. ~ 2025. 12.
- 사업비: 65,287백만원(보상 46,900 / 공사 17,600 / 용역 767)

<단위: 백만원>

구분		계	2019	2021	2022	2023	2024	2025
대상시설		보상:35 개설보상:9		보상15 개설보상1	보상10 개설보상2	보상10 개설보상4	개설보상2	
투자 계획	계	65,287	787	12,800	15,700	13,000	9,800	13,200
	공사비	17,600					4,400	13,200
	보상비	46,900		12,800	15,700	13,000	5,400	
	용역비	787	787					

2추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	토지보상 <착공1> <준공1>	토지보상 <착공2> <준공2>	토지보상 <착공5> <준공3>	토지보상 <착공1> <준공3>		

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	65,287	13,587	15,700	13,000	9,800	13,200	
시 비	65,287	13,587	15,700	13,000	9,800	13,200	

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~	
65,287	65,287	65,287	29,287	13,000	9,800	13,200			

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
39,487			39,487		39,487	26,487	13,000			

5 추진현황 및 계획

- 2023. 4 ~ 5. 보상계획 공고_(15개소)
- 2023. 6. [소로3-광탄6], [소로2-광탄3] 공사 준공
- 2023. 8. 손실보상협의 요청_(15개소)
- 2023. ~ 2024. 토지보상 추진_(44개소)
 - 15개소 보상 완료, 24개소 재결 및 협의중, 5개소 감정평가 예정
- 2024. ~ 2025. 공사 착공 및 준공_(9개소)

6 관련자료

- 해당 없음

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로건설과	과 팀 주 무	장 장 관	조 배 허	준 준 권	동 우 준	☎ 940 - 4640 ☎ 940 - 4657 ☎ 940 - 4654
---------------	------	-------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
▶ 역사(驛舍) 주변 및 도심지 공영주차장 확충으로 지역상권 활성화 ▶ 유흥토지 활용 임시 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소	달성 달성목표 2023 공영주차장 확충

1

사업개요

○ 역사(驛舍) 주변 공영주차장 조성

구분	월릉역 환승주차장(운영중)	야당역 환승주차장(운영중)	비고
위치	월릉면 위전리 168번지	야당동 1087번지	
사업량	지평식, 191면	건물식 5층6단, 305면	
사업비	7,800백만원	10,000백만원	
사업기간	2020.1. ~ 2023.12.	2019.1. ~ 2021.12.	

○ 운정 도심지 공영주차장 조성

구분	운정호수공원(추진중)	가람마을 공원 지하(운영중)	비고
위치	와동동 1412번지	와동동 1591번지	
사업량	건물식 2층3단, 253면	지하2층, 235면	
사업비	9,800백만원	13,250백만원	
사업기간	2020.1. ~ 2024.6.	2019.1. ~ 2021.12.	

○ 금촌 도심지 공영주차장 조성

구분	금촌로터리 주변(운영중)	금촌동 원앙길(추진중)	비고
위치	금촌동 956-1번지	아동동 321-2번지	
사업량	건물식 2층3단, 119면	건물식 2층3단, 122면	
사업비	14,100백만원	7,640백만원	
사업기간	2020.1. ~ 2023.9.	2020.1. ~ 2024.6.	

○ 조리 도심지 및 유희토지(임시) 공영주차장 조성

구 분	조리 봉일천 ^(운영중)	와동동(한국농어촌공사) ^(운영중)	비 고
위 치	조리읍 봉일천리 188-4번지	와동동 1380번지	
사 업 량	지평식, 193면	(임시) 지평식, 162면	
사 업 비	5,600백만원	비예산	
사업기간	2020.1. ~ 2022.11.	2022.9. ~ 2023.1.	

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.
목표	조리봉일천 준공, 금촌로터리 착공	공영주차장 3개소 준공 ① 금촌로터리 ② 월릉역 환승 ③ 임시 주차장 준공	운정호수공원 금촌 원양길 준공		

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	68,190	43,455	10,200	13,095	840	600	-
국 비	2,000	2,000					
도 비	4,938	1,800	600	2,538			
시 비	61,252	39,655	9,600	10,557	840	600	
민 자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
66,850	68,190	24,735	10,200	13,095	840	600		

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
24,735		3,138	21,597		13,071	2,229	10,842			

5 추진현황 및 계획

○ <역사(驛舍) 주변 공영주차장 조성>

- 2020. 6.30. 월릉역 도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경) 고시
- 2021. 8.26. 월릉역 소규모 재해영향평가 협의완료
- 2021. 9. 7. 월릉역 보상계획 열람공고
- 2021.12.30. 야당역 환승주차장 조성 완료(5층6단 305면)
- 2022. 4.12. 월릉역 소규모 환경영향평가 협의완료
- 2022. 9. 2. 월릉역 철도시설 변경 협의 완료(국가철도공단)
- 2022. 9. 8. 월릉역 실시계획인가 고시
- 2022.12.29. 월릉역 토지보상 완료
- 2023. 3. 6. 월릉역 공사착공
- 2023.12.13. 월릉역 환승주차장 준공
- 2024. 1. 1. 월릉역 환승주차장 무료 운영개시

○ <운정 도심지 공영주차장 조성>

- 2021. 6.11. 운정호수공원 공원조성계획 결정(변경) 고시
- 2021.11.22. 운정호수공원 교통성검토 용역 완료
- 2021.12.24. 가람마을 공원 지하 공영주차장 조성 완료(지하2층 235면)
- 2022. 1.14. 운정호수공원 공용건축물 협의(공작물 축조) 완료
- 2022. 4.11. 운정호수공원 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2022.10.14. 운정호수공원 특별교부세 7억원 확보
- 2022.11. 8. 운정호수공원 '23년 주차환경개선사업 도비 20억원 확보
- 2022.12.28. 운정호수공원 경기도 특별조정교부금 20억원 확보
- 2023. 5.22. 운정호수공원 공사착공
- 2024. 6. 운정호수공원 공영주차장 준공

○ <금촌 도심지 공영주차장 조성>

- 2020. 3.20. 금촌 원앙길 도시관리계획 변경(주차장) 결정 고시
- 2021. 6.25. 금촌로터리 도시관리계획(주차장) 결정 고시
- 2021. 6.30. 금촌로터리 보상협의 완료

- 2021. 9. 7. 금촌 원앙길 행정소송 파주시 승소
- 2021. 9.24. 금촌로터리 기존 건축물 철거 완료
- 2021.10.27. 금촌 원앙길 보상계획열람공고
- 2022. 5.31. 금촌로터리 실시계획인가 고시
- 2022. 8.19. 금촌 원앙길 실시계획인가 고시
- 2022. 9. 2. 금촌로터리 공사착공
- 2022.12.21. 금촌 원앙길 토지보상 완료
- 2023. 4.19. 금촌 원앙길 경기도 계약심사 완료
- 2023. 6. 8. 금촌 원앙길 공사착공
- 2023. 9.21. 금촌로터리 공영주차장 준공
- 2024. 6. 금촌동 원앙길 공영주차장 준공


○ <조리 도심지 및 유희토지(임시) 공영주차장 조성>

- 2021. 8.17. 조리 봉일천 도시계획시설 결정 고시
- 2021.12.16. 조리 봉일천 문화재 시굴조사 완료
- 2022. 3.28. 조리 봉일천 공사착공(토목)
- 2022. 4.13. 조리 봉일천 실시계획인가 고시
- 2022.11.18. 조리 봉일천 공사준공
- 2023. 1. 6. 와동동(한국농어촌공사) 임시 주차장 조성 완료

6 관련자료




월롱역

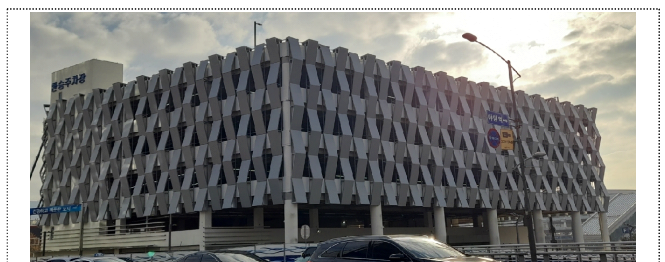


야당역



운정호수공원

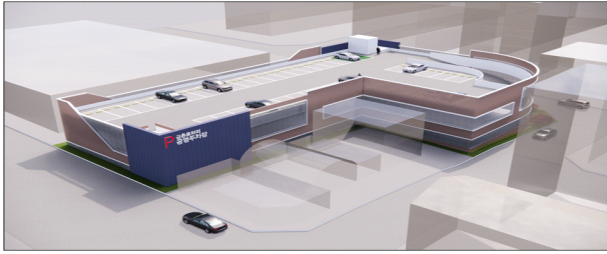

금촌로터리

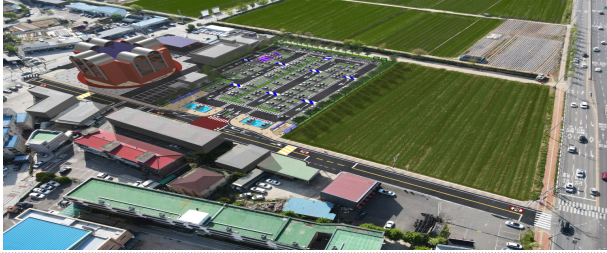

조리 봉일천

가람마을



금촌동 원앙길



와동동(임시)

7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

주차관리과

과장
팀장
주무관

이호명
이용국
김병욱

☎ 940 - 5940
☎ 940 - 4788
☎ 940 - 4784

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
▶ 야당역~운정역간 순환도로를 개설하여 기반시설이 열악한 야당동 일원에 기반시설(도로)을 확충하여 주민불편 해소	달성연도 2023 달성목표 공사준공

1

사업개요

- 사업명: 운정역~야당역~앵골과선교 도로개설
- 위치: 야당동 일원(황룡과선교~야당과선교)
- 사업량: 도로개설 및 확장 L=1.36km, B=10m(2차로)
- 사업기간: 2018.~2023.
- 사업비: 188억원(국 88, 시 100)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	토지보상 완료 및 공사 착공	공사 준공				

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	18,800	13,146	4,454	1,200			
국비	8,800	7,200	1,600	0			
시비	10,000	5,946	2,854	1,200			

재정 집행실적


(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
17,600	18,800	17,600	17,600	1,200						
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
18,800	8,800		10,000		17,260	14,489	2,771			

추진현황 및 계획

- 2020. 6. 도로구역 결정 고시 및 보상 착수
- 2020. 12. 실시설계 완료
- 2021. 12. 공사 착공
- 2022. 11. 멸종위기 야생동물(맹꽁이) 포획·방사 완료
- 2023. 12. 도로 개통

관련자료

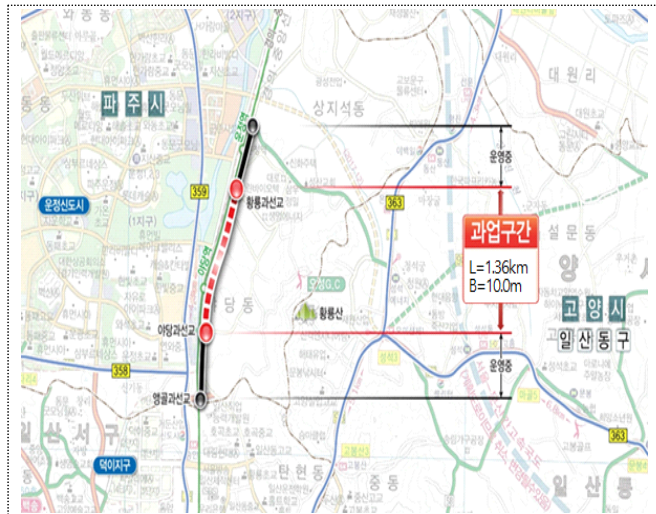

<위 치 도>



〈현장사진〉

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로건설과	과 팀 주 문	장 장 과	조 오 강	출 태 원 시 구	☎ 940 - 4640
							☎ 940 - 4658
							☎ 940 - 4652
