
2. 통일경제도시 파주

- [2-1] 남북교류중심 평화(통일)경제특구 지정 ----- 평화협력과 추진중
- [2-2] 군 방호벽 선별 철거 추진 ----- 평화협력과 완 료
- [2-3] 중소기업지원센터 및 시범프로젝트센터 설치 ----- 기업지원과 추진중
- [2-4-①] 면세점 유치 등 임진각 관광지 개발----- 관광과 완 료
- [2-4-②] 임진각 평화 곤돌라 설치 추진----- 관광과 완 료
- [2-5] (파평면)리비교 주변 관광활성화 추진----- 관광과 완 료
- [2-6] 남북철도 연결 대비 KTX/SRT 문산 연장-----남북철도교통과 추진중
- [2-7] 통일경제특구 대비 스마트시티 추진 -----정보통신과 완 료

남북교류의 중심 평화(통일)경제특구 조성

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

공약사항 및 정책목표

【 남북교류의 중심 평화(통일)경제특구 조성 】

- ① 남북경제협력단지 조성
- ② 남북교류 거점도시 조성
- ▶ 평화(통일)경제특구 지정을 통한 남북교류의 중심이자 한반도 신경제 지도의 새로운 중심도시로의 도약

1 입법논의과정

- 제17~19대 : 제17대(1개), 제18대(4개), 제19대(7개) 법안 발의
→ 임기만료로 자동폐기
- 제20대 국회 : 6개 법안 발의
박정(파주), 윤후덕(파주), 김성원(연천), 김현미(고양), 이양수(고성), 홍철호(김포)
→ 임기만료로 자동폐기(법안심사소위원회 6회, 공청회 1회)
- 제21대 국회 : 3개 법안 발의
박정(파주), 윤후덕(파주), 김성원(연천)
→ 국회 해당 상임위(외교통일위원회) 회부, 법안심사소위원회 심사 중
※ 국정 100대 과제 선정 (17.07.19)
⇒ ⑨한반도 신경제지도 구상 및 경제 통일구현

2 추진실적

- '18. 7월 : '통일경제특구의 중심은 파주다' 홍보자료 확정
- '18. 7월~ : 경기도 통일부, 시의회 등 통일경제 특구 중심지로서의 당위성 홍보
- '18. 7월~ : 경기도, 경기연구원북부연구센터, 국회의원실 관계자 등
수시 업무 협의
- '18. 8월 ~ 11월 : 통일경제특구 유치 당위성 및 홍보를 위한 연구용역

- '19. 1월 : 파주시 통일경제특구 기본계획 확정
- '19. 3월 : 파주시 남북교류협력위원회 진행사항 설명
- '19. 7월 ~ 8월 : 국회(외교통일위원회) 주관 공청회 / 경기도 주관 토론회
- '20. 1월 ~ : 특구법안 촉구 건의(국회) 및 특구 지정 의견 제출(경기도 등)
- '20. 5월 : 국회의원실(박정·윤후덕의원) 방문 법률 조속제정 건의
- '20. 7월 : 국회(박정·윤후덕·김성원의원) 주최, 통일부 주관 공청회 개최
- '20. 12월 : 공약이행평가단 회의를 통한 공약목표연도 변경 (2021년 →2022년)
- '21. 3월~5월 : 평화경제특구법 제정촉구 범시민 서명운동 추진
- '21. 4월 : 평화경제특구법 제정 필요성 및 조성방안 토론회 개최
- '21. 5월 : 국회 법제정 촉구 건의문 및 서명부 제출

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	법률제정지원	법률제정지원	법률제정지원	법률제정지원	특구지정지원

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	20	20	0	0	0	0
시 비	20	20	0	0	0	0

5 관련자료

- 해당없음

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
법률제정/특구지정	목표	제정지원	제정지원	제정지원	제정지원	특구지정지원
	실적	제정지원	제정지원	제정지원중	제정지원	

공약사항 정책실명제	주관부서	평화협력과	과	장	서	병	권	☎ 940 - 2970
			팀	장	엄	태	연	☎ 940 - 5508
			주	무	관	강	혜	☎ 940 - 5501

군 방호벽 선별 철거

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

- ▶ 접경지역에 설치된 방호벽(낙석) 중 군사적 효용 상실한 시설물을 선별·철거하여 주민 불편 해소

1 사업개요

- 위 치 : 월릉면 도내리 308-9 / 월릉면 위전리 44-79 / 야동동 96-8
- 사업량 : 방호벽 철거 3개곳
- 사업비 : 4,563,000천원
 - 도내리 533,000천원 / 위전리 330,000천원 / 야동동 3,700,000천원
- 사업기간 : '19년 ~ '20년

2 추진실적

- '19. 3월 : 월릉 도내4리 방호벽 정비예산 1회 추경 편성(533백만원)
- '19. 4월 : 특수상황지역개발 국비(국80, 시20) 신청(도로관리사업소)
 - ▶ 문산제일고, 37억원 ※ 국비 신청 탈락(7월)
- '19. 9월 : 월릉 위전리 방호벽 정비예산 2회 추경 편성(330백만원)
- '19. 10월 : 월릉 도내리 방호벽 정비 완료(시비 533백만원)
- '19. 9월 : 월릉 위전리 방호벽 정비예산 2회 추경 편성(330백만원)
- '19. 9월 : 야동동(문산제일고 앞) 방호벽 철거 특별조정교부금 확보(1,500백만원)
- '19. 11월 : 야동동(문산제일고 앞) 방호벽 철거 실시설계용역 착수(2회추경 110백만원)
- '20. 5월 : 2회 추경 2,090백만원 편성(특조금 및 시비 부족분)

- '20. 7월 : 월릉 위전리 방호벽 공사 착공
- '20. 9월 : 야동동(문산제일고 앞) 방호벽 공사 착공
- '20. 10월 : 월릉 위전리 방호벽 철거 완료(시비 330백만원)
- '20. 12월 : 주민배심원 회의를 통한 공약명 및 달성확인지표 변경
 - 당초 : 군 철조망 및 방호벽 선별 철거 / 방호벽 2개소 및 철조망 3km철거
 - 변경 : 군 방호벽 선별 철거 / 방호벽 3개소 철거
- '20. 12월 : 야동동 방호벽 공사 준공(도비 1,500백만원, 시비 2,200백만원)

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	군 협의	월릉 도내리 방호벽 철거	월릉 위전리, 야동동 방호벽 철거	-	-


4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
계	4,563	0	0	2,473	2,090	0
국 비	0					
도 비	1,500			1,500		
시 비	3,063			973	2,090	

5 관련자료

- 도내리 현장사진

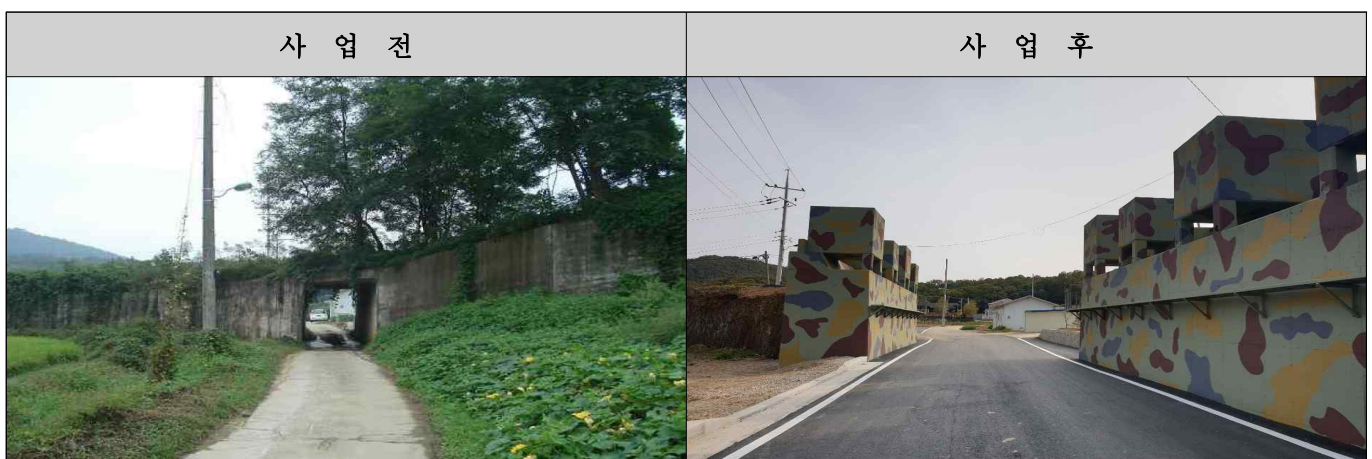

○ 위전리 현장사진



○ 야동동(문산제일고) 현장사진



6 **확인지표**

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
방호벽(3개소) 철거	목표	협의	방호벽 철거	방호벽 철거	-	-
	실적	협의	1개소 철거 (도내리)	2개소 철거 (위전리문산제일고 앞)		

공약사항 정책실명제	주관부서	평화협력과	과	장	한 경 준	☎ 940 - 2970
			팀	장	최 현 식	☎ 940 - 5818
			주 무 관		김 민 수	☎ 940 - 5811

중소기업지원센터 및 시범프로젝트센터 설치

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행단계					
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

공약사항 및 정책목표

【 남북경협 대비 중소기업지원센터 및 시범프로젝트센터 설치 】

- ▶ 남북경협 대비 중소기업지원센터 및 시범프로젝트센터를 설치하여 남북경제협력사업 거점 도시로 육성하고자 함

1 사업개요

- 중소기업지원센터 설치
 - 산·학·연 연계 파주시 전략산업 육성
 - 지식기반산업 활성화 및 중소기업 경쟁력 강화사업 추진
 - 남북경제협력사업 특화 산업으로 육성 (기존 기업지원시설 및 사업과 차별화)
 - 남북경제협력 시범사업 구축과 지원을 통한 남북경제협력 기반 조성

2 추진실적 및 계획

- '19. 4월 : 파주시-중소벤처기업진흥공단 MOU체결
- '19. 6월 : 제1차 남북경협 아카데미 개최 (100개 기업)
- '19. 11월 : 제2차 남북경협 아카데미 개최 (130개 기업)
- '20. 1월 ~ 12월 : 파주시 중소기업 지원정책 수립 및 지원센터 설치 검토
 - 파주시 중소기업 지원센터의 주요 기능, 설치 및 운영방안 등 중소기업 진흥공단 등 유관기관과 협의
- '22. 1월 ~ 12월 : 평화경제특구법 제정 및 평화경제특구 지정 추이에 맞춰 남북경제협력 시범사업 구축과 특화 사업 발굴 추진
 - 중소기업지원센터 역할, 기능을 정립하고 입지 선정

3 연차계획

'18년	'19년	'20년	'21년	'22년 이후
검토	검토	검토	검토	사전절차 및 예산확보

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
계	15,030	0	0	0		15,030
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	15,030	0	0	0	-	15,030

5 관련자료

- 해당사항 없음

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
중소기업지원센터 설치	목표	검토	검토	검토	검토	사전절차 및 예산확보
	실적	검토	검토	검토	검토	

공약사항 정책실명제	주관부서	기업지원과	과	장	이 승 조	☎ 940 - 4530
			팀	장	정 지 선	☎ 940 - 4538
			주 무 관		박 광 해	☎ 940 - 4531

면세점 유치 등 임진각 관광지 개발

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 세계 유일 분단지역인 DMZ 임진각에 평화·생태·안보 종합관광센터를 건립하여 10개 시군의 DMZ관광 거점안내 센터 역할과 면세점 유치하여 지역경제 활성화
- ※ 10개시군 : 파주, 용진, 강화, 김포, 연천, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성

1 사업개요

- 위 치 : 파주시 문산읍 마정리 1360-50 일원
- 사 업 량 : 건축 연면적 3,982m² / 2층
- 사 업 비 : 14,088백만원
- 사업기간 : 2016. ~ 2021. / 시행자 : 파주시

2 추진실적

- '15. 11월 : 중기지방재정계획 반영
- '15. 12월 : 임진각 관광지(변경) 지정고시
- '16. 3월 : 기본계획 타당성 용역 준공
- '16. 11월 : 중앙 투자심사 완료
- '17. 2월 : 건축설계 공모
- '18. 1월 : 계약심사 완료(경기도)
- '18. 2월 : 공사착수
- '18. 11월 : 상가소송으로 인한 공사중지
- '19. 5월 : 공사재착수('19. 04. 24. 상가명도소송 대법원 승소)

- '20. 6월 : 특정감사 지적사항 조치결과 제출(관광과 → 감사관)
- '20. 7. 17 : 특정감사 지적사항 조치결과 요청(과주시 → 감리단, 시공사)
- '20. 7. 21 ~ 7. 27 : 실정보고 및 공사 재착수 제출 요청(3회)
- '20. 7. 24 : 영업정지 및 전시공 위법사항 알림
- '20. 7. 27 : 공사 재착공 / 선금사용 내역서 제출 요구
- '20. 7. 29 : 선금사용 내역서 제출 촉구
- '20. 8. 27 : 공사 계약해지 통보
- '20. 10. 20. ~ 11. 20. : 공사재발주 및 계약의뢰
- '20. 11. 27. : 공사 착공
- '20. 12. : 주민배심원 회의를 통한 공약달성 목표연도 변경(2020→2021)
- '21. 4. ~ 5. : 설계변경(건축,전기) 계약심사 의뢰
- '21. 10. : 전시동(VR설치) 준공
- '21. 12. : 공사 준공

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	공사착공 면세점 검토	공사중 면세점 검토	공사중	공사 준공 면세점 유치	-

4 자원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
계	14,088	1,000	3,048	7,118	1,700	1,222
국 비	5,583	500	1,524	3,559		
도 비						
시 비	8,505	500	1,524	3,559	1,700	1,222

5 관련자료



임진각 조감도



건립 조감도

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
종합관광 안내센터	목표	착공	공사중	공사중	전체 준공	
준공	실적	착공	공사중	공사중	전체 준공	

공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과 팀 주 무	장 장 관	안 승 면	☎ 940 - 4360
					이 종 호	☎ 940 - 4727
					김 창 구	☎ 940 - 4725

임진각 평화 곤돌라 설치 추진

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

- ▶ 경계를 넘어 자유와 평화를 연결하는 파주 임진각 평화 곤돌라 설치로 DMZ 관광의 새로운 패러다임 제시

1 사업개요

- 위치 : 임진각 ~ 캠프 그리브스 일원
 - 사업량 : 곤돌라L=850m, 전망대2개소(상부4,993㎡/하부2,705㎡)
 - 사업기간 : 2018. 10. ~ 2020. 1. / 2020. 4월 운영
 - 사업비 : 327억원(민자)/공사비264억, 부대비63억
 - 운영기간 : 18년간(준공후 기부채납)
 - 출자법인 : 파주DMZ곤돌라(주) / 시 출자금 290백만원
- ※ 협약내용 : 영업이익 6% 기부/ 파주시 시민 50%할인, 4,500원(정상요금 9,000원)

2 추진실적

- '18. 10월 : 착공
 - '19. 10월 : 캠프그리브스 연결도로 공사 착공
 - '19. 10월 : 캠프그리브스 연결도로 지뢰제거 완료
 - '20. 1월 : 준공(2개월 시험운영)
 - '20. 2월 : 곤돌라 운영협약 체결(1사단)
 - '20. 4월 : 곤돌라 운행
- * 탑승객 : 121,197명('20. 08. 04.기준)

3

	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	공사착공	공사	준공 및 운영	-	-

4

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
계	32,700	10,060	18,860	3,780	-	-
민 자	32,700	10,060	18,860	3,780	-	-

5



하부정류장



상부정류장



지주

6

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
곤돌라 준공	목표	착공	준공	운영	-	-
	실적	착공	준공	운영개시	-	-

공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과장	안승면	☎ 940 - 4360
			팀장	조길현	☎ 940 - 5197
			주무관	엄주용	☎ 940 - 5196

(파평면)리비교 주변 관광 활성화 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 6.25전쟁시 미군이 임진강에 건설한 교량 중 현존하는 유일한 교량으로 역사적, 교훈적으로 의미 있는 곳으로 리비교 관광자원화 및 주변 지역 관광 벨트화로 낙후된 지역경제 활성화에 기여

1 사업개요

- 위 치 : 파평면 장파리 일원
- 사업량 : 공원조성 31,025m² / 거점센터 818.11m²(2동)
- 사업비 : 10,528백만원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년 / 시행자 : 파주시

2 추진실적

- '18. 1월 : 리비교 관광자원화 계획수립 완료(경기도)
- '18. 5월 : 황포돛배 옛 물길개발 사업 선정(특수상황/ 행안부)
- '18. 12월 : 리비교 공공디자인 설계용역 계약(디자인에코)
- '19. 2월 : 리비교 관광자원개발 기본구상 용역
- '19. 9월 : 리비교 문화공원 도시관리계획결정 기본 및 실시설계 착수
- '20. 2월 : 평화의 길 거점센터 신축 및 리모델링 실시설계 용역
- '20. 10월 : 도시관리계획 결정(파주시 고시 제202-288호)
- '20. 2월 : 평화의 길 거점센터 신축 및 리모델링 실시설계 용역
- '20. 11월 : 특수상황지역 사업 계획변경 승인(행안부→파주시)
- '21. 4월 : 소규모 환경영향평가 완료(환경부)
- '20. 10월 : 실시계획인가 완료
- '21. 11월 : 보상공고 완료
- '21. 12월 : 공약이행평가단 회의 통한 공약달성확인지표 변경완료
- 당초 : 리비교 공원사업 준공 → 변경 : 리비교 공원사업 보상추진 및 공사 착공

3 연차계획


	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	계획수립	기본구상	도시관리계획 결정 및 실시설계인가	보상 및 공사추진	공사 준공

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투입(~‘20년)	‘21년	‘22년
계	10,528	8,558	500	1,470
국 비	6,500	5,400	400	700
도 비	835	600		235
시 비	3,193	2,558	100	535

5 관련자료

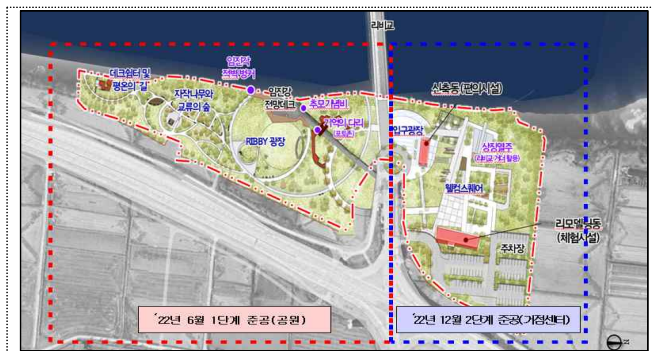

조감도(1)



조감도(2)

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
리비교 공원사업	목표	설계	실시설계	행정살차이행	보상및착공	준공
보상추진 및 착공	실적	설계	실시설계	행정살차이행	보상및착공	

공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과	장	안 승 면	☎ 940 - 4360
			팀	장	이 종 호	☎ 940 - 4727
			주 무	관	김 창 구	☎ 940 - 4725

남북철도 연결대비 KTX/SRT 문산 연장

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산
				불요 제도	재정 권한
				검토	추진 완료 불가

사업목표

【 남북철도 연결 대비 KTX/SRT 문산 연장(차량기지 문산 이전) 】

- ▶ “통일경제특구” 조성과의 연계된 인프라 확대 및 남북철도 연결을 위해 고속철도 차량기지의 경의선 문산차량기지 이전을 통한 효율적인 철도운영 및 지역에 고속철도 서비스 제공

1 사업개요

- 위 치 : 경의선 문산차량기지 일원
- 사업량 : 미정(타당성 용역 추진중)
- 사업비 : 미정(타당성 용역 추진중)
- 사업기간 : 국토부 ‘제4차 국가철도망 구축계획’ 반영 후 추진

2 추진실적

- ‘19. 10월 : ‘제4차 국가철도망 구축계획’ 반영 건의(市→道)
- ‘19. 11월 : ‘제4차 국가철도망 구축계획’ 반영 건의(道→국토부)
- ‘20. 3월 : SRT 파주연장사업 타당성 검토 용역 착공
 - 기간 : ‘20. 3. ~ ‘20. 12.
 - 수행처 : (주)화정엔지니어링
- ‘20. 11월 : SRT 파주연장 정책 토론회
- ☞ 경의선 문산차량기지 및 인근부지 등을 최대한 활용한 고속철도 차량기지 이전방안 검토 남북관계 개선, 통일경제특구 조성과의 연계하여 사업추진
- ‘21. 5월 : 공약이행평가단 회의를 통한 공약달성 목표연도 변경(2021→2022)

3 연차계획

	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	타당성 검토	관계기관 협의	용역추진	국가계획 반영	예·타 신청
공정률	용역시행 국토부장관 건의	관계기관 협의	용역추진	관계기관 협의	

4 재원계획

- 예비타당성 조사 결과에 따라 세부적인 재원계획 수립 예정

5 관련자료



노선현황(KTX/SRT)



문산차량기지

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
국가계획 반영	목표	타당성 검토	관계기관 협의	용역추진	관계기관 협의	국가계획 반영
	실적	용역시행 국토부장관 건의	관계기관 협의	용역추진	관계기관 협의	

공약사항 정책실명제	주관부서	남북철도교통과	과 장	김 태 훈	☎ 940 - 5770
			팀 장	우 상 완	☎ 940 - 5468
			주 무 관	강 민 구	☎ 940 - 5462

통일경제특구 대비 스마트시티 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 시민 삶에 편리함이 더하는 스마트시티 서비스 제공
- ▶ 남북교류 중심 역할에 필요한 스마트시티 정보인프라 구축

1 사업개요

- 위 치 : 파주시 전역
- 사업량 : 스마트시티 통합플랫폼 구축, 운정3지구 스마트시티 구축
 - (1단계) 스마트시티 통합플랫폼 및 도시 안전망 구축(공약 이행완료)
 - (2단계) 운정3지구 통신 인프라 및 시민 체감형 서비스 구축(지속 추진 중)
 - (3단계) 남북교류 거점도시 스마트시티 인프라 기반 구축
- 사업비 : 21,200백만원
 - 통합플랫폼 : 1,200백만원(국비600, 시비600)
 - 운정3지구 인프라 구축 : 20,000백만원(LH사업비)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

2 추진실적

- '19. 6월 ~ '20. 2월 : 스마트시티 통합플랫폼* 및 도시 안전망** 구축(1단계 완료)
 - * (통합플랫폼) 방법 관제영상, 교통 버스정보, 미세먼지 측정 정보 등 통합플랫폼 연계
 - ** (도시 안전망) ①112센터 긴급영상 지원, ②112 긴급출동 지원, ③119 긴급 출동 지원, ④재난상황 지원, ⑤사회적 약자(어린이·치매인 등) 지원 등
- '19. 4월 ~ '20. 8월 : 운정3지구 통신 관로 공사(1·4공구) 구축 완료(2단계 추진 중)
- '20. 8월 : LH 운정3지구 정보통신 실시 설계 용역 개시

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년 이후
내 용		스마트시티 통합플랫폼 준공 운정3지구 1·4공구 관로 구축		운정3지구 통신 인프라(2~7공구) 구축 시민 체감형 서비스 구축	
공정률		1단계(완료)		2단계(추진)	

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년 이후
계	21,200			6,200	4,000	11,000
국 비	600			600		
도 비						
시 비	600			600		
기타(LH)	20,000			5,000	4,000	11,000

5 관련자료

통합플랫폼 집중감시 화면(방범·교통)



- ☑ 방법 CCTV, 교통정보, 재난·안전·환경 정보 등 연계하여 도시상황 관리
- ☑ 생활안전 데이터(출근길사고 주의구간, 무단횡단 사고 주의구간 등)를 근거로 도시상황 관제
- ☑ 도시 현장시설물의 상태 관제

스마트시티 통합플랫폼



운정3지구 공구별 현황

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
1단계 구축 완료	목표	예산수립	1단계 구축		2단계 구축	
(5대 연계서비스)	실적	예산수립	사업 발주	사업 완료	구축중	

공약사항
정책실명제

주관부서

정보통신과

과장
팀장
주무관

이치선
정명원
이병수

☎ 940 - 4140

☎ 940 - 8728

☎ 940 - 8721
