

시민중심 자족도시

-행정은 새롭다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[12-1]	원스톱 맞춤 행정서비스 체계 구축 민 원 여 권 과
[12-2]	청년·여성 명예시장제 운영 자 치 협 력 과
[12-3]	시장직속 시민사회소통관 신설 행 정 지 원 과
[12-4]	파주시정연구원 설립 미 래 전 략 관
[12-5]	파주시 신청사 건립 추진 공 공 건 축 과
[12-6]	파주시 행정융합지원센터 건립 추진 공 공 건 축 과
[12-7]	운정3동 행정복지센터 조기 착공 추진 공 공 건 축 과
[12-8]	[조리·광탄]행정복지센터 조기 증축 완료 공 공 건 축 과
[12-9]	금촌 민·군 복합커뮤니티센터 조기 건립 공 공 건 축 과

원스톱 맞춤 행정서비스 체계 구축

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행 단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【민원콜센터 설치 및 운영】

- ▶ 시민과 소통 공감하는 고품질 민원서비스 제공

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2024	콜센터 설치 및 운영

1 사업개요

- 목적 : 다양한 전화민원의 효율적 대응 및 One-call, One-stop 서비스를 위한 상담채널 (콜센터) 구축

1단계

기반 구축
① 설계 용역 및 공간구축
③ 운영근거(조례)제정

2단계

콜센터 (단계적) 운영
① 시범운영(표준상담DB중심)
② 상담분야 단계별 확대

3단계

콜센터 안정화 (고도화)
① 양방향 콜센터 운영확장

○ 사업내용

- 구축기간 : 2023. 1. ~ 12. (2023. 11. 29. 시스템 구축 완료)
 - 정보시스템 구축, 상담프로그램 및 업무시스템 연계 서비스 구축
 - 상담실, 교육실, 회의실, 휴게실 등 인테리어 공사
- 민원콜센터 운영 : 2023. 12. 7. ~
 - 상담원 운영규모 : 상담인력: 15명 (관리자 2, 상담원 13)



- 파주시 시청로 36, 2층
- 상담인력: 15명 (관리자 2, 상담원 13)
- 상담시간: (평일) 09:00 ~ 18:00
- 대표전화 ☎ 031-940-4114

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	세부계획 수립	운영기반 마련			콜센터 운영	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	5,145		22	1,434	773	1,416	1,500
국비							
도비							
시비	5,145		22	1,434	773	1,416	1,500
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
4,200	5,145	5,145	22	1,434	736	1,416	1,500	1,510

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,273			2,273		21	21	1,434	-	-	-

5 추진현황

- 2022. 7. ~ 9. 민원콜센터 정보화 전략계획 용역 완료
 - ▶ 파주시 민원콜센터 공간 및 인력규모 등 설계
- 2022. 10. 민원콜센터 구축 공간확정 및 세부계획 수립
- 2023. 2. 「파주시 민원콜센터 설치 및 운영에 관한 조례」 제정
- 2023. 3. ~ 4. 민원콜센터 시스템 구축을 위한 절차 이행
- 2022. 6 ~ 12. 민원콜센터 시스템 구축 사업 추진
- 2023. 4. ~ 9. 부서별, 업무별 표준상담 DB 구축 (855건)
- 2023. 1. ~ 5. 상담원 운영방안 검토 및 확정 → 민간위탁
- 2023. 5. ~ 10. 상담원 민간위탁 운영을 위한 사전절차 이행
 - 2023. 5. 25. 민원콜센터 상담원 민간위탁 운영 심의 (적정)
 - 2023. 9. 18. (제241회 임시회) 민원콜센터 운영 민간위탁 의회 동의안 통과
 - 2023. 10. 13. 민간위탁 적격자심사위원회 (위탁사업자 (주)Ktis 선정)
- 2023. 11. ~ 12. 위탁사업자 상담원 구성 완료 및 기본업무교육 시행
- 2022. 11. 민원콜센터 시스템 구축
- 2022. 12. 7. 콜센터 시범 운영(단계별 운영) (2023. 12. 18. 개소)
- 2024. 1. ~ 민원콜센터 정식 운영 (상담 범위 단계적 확대)

파주시 민원콜센터 구축완료...시범운영 돌입

에너지경제신문 | 입력 2023.12.06 02:28



▲파주시 4일 민원콜센터 구축사업 완료보고회 개최. 사진제공=파주시

시민과 행정 연결...'파주시 민원콜센터' 정식 운영

| 지난 18일 개소식 개최

입력 : 2023-12-19 10:58



경기 파주시는 민원, 교통, 문화, 복지 등 시정에 대한 문의 및 민원 채널을 하나의 창구로 일원화한 '파주시 민원콜센터'의 운영을 시작했다고 19일 밝혔다.

지난 18일 열린 민원콜센터 개소식에는 김진기 파주시 부시장과 이성철 파주시의장, 시의원, 기관단체 대표와 상담실 관계자 등 40여명이 참석해 현판제막, 상담사와 소통의 시간을 가졌다.

시는 민원콜센터 운영을 위해 지난 11월까지 시스템 구축과 상담원 운영에 대한 준비를 마쳤고 지난 7일부터 시범운영을 시작했다. 시범운영 결과 등을 바탕으로 영상상담, 챗봇 상담 서비스, 1대 1 문자상담 등 상담 범위와 운영 경로를 단계적으로 확대·적용할 예정이다.

시민 누구나 파주시 민원콜센터를 이용하면 단순 민원 문의는 상담사가 직접 안내하고 담당 부서 상담이 필요한 경우, 상담사가 담당 부서를 확인하여 연결하고 있으며 상담과 동시에 필요한 정보를 문자로 받아 볼 수 있다. 민원콜센터에는 총 15명의 상담사가 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 근무한다.

김진기 부시장은 "상담사들이 소통의 최일선에서 자부심을 갖고 임해주시기를 바라며, 파주시 민원콜센터가 시민과 행정을 연결하는 '더 편하고! 더 가까운!' 행정의 결실로 이어지길 기대한다"라고 말했다.

공약사항
정책실명제

주관부서

민원여권과

과장
장무관

이성용
오미정
김혜진

☎ 940 - 4180
☎ 940 - 4188
☎ 940 - 4181

청년·여성 명예시장제 운영

사업형태	사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계						
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비에산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

- ▶ 청년·여성의 시정참여 기회 제공 및 시정에 대한 다양한 의견수렴으로 소통·참여행정 실현

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	명예시장 운영

1 사업개요

- 운영기간: 2월~11월(월2회 / 둘째, 넷째 수요일)
* 위촉식: 당일 09:00 시장 접견실
- 신분: 일일 명예직 ※ 단, 오찬 및 출장 교통편의 제공
- 대상: 파주시에 주소지 또는 사업장을 두고있는 청년, 여성, 청소년, 장애인 등
- 역할: [정책제안] 시정 의견 제시 [회의참석] 시장주재, 위원회 등 [시정홍보] SNS, 언론 등 [현장방문] 시책사업 현장 등
- 추진실적

구분	총계	청년	여성	장애인	청소년	예술인
위촉인원	20명	6명	7명	1명	5명	1명

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	연간계획 수립	청년·여성 명예시장제 운영				

3 연도별 투자계획

- 해당없음

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
			해	당	없	음		

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
	해	당	없	음		해	당	없	음	

5 추진현황 및 계획

- 2022. 9. 파주시 명예시장 운영 계획 수립
- 2023. 2. ~ 6. 2023년 상반기 명예시장 위촉 및 활동
- 2023. 5. 2023년 하반기 명예시장 대상자 모집
- 2023. 7. ~ 12. 2023년 하반기 명예시장 위촉 및 활동
- 2023. 11. 2024년 상반기 명예시장 대상자 모집
- 2024. 2. ~ 6. 2024년 상반기 명예시장 위촉 및 활동

6 관련자료



위촉식



보도자료

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	자치협력과	과	장	우 은 정	☎ 940 - 2970
			팀	장	서 현 동	☎ 940 - 4968
			주 무 관	박 준 성	☎ 940 - 4962	

시장직속 시민사회소통관 신설

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행 단계
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산
		불요	제도 재정 권한	검토 추진	완료 불가

사업목표

- ▶ 인구 50만을 넘어 100만을 향해 출발하는 민선8기의 시민의견 청취 및 소통 기능 강화를 위해 시장 직속으로 「시민사회소통관」을 신설

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2022	시민사회소통관 임용

1 사업개요

- 시민사회소통관 임용
 - 신 분: 시간선택제임기제(나급^{6급} 상당) 공무원
- 기구표



- 시민사회소통관 주요직무
 - 현장민원 및 민생현안에 관한 사항, 시장 직소민원 상담 운영
 - 주요 갈등 및 위기관리 조정 등

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	시민소통관 임용					

* 향후, 시민사회소통관 역할의 확대·강화 필요 시, 조직개편(부서 신설) 방안 검토

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	270		30	60	60	60	60
시 비	270		30	60	60	60	60


4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
270	270	270	30	60	60	60	60	

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
270			270							

5 추진현황 및 계획



- 2023. 1. 시민소통 역할의 확대·강화를 위해 시장 직속 소통홍보관 설치
(조직개편 완료)

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	행정지원과	과	장	김 은 숙	☎ 940 - 4100
			팀	장	박 광 현	☎ 940 - 4128
			주 무 관	이 현 수	☎ 940 - 4123	

파주시정연구원 설립

사업형태	사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계						
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

- ▶ 전문적인 분석을 통한 체계적인 정책개발로 책임 있는 정책수립에 기여하고 나아가 지속가능한 시정 발전을 도모코자 함

공약달성목표

달성연도	달성목표
2025	파주시정연구원 설립

1 사업개요

- 사업명: (가칭) 파주시정연구원 설립
- 설립기준: 인구 50만(「주민등록법」에 따른 주민 수) 이상의 시(‘24년 총족 예정)
- 내용: 정책연구 전담 연구원 설립으로 체계적 연구지원 시스템 구축

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	시정연구 기반조성	정책연구 지원체계 구축	사전행정절차 이행	연구원 설립	-	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년
계	2,250	-	-	50	-	2,200
국비						
도비						
시비	2,250	-	-	50	-	2,200
민자						

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
2,250		2,250	-	50	-	2,200	-	

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
50			50		50	0	50			

5 추진현황 및 계획

- 2022. 10. 타지역 시정연구원 벤치마킹 실시(고양시, 화성시)
- 2023. 1.~6. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 추진
- 2023. 5. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 중간보고(회의) 행정안전부 방문(지방연구원 설립절차 개선 관련)
- 2024. 상반기 기본계획 수립, 조례 제정, 출연동의, 총회 개최
- 2024. 하반기 행정안전부 설립 허가, 설립 추진 TF구성
- 2025. 상반기 개원준비(임·직원 채용 및 청사 재구조화 등)
- 2025. 하반기 파주시정연구원 개원

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 「지방연구원법」에 따른 설립 조건인 인구수^(50만명) 충족 지연
 - '23. 8월말, 주민등록법 상 주민 수 496,878명으로 설립 조건 미충족
 - ▶▶ 조례제정, 설립허가 등 사전절차 이행 불가
 - ▶▶ 추진 일정 변경('24년 ▶▶ '25년)

공약사항 정책실명제	주관부서	미래전략관	과	장	이 성 호	☎ 940 - 4230
			팀	장	정 지 선	☎ 940 - 2958
			주 무 관	관	이 준	☎ 940 - 2951

파주시 신청사 건립 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 신청사 건립 추진 】

- ▶ '시민추진단 구성'을 통한 시민주도형 추진

공약달성목표

달성연도	달성목표
2026	설계 공모

1 주요 사업계획

추진 단계	구분	일정	내용
	1단계	'22	· 청사건립 추진계획 수립 · 공론화 조례 제정
	2단계	'23	· 공론화위원회 구성
	3단계	'24	· 공론화용역 · 시민추진단 구성 · 공론화 추진 및 정책권고
	4단계	'25	· 공유재산관리 계획 수립 · 타당성 조사 · 투자심사
	5단계	'26	· 도시계획시설 결정 · 설계 공모
	6단계	'27~'28	· 기본 및 실시 설계
	7단계	'28~'30	· 착공 및 준공

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	청사건립 계획 수립 공론화 조례 제정	공론화위원회 구성	시민추진단 구성 공론화 추진, 결과 도출	투자심사	설계 공모	착공 및 준공

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	275			220	55		
국비							
도비							
시비	275			220	55		
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
220	275	275			275			

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
275			275							

5 추진현황 및 계획

- 2022. 10. 파주시 시민주도형 신청사 건립 추진계획 수립
- 2022. 12. 「파주시 공론화 추진에 관한 조례」 제정
- 2023. 5. 파주시 신청사 건립 공론화 추진계획 수립
- 2023. 6.~7. 공론화위원회 구성 및 위촉
- 2023. 7.~8. 공론화 제안 및 채택, 공론화위원회 회의 개최(1·2차)
- 2023. 9. 외부 전문가 자문회의
- 2024. 1.~12. 시민추진단 구성 및 공론화 추진
- 2024. 12. 공론 결과 정책 권고(공론화위원회 → 파주시)
- 2025. 정책 반영

6 관련자료



공론화위원회 위촉식



공론화위원회 회의

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과장 김은정	최정석 김윤성 박은정	☎ 940 - 5270 ☎ 940 - 5757 ☎ 940 - 5759
---------------	------	-------	-----------	-------------------	--

파주시 행정융합지원센터 건립 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행 단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 파주시 행정융합지원센터 건립 추진 】

- ▶ 파주시 행정융합지원센터 착공('24년)

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2024	공사착공

1 사업개요

- 사업위치: 금촌동 771-2번지 외 9필지(8,461㎡/2,559평)
- 시설규모: 연면적 23,518㎡(7,114평), 지하2층~지상8층
- 주요시설: 업무시설(행정) 및 지원시설
- 사업기간: 2019년 ~ 2026년
- 예산: 1,153억원(시비, 매입비 120억원 ↑, 건립비 1,033억원 + α)

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	-	투자심사	공사착공	시공	공사준공	

■ 현안사항

- ✓ 행정융합지원센터는 신청사 건립 추진 결과에 따라 사업계획 변경이 수반되는 사업으로 신청사 건립 시 타당성조사 재심사 등 행정절차 재추진 필요

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	115,300	162		17,700	32,479	32,479	32,480
국비							
도비							
시비	115,300	162		17,700	32,479	32,479	32,480
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
115,300	115,300	115,138		17,700	32,479	32,479	32,480	

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
162			162							

5 추진현황 및 계획

- 시민주도 청사건립 방향 결정에 따라 사업추진
 - 2020. 3. 공유재산관리계획 의회 승인
 - 2021. 3. 도시관리계획(공공청사) 결정(변경) 고시
 - 2022. 3. 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 청사 이전 또는 증·개축 등 다양한 방안의 청사건립에 대해 공론화를 통한 시민주도 청사건립 방향 결정에 따라 사업추진

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과	장	최 정 석	☎ 940 - 5270
			팀	장	이 준 희	☎ 940 - 5278
			주	무	관	심 규 혁

운정3동 행정복지센터 조기 착공 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 행정구역 개편 및 운정3동 인구증가에 따른 행정. 민원편의를 위해 별도 행정복지센터 건립이 시급해 운정3동 행복센터 조기 착공

공약달성목표

달성연도	달성목표
2024	공사 착공

1 사업개요

- 사업위치: 야당동 1022번지(새암공원) / 4,300㎡
- 시설규모: 연면적 4,427.13㎡(1,300평) / 지하1층 ~ 지상4층
- 주요시설: 행정복지센터, 주민자치센터, 청소년 관련 시설
- 사업기간: 2020. 10. ~ 2025. 12.
- 예산: 178억원(시비)
 - 공사비 158억원 / 설계비·건설사업관리 20억원

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	도시관리계획 등 변경 및 설계공모	설계완료	착공	준공	-	-

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	17,800	335		625	11,790	5,050	
국비							
도비							
시비	17,800	335		625	11,790	5,050	
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
17,800	17,800	17,800	335	625	11,790	5,050	-	-

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
960	-	-	960	-	730	187	543	-	-	-

5 추진현황 및 계획

- 2020. 10. 운정3동 청사분리 계획수립(자치행정과)
- 2021. 2. 지방재정 투자심사 완료(경기도)
- 2021. 11. 행정복지센터 건립계획 변경(위치변경, 사업비 증액)
- 2022. 7. 공공건축 사업계획 사전검토 완료(경기도 공공건설지원센터)
- 2023. 1. 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 4. 설계용역 중간보고 및 주민설명회
- 2023. 8. 건축인허가 접수
- 2023. 12. 기본 및 실시설계 완료
- 2024. 3. 공사 착공
- 2025. 12. 공사 준공

6 관련자료



현황도



조감도

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과장 주무관	최정석 김윤성 황인대	☎ 940 - 5270 ☎ 940 - 5757 ☎ 940 - 5754
---------------	------	-------	-----------	-------------------	--

조리음·광탄면 행정복지센터 조기 증축 완료

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 노후된 조리음 행정복지센터 및 광탄면 행정복지센터 조기 준공으로 민원업무 편리성 증대, 지역주민 문화 프로그램 이용 확대를 통한 시민의 삶의 질 향상에 기여

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	공사 준공

1 사업개요

① 조리음 행정복지센터

- 사업위치: 조리음 봉일천로 64(봉일천리 188-6,-9)
- 시설규모: 연면적 4,581.69㎡(지하1층 / 지상4층)
- 사업비: 145억원(건축비 133 / 기타부대비 등 12)
- 사업기간: 2019. 5. ~ 2022. 8

② 광탄면 행정복지센터

- 사업위치: 광탄면 혜음로 1044 / 대지면적 6,611㎡(2,003평)
- 시설규모: 연면적 1,194㎡(362평), 지상2층, 주차48대(법정18대)
- 주요시설: 주민자치센터 1개동, 창고 1개동
- 사업기간: 2021. 1. ~ 2022. 8.
- 사업비: 38.88억원(시비)

2 추진계획

① 조리읍 행정복지센터

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	준공	-	-	-	-	-

② 광탄면 행정복지센터

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	준공	-	-	-	-	-

3 연도별 투자계획

① 조리읍 행정복지센터

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	14,524	11,178	3,346				
국 비							
도 비							
시 비		10,578	3,346				
기 타		600					

② 광탄면 행정복지센터

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,888	1,030	2,858				
국 비							
도 비							
시 비	3,888	1,030	2,858				
민 자							

4 재정 집행실적

① 조리읍 행정복지센터

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
15,000	14,524	3,346	3,346							
3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	기타	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
14,524			13,924	600	4,467	4,467				

② 광탄면 행정복지센터

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
3,288	3,888	2,850	2,850							
3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,888			3,888		2,965	2,965				

5 추진현황

① 조리읍 행정복지센터


- 2019. 4. 지방재정 투자사업 심사
- 2019. 9. 건축설계공모
- 2019. 11. 중기지방재정계획 반영
- 2020. 5. 지방재정투자 재심사
- 2020. 10. 기존 청사 철거
- 2020. 12. 공사 착공
- 2022. 8. 공사 준공

② 광탄면 행정복지센터

- 2019. 8. 경기도 지방재정 투자심사 승인
- 2019. 12. 공유재산관리계획 승인
- 2020. 11. 설계공모 공고
- 2021. 9. 기본 및 실시설계 완료
- 2021. 12. 공사착공
- 2022. 8. 공사완료
- 2022. 12. 시설개선 공사

6 관련자료

① 조리읍 행정복지센터

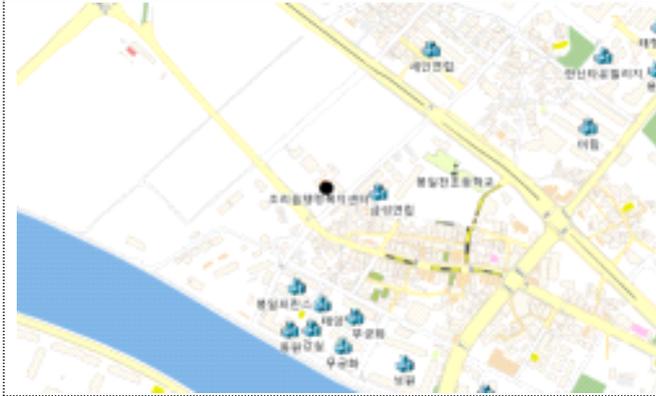

위치도



전경사진

② 광탄면 행정복지센터



위치도



현장사진

7 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과장	최정석	☎ 940 - 5270
			팀장	이준희	☎ 940 - 5278
			주무관	김윤성	☎ 940 - 5757
				송현주	☎ 940 - 5275
				황인대	☎ 940 - 5754

금촌 민·군 복합커뮤니티센터 조기 건립

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 금촌 민·군 복합커뮤니티센터 준공(24년)

공약달성목표

달성연도	달성목표
2024	공사 준공

1 사업개요

- 사업위치: 금촌동 947-28번지(3,842㎡ / 1,162평)
- 시설규모: 연면적 5,652㎡(1,710평), 지하2층/지상4층, 주차50대
- 기존건물 리모델링 및 수직·수평 증축
- 주요시설: 청년창업 및 골목상권 컨설팅센터, 청년키움스토어, 청소년네트워크센터, 맘카페·장난감도서관, 도시재생지원센터, 사회적경제·마을공동체 지원센터, 여성커뮤니티센터 등
- 사업기간: 2020. 1. ~ 2024. 6.
- 사업비: 303억원(국비 80 / 시비 223)
- 총사업비: 토지비 112억원, 공사비 167억원, 설계비·감리비 등 24억원

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별 목표	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
공사착공	공사착공	공사진행	공사준공			

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	30,300	14,105	2,925	8,685	4,585		
국비	8,000	1,600	2,340	4,060			
도비							
시비	22,300	12,505	585	4,625	4,585		
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026	2026~
26,200	30,300	30,300	17,030	8,685	4,585			

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
30,300	8,000		22,300		5,083	3,559	1,524			

5 추진현황 및 계획

- 2020. 5. 지방재정 투자심사(자체) 심의(적정)
- 2020. 6. 舊 등기소·법원 부지매입
- 2020. 8. 특수상황지역개발사업 신규사업 선정(행안부)
- 2021. 3. 지방재정 투자심사(중앙) 심의(조건부)
- 2022. 6. 기본 및 실시설계완료, 계약심사(경기도)
- 2022. 7. ~ 8. 계약심사 및 공사입찰 등
- 2022. 10. 공사 착공
- 2024. 6. 공사 준공 및 시운전

6 관련자료



조감도



보도자료

7 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과장	최정석	☎ 940 - 5270
			팀장	이준희	☎ 940 - 5278
			주무관	신동하	☎ 940 - 5274
