

시민중심 자족도시

-환경은 길이다-

관리번호	공 약 명	담당부서
[11-1]	생태친수공간 조성	 친 수 하 천 과
[11-2]	환경순환센터 현대화 사업	 자 원 순 환 과
[11-3]	폐기물처리시설 주변 지역주민 인센티브 확대	 자 원 순 환 과
[11-4]	파주북부 주민에게 안전한 수돗물 제공	 상 수 도 과
[11-5]	공공하수처리시설 확충	 하 수 도 과
[11-6]	파주형 공유자전거 도입	 도 로 건 설 과

생태친수공간 조성

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	불요 제도 재정 <u>권한</u>	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

【 생태친수공간 조성(공릉천, 금촌천, 문사천, 갈곡천, 청룡두천) 】

- ▶ 하천정비를 통한 치수기능 확보 및 지역 특성에 맞는 하천 친수공간 조성으로 시민의 삶의 질 향상

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	생태친수공간 조성 (문산천 물놀이장 조성)

1 사업개요

하 천 명	공릉천	금촌천	문산천	갈곡천	청룡두천	비고
주요내용	하천정비 10.8km 자전거도로 4.2km	하천정비 20km 산책로 등	물놀이장 조성	찬수공간 마스터플랜 수립	하천수 확보	
기 간	2014~2024	2021~2027	2022~2023	-	~2027	
사 업 비	34,546백만원	36,958백만원	1,970백만원	-	-	
추진단계	공사중	설계중	조성완료	수립완료	설계중	
시 행 자	환경부	경기도	파주시	경기도·파주시	LH	

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	-친수하천 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 추진 -문산천 물놀이장 공사 착공	문산천 물놀이장 조성				

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분		총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계		1,970	20	1,950	0	0	0	0
국	비							
도	비							
시	비	1,970	20	1,950				
민	자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
1,882	1,970	1,970	1,970							
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	기집행	2022	2023	2024	2025
1,970			1,970		1,803	20	809	974		

* 정부, 경기도 직접 시행 사업비 제외

5 추진현황 및 계획

- 【공 룡 천】 2021. 12. 공룡지구 착공
- 【금 촌 천】 2021. 5. 상류부 신속 공사 요청
2022. 2. 실시설계 착수
- 【문 산 천】 2022. 12. 물놀이장 착공
2023. 6. 개장식 및 운영 개시
- 【갈 곡 천】 2023. 6. 친수하천 마스터플랜 수립
- 【청룡두천】 2023. 11. 건천 방지 대책 실시설계 착수

6 관련자료

< 문산천 물놀이장 조성 >



위 치 도



현장사진

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	친수하천과	과 팀 주 무	장 장 관	전 재 식 관 현 선 박 상 혁	☎ 940 - 5050 ☎ 940 - 5068 ☎ 940 - 5062
---------------	------	-------	---------------	-------------	-------------------------	--

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	47,619	1,404	250	1,038	6,970	19,400	18,557
국비	30,170	350	200	800	3,240	13,500	12,080
도비	3,772	44	25	60	243	1,013	2,387
시비	13,677	1,010	25	178	3,487	4,887	4,090
민자	-	-	-	-	-	-	-

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
48,500	47,619	47,619	1,654	1,000	6,970	19,400	18,557			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	기집행	2022	2023	2024	2025
31,008	24,806	1,878	4,324		2,692	1,404	250	1,038		

5 추진현황 및 계획

- 2019. 1. 타당성 조사 용역 착수
- 2020. 4. 타당성 조사 적정 의견 통보(한강유역환경청)
- 2020. 7. 지방재정중앙투자심사 통과(행정안전부)
- 2020. 8. 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
- 2021. 5. 경기도 기술심의위원회 심의결과 통보(설계·시공 일괄입찰^{턴키방식})
- 2021. 7. 환경영향평가 용역 착수
- 2021. 10. 시설공사 입찰공고
- 2022. 6. 기본설계 적격심의(적격 : 97.7점)
- 2022. 7. 실시설계 적격자 통보(금호건설(주) 컨소시엄)
- 2023. 2. 환경영향평가 초안 제출(2. 24. 주민설명회 개최)
- 2023. 6. 실시설계도서 제출(금호건설(주) 컨소시엄)
- 2023. 10. 환경영향평가 용역 완료
- 2023. 11. 우선시공분 공사 착공
- 2026. 12. 공사 준공

6 관련자료



조감도



착공식('23.12.6.)

문제점 및 대책

- 총 사업비에 주민편익시설 설치비 편성 불가

☞ 파주시 환경순환센터 주변지역 지원에 관한 조례 제정(추진중)

공약사항
정책실명제

주관부서	자원순환과	과 팀 주 무	장 장 과	심재우 경형구 조연주	☎ 940 - 4730
					☎ 940 - 4778
					☎ 940 - 4772

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
62,900	62,900							62,900

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026

5 추진현황 및 계획

- 2021. 4. 폐기물처리시설 입지선정계획 결정·공고
- 2021. 7. 입지후보지 선정 결과 알림 (신청지 3개소 중 2개소)
- 2021. 11. 입지선정위원회 회의 실시(1차)
- 2022. 1. 전략환경영향평가 용역 착수
- 2022. 3. 타당성조사 용역 착수
- 2023. 11. 입지선정위원회 회의 실시(2차)
- 2023. 12. 입지선정위원회 회의 실시(3차)
- 2024. 2. 입지선정위원회 회의 실시(4차)
- 2024. 5. 입지선정위원회 회의 실시(5차)
- 2024. 6. 입지 결정 고시
- 2026. 6. 폐기물처리시설 설치계획 고시(주민지원사업 포함)
- 2027. 12. 폐기물처리시설 주변영향지역 고시
- 2030. 12. 시설운영 및 주변영향지역 지원 실시

6

위치도(신청부지)



탄현 낙하리 산12-1 외 2



과평 덕천리 산12외 2

7

문제점 및 대책

- 소각장 입지 결정 및 환경상 영향조사 결과에 따라 주변영향지역 지정·고시 후 주민지원사업 실시

공약사항
정책실명제

주관부서

자원순환과

과
팀
주

장
장
무
관

심재우
경형구
최민희

☎ 940 - 4730
☎ 940 - 4778
☎ 940 - 4771

구 분		총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계		23,000		10,220	6,600	6,180		
국	비							
도	비							
시	비	23,000		10,220	6,600	6,180		
민	자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
23,000	23,000	23,000	10,220	6,600	6,180			

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
23,000			23,000		6,112	3,336	2,776			

5 추진현황 및 계획

- 2019. 5. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 11. 도시관리계획(수도공급설비) 결정 및 실시계획인가
- 2022. 1. 일반수도사업 인가(한강유역환경청)
- 2022. 7. 공사착공
- 2023. 3. 토지보상 완료
- 2023. 12. 배수지 토목공사(보강토 옹벽 설치), 송·배수관로 L=2km
- 2024. 10. 공사준공(예정)

6 관련자료



위치도



조감도

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	상수도과	과 팀 주	장 장 무	김 달 수 이 화 연 강 재 경	☎ 940 - 5510 ☎ 940 - 5488 ☎ 940 - 5482
---------------	------	------	-------------	-------------	-------------------------	--

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	27,353	1,132		3,318	1,672	16,985	4,246
국비	18,452	760		2,119	1,234	11,471	2,868
도비	4,450.5	162		524	195	2,856	713.5
시비	4,450.5	210		675	243	2,658	664.5

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
9,302	27,353	26,221		3,318	1,672	16,985	4,246	

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
6,122	4,113	881	1,128		1,508	1,132	376			


5 추진현황 및 계획

- 2016. 6. 위·수탁 협약 체결(과주시 ↔ 한국환경공단)
- 2016. 8. 설계용역 착수
- 2018. 10. 하수도정비기본계획 변경 승인 완료
- 2020. 12. 공법선정(H-SBR)
- 2022. 3. 환경부 재원협의 승인(9,302백만원 → 27,353백만원)
- 2023. 10. 도시관리계획 결정(변경) 고시(도시계획과)
- 2023. 11. 공공하수도 설치인가(道→市), 감정평가 의뢰
- 2023. 12. 건설사업관리용역(건설기술심의 완료) 및 공사 발주
- 2024. 1. 건설사업관리용역 착수
- 2024. 2. 공사착공(24개월)
- 2026. 2. 공사준공

6 관련자료



위치도

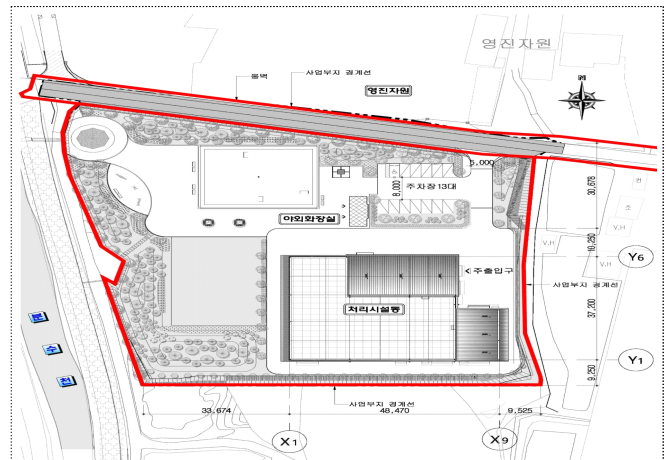

조감도

문제점 및 대책

- 광탄 공공하수처리시설 증설부지 공사 반대(신산5리 주민 일원)
 - 주민설명회 개최(신산5리 마을회관(2023.11.07.)
 - 지속적인 주민들의 요구 사항 협의

공약사항 정책실명제	주관부서	상수도과	과 팀 주 문	장 장 문 과	임 상 김 성 원 안 원 회	☎ 940 - 5530
						☎ 940 - 5528
						☎ 940 - 5522

파주형 공유자전거 도입

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 파주시와 공유 이동장치(전기자전거·전동킥보드) 민간사업자간 업무협약을 통해 공유 이동장치 관리·운영의 효율성을 제고하고, 운영구역 확대 추진.

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	파주형 공유 이동장치(운영체계) 도입

1 사업개요

○ 관내 공유자전거 현황

구분	일레클	카카오바이크	지쿠	비고
운영구역	운정·교하·금촌·문산	운정·교하·금촌	운정·교하·금촌	비도시제외
운영대수	800대	300대	700대	
이용횟수	평균 600회/일	평균 300회/일	평균 600회/일	
배치장소	철도역, 상업지역, 학교 등			
보험가입	배상물책임보험 가입 (운전자/제3자/전기자전거)			

○ 공약이행 검토사항

- 파주시는 택지개발 등으로 인구가 집중되어 있는 운정·교하·금촌·문산 지역을 대상으로 이미 (민간)공유자전거 운영 중. ^{3개사업자}
- 이에 따라 상당규모의 예산과 운영인력은 물론 민간과의 경쟁이 요구되는 (공공)공유자전거를 새롭게 도입하기 보다는 현재 도입되어 있는 (민간)공유자전거에 대한 효율적인 운영·관리 등 서비스 개선을 통해 시민들에게 쾌적한 자전거 이용환경을 제공하는데 집중할 필요. ^(효과성)
- 공약의 개념을 (공공)공유자전거를 도입한다는 취지보다는 현재 운영 중에 있는 공유자전거에 대해 파주시와 민간사업자간 업무협약을 통해 파주형 공유자전거 운영체계 도입으로 정립하고자 함.

※ 친환경 교통수단인 개인형 이동장치(전동킥보드) 사업자를 포함하여 협약 체결

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	계획수립	협약체결 및 운영	운영서비스 개선	운영서비스 개선	운영서비스 개선	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
국 비							
도 비			미		정		
시 비							
민 자							

※ 2024년부터 공유 이동장치 주차구역 확충 지원(예정)

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
			해	당	없	음				
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026

5 추진현황 및 계획

- 2023. 7. 공유자전거 사업자 사전 협의
- 2023. 8. 파주시 공유이동장치 간담회 1차(7개 업체)
- 2023. 10. 파주시 공유이동장치 간담회 2차(7개 업체)
- 2023. 12. 파주형 공유 이동장치 운영체계 도입, 상호협력 업무협약 체결
 - (참여업체) 나인투원, 더스윙, 디어코퍼레이션, 빔모빌리티, 지바이크, 카카오모빌리티, 피유앰피 ▶ 총 7개사

