

## 2024년 완료 공약

관리번호	공 약 명	담당부서
[ 1 - 2 ]	GTX-A노선 차질없는 개통	..... 교통정책과
[ 1 - 5 ]	신도심~구도심 연결 교통수단 도입	..... 버스정책과
[ 1 - 6 ]	관내 노선버스 공공성·편의성 강화	..... 버스정책과
[ 1 - 7 ]	아동·청소년 버스 이용료 단계적 지원	..... 버스정책과
[ 1 - 8 ]	서울문산고속도로 금촌IC 주변 교통혼잡 해소	..... 도로건설과
[ 1 - 12 ]	제2자유로 소음방지시설 설치	..... 도로관리과
[ 1 - 18 ]	문산~내포 도로 확포장 조기 완공	..... 도로건설과
[ 1 - 25 ]	운정역 보행육교 연장	..... 균형개발과
[ 3 - 4 ]	경기미래교육 파주캠퍼스 활성화 추진	..... 평생교육과
[ 3 - 12 ]	조리 청소년 자유공간 조성	..... 청년청소년과
[ 5 - 2 ]	파주문화재단 설립	..... 문화예술과
[ 5 - 9 ]	교하중앙공원 리모델링 및 공원주차장 확충	..... 도시관리과
[ 5 - 10 ]	월롱산 숲공원 등 여가시설 확충	..... 산림정원과
[ 5 - 12 ]	캠프하우즈 공여지 내 문화·체육시설 확대	..... 문화예술과 체육과
[ 5 - 13 ]	국제규격 인공암벽장 건립	..... 체육과
[ 6 - 5 ]	임진각 일대 한반도 스마트관광 거점화 지속 지원	..... 관광과
[ 6 - 7 ]	수변관광지 개발 추진	..... 균형개발과
[ 6 - 9 ]	감악산 국립 자연휴양림 조기 조성	..... 산림정원과
[ 7 - 9 ]	문산 보건지소·노인복지관 설치 및 운영	..... 문산보건센터
[ 7 - 14 ]	산후조리 공공지원 사업 확대	..... 운정보건소
[ 7 - 16 ]	어린이 장난감 도서관 설치	..... 보육아동과
[ 9 - 1 ]	안전한 등·하굣길 지원확대	..... 교통정책과
[ 10 - 3 ]	농산물 가공센터 지원 확대	..... 도시농업과
[ 12 - 1 ]	원스톱 맞춤 행정서비스 체계 구축	..... 민원여권과
[ 12 - 7 ]	운정3동 행정복지센터 조기 착공 추진	..... 공공건축과
[ 12 - 9 ]	금촌 민·군 복합커뮤니티센터 조기 건립	..... 공공건축과

GTX-A노선 차질없는 개통

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	파주	<u>기타</u>	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	<u>권한</u>	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>【 안전하고 빠른 공사로 2024년내 정상 개통 】</div> <div> <div>▶ 국내 최초의 광역급행철도를 2024년까지 정상적으로 개통하여 파주시민에게 빠르고 편리한 광역철도 서비스 제공</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>달성목표</div> </div>
	<div> <div>2024</div> <div>개통</div> </div>

1

사업개요

○ 노 선 : 파주 운정 ~ 삼성(L=46.0km)

\*향후 운영(운정~동탄)

○ 사업비 : 3,708,037백만원

○ 사업기간 : 2018. 12. ~ 2024. 下.

○ 시행사 : 에스지레일 주식회사

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.
목표	공사	공사	개통

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,708,037	1,236,892	637,608	714,372	1,031,118	88,048	-
국비	1,174,130	362,265	330,862	312,171	127,000	41,832	-
도비	107,782	42,215	13,768	25,467	22,538	3,794	-
시비	82,304	42,215	10,484	21,557	5,067	2,981	-
고양	25,479	-	3,284	3910	17,471	814	-
파주							
기타*	2,318,343	790,197	279,209	351,267	859,042	38,628	-

※ 지방비 : 서울시, LH공사, 민자사업비 사업비

## 4

## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
3,550,546	3,708,037	3,708,037	1,836,111	762,697	1,010,392	98,837	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비*	기타*	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
3,708,037	1,174,130	107,782	107,782	2,318,343	3,708,037	1,874,499	714,372	1,031,118	88,048	

\* 시비 : 고양시, 파주시 / \* 기타 : 서울시, LH공사, 민자사업자 사업비


## 5

## 추진현황 및 계획

- 2016. 6. 제3차 국가철도망 구축계획 반영
- 2018. 12. 실시협약 체결 및 사업시행자(SG레일) 지정
- 2018. 12. 착공식 개최
- 2019. 6. 착공계 제출(SG레일→국토부)
- 2024. 12. 개통

## 6

## 관련자료

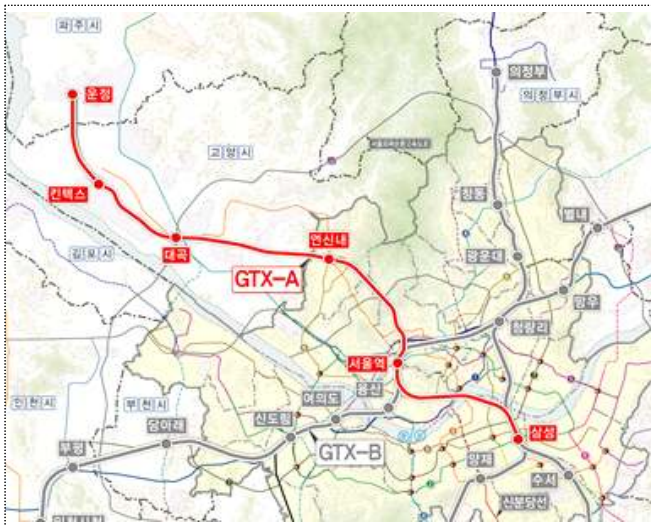

노선도



개통 홍보 자료('24.12.28.)

공약사항 정책실명제	주관부서	교통정책과	과 팀 주	장 장 무 관	우 상 완 박 재 영 이 은 규	☎ 940 - 5770 ☎ 940 - 5819 ☎ 940 - 5796

## 신도심~구도심 연결 교통수단 도입

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

## 사업목표

## 【 신도심~구도심 연결 신교통수단 도입 】

- ▶ 신도심과 구도심을 연결하는 신교통수단 도입방안 검토
- ▶ GTX~신도심~구도심을 연결하는 시내버스 노선 개편·신설

## 공약달성목표

달성연도	달성목표
2024	GTX 연계 운영

## 1 사업개요

## ○ GTX ~ 신도심 ~ 구도심을 연결하는 시내버스 노선 개편·신설

- 파주형 급행 버스 2개 노선 도입 신·구도심 연결
- 적성·문산·파평 권역 : 45분내 환승체계 구축
- 법원·파주·광탄 권역 : 40분내 환승체계 구축

## 2 추진계획

## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표		운행노선 검토	GTX 개통과 연계 운영		

## 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	4,220	-	-	-	-	2,420	1,800
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,220	-	-	-	-	2,420	1,800
민자	-	-	-	-	-	-	-

#### 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
미정	4,220	4,220	-	-		2,420	1,800	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
4,220	-	-	4,220	-	2,343	-	-	-	2,343	-

#### 5 추진현황 및 계획

##### ○ 2022. 9. 신교통수단 운영 사례 확인

- BRT(간선급행버스 체계), DRT(수요응답형 버스 플랫폼)
- GRT(유도고속차량), 바이모달(버스와 지하철을 혼합한 신개념 차량)

##### ○ 2023. 5. GTX 개통 노선개편 주민 의견 수렴

총접수건수	지역별(건)	운정3지구		운정1.2지구		기타	
		420		158		102	
680건	대상유형별(건)	시내버스		마을버스		똑버스/택시	
		321		332		6	

총접수건수	지역별(건)	운정3지구		운정1.2지구		기타	
		772		94		291	
2차 1,157건 (2023. 11.)	대상유형별(건)	시내버스		마을버스		기타	
		202		65		890	

- 주요건의사항 ① 운정3지구 신규 입주단지에 대한 노선 신설, 증차, 변경
- ② 서울 및 대화역 방면 노선 신설
- ③ 운정역, 야당역 연계 노선 확보
- ④ GTX-운정역 연계 노선 확보(북파주 포함 / 10분 내 배차)

##### ○ GTX ~ 신도심 ~ 구도심을 연결하는 시내버스 노선 개편

- 빠르고 정확한 대중교통 서비스 제공을 위해 신도시와 구도심을 연결하는 파주형 급행 교통수단 검토



6

## 관련자료

- 해당없음

7

## 문제점 및 대책

- 현재 시행되고 있는 신교통수단으로는 바이모달트램, 유도고속차량(GRT) 등이 있으나 파주시 구도심 도로 기반시설 내에는 운영이 어려움
- 시내버스 노선 개편·신설을 통해 신도심과 구도심을 빠르고 정확하게 연결하는 방안 추진

공약사항 정책실명제	주관부서	버스정책과	과 팀 주 무	장 장 무 관	박 한 수	☎ 940 - 5760
					김 장 회	☎ 940 - 5768
					임 지 사	☎ 940 - 5761

사업형태	사업주체				이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계				
신규	<u>계속</u>	<u>국가·도</u>	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표						
<b>【 관내 노선버스 공공성·편의성 강화 】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 노선버스 준공영제 단계적 전환</li> <li>▶ 광역급행(M)버스 확대 및 서비스 개선</li> <li>▶ 마을버스 체계 구축으로 지역주민에게 균형있는 대중교통 서비스 개선</li> </ul>	<table> <tr> <th>달성연도</th><th>달성목표</th></tr> <tr> <td>2024</td><td>준공영제 전환</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>마을버스 노선개편</td></tr> </table>	달성연도	달성목표	2024	준공영제 전환	2024	마을버스 노선개편
달성연도	달성목표						
2024	준공영제 전환						
2024	마을버스 노선개편						

1

사업개요

- ① 일반버스 준공영제 전환

○ 사업대상 : 총 15개(95대)

- 시(군)↔시(군) 간 운행 : 9개 / 시(도)↔시(도) 간 운행 : 6개

○ 전환(예정)시기 : 2024년 1월 ~ 2027년

○ 추진방향(안)

- 예산지원방식 : 공공지원형(현운행노선) + 노선입찰형(신설,휴지,반납노선)

- 노선 인·면허권 조정 : 파주시 → 경기도 이관

※ 향후 경기도 면허 이관 후 道에서 노선 신설(조정) 및 대수 증·감차
- ② 광역버스(M)버스 확대 및 서비스 개선

○ (광역급행) M7111, M7154 ➡ 대광위 준공영제 전환 추진

○ (직행좌석) 경기도 공공버스<sup>준공영제 13개 노선</sup> ➡ 대광위 전환으로 시분담을 최소화
- ③ 마을버스 노선개편

○ 사업대상 : 9개 노선 67대

- 신설 2개 노선 18대, 증차 5개 노선 31대, 변경 2개 노선 18대

○ 사업내용 : GTX-A 노선 개통에 맞춰 GTX 중심 버스노선을 개편하여 환승편의 증진, 이동시간 단축하여 대중교통 서비스 개선

## 2 추진계획

### ① 일반버스 준공영제 전환

#### ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표		준공영제 단계적 전환검토	준공영제 단계적 전환 시행	준공영제 단계적 전환 추진	준공영제 단계적 전환 추진

### ② 광역버스(M)버스 확대 및 서비스 개선

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표	2개 노선 전환 완료			13개 노선 전환 완료	

### ③ 마을버스 노선개편

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표		준공영제 전환 100% 완료	GTX 중심 노선개편	GTX 중심 노선개편 안정화	

## 3 연도별 투자계획

### ① 일반버스 준공영제 전환

(공영·벽지 예산만 반영/추가 준공영제 예산은 차후 반영)							(단위: 백만원)
구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	40,148		984	1,085	10,817	14,083	13,179
국 비	184		16	22	28	91	27
도 비	8,793		160	168	4,604	3,745	116
시 비	31,171		808	895	6,185	10,247	13,036
민 자							

### ② 광역버스(M)버스 확대 및 서비스 개선

							(단위: 백만원)
구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	29,537		541	1,135	2,462	7,310	18,089
국 비	13,830		-	325	1,000	3,655	8,850
도 비	4,266		-	97	300	1,097	2,772
시 비	11,141		541	713	1,162	2,558	6,467
민자							

※ 광역급행노선 예산만 반영(경기도 공공버스 예산은 미포함)



### ③ 마을버스 노선개편

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	9,511			901	1,140	3,580	3,890
국비	1,078			358	240	240	240
도비							
시비	6,608			358	715	2,740	2,795
민자	1,825			185	185	600	855

## 4 재정 집행실적

### ① 일반버스 준공영제 전환

(공영·벽지 및 道주관 시·군 연계노선 포함)

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
5,550	40,148	40,148	984	1,085	10,817	14,083	13,179	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
40,148	184	8,793	31,171		26,851	984	1,085	10,817	13,965	-

### ② 광역버스(M)버스 확대 및 서비스 개선

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
4,500	29,537	29,537	541	1,135	2,462	7,310	18,089	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
29,537	13,830	4,266	11,141		8,016	541	1,135	2,731	3,609	-

### ③ 마을버스 노선개편

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
108,790	9,511	9,511		901	1,140	3,580	3,890	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
9,511	1,078		6,608	1,825	5,491		771	1,140	3,580	

## 5 추진현황 및 계획

### ① 일반버스 준공영제 전환

#### ○ 시내버스 노선 정상화 지속 추진

- 감회운행 노선 행정처분을 통한 노선 정상화 촉구
- 노선반납 유도 등 운수업체 정상화 방안 촉구
  - '23. 1. ~ 24. 1. 운수업체 본사 방문(8회) / 시내버스 정상화 촉구 공문 발송(8회)
- 노선반납을 통한 노선 통합·조정·감차 노선개편 추진
  - 신성교통 노선반납 : 5개노선(39대)<sup>노선입찰</sup>

#### ○ 시내버스 준공영제<sup>(경기도 공공관리제)</sup> 단계적 추진

- (道 주관) 준공영제 단계적 전환 시행
  - 공공지원 : 70-1번(6대), 10번(10대)<sup>'24년 1월</sup>  
30번(8대), 31번(6대), 70번(7대), 90번(11대)<sup>'24년 10월</sup>
  - 노선입찰 : 80번(7대), 150번(11대), 567번(11대), 900번(8대)<sup>'24년 12월 운송개시</sup>
- (市 주관) 준공영제 단계적 전환 시행
  - 공공지원 : 12번(6대)<sup>'24년 7월</sup>, 11-1번(1대)<sup>'24년 9월</sup>
  - 노선입찰 : 9번(2대)<sup>'24년 12월 운송개시</sup>, 23번(1대)<sup>'26년 1월 운송개시</sup>

#### ○ 향후계획

- 추가 반납노선, 맞춤형버스, 공영버스 단계적 경기도 공공관리제 전환 추진

### ② 광역버스(M)버스 확대 및 서비스 개선

#### ○ 광역급행버스 준공영제(대광위) 전환 운영 추진

- 광역급행 준공영제 전환을 통한 국고부담 상향으로 인한 시·군 부담률 감소
  - (M7111) 준공영제 전환 운행 : '22년 11월 운행(11대, 63회)
  - (M7154) 준공영제 전환 운행 : '24년 9월 운행( 7대, 35회)
  - (9709번 등) 직행좌석 준공영제 전환 : '25년 12월 (13개 노선, 108대)

### ③ 마을버스 노선개편(GTX 중심 버스노선 개편)

#### ○ 기본방향

운정권 운정 · 교하	금촌권 금촌 · 탄현 · 조리
✓ 배차간격 10분, 도착시간 15분	✓ 배차간격 15분, 도착시간 30분
✓ GTX 연계노선 : 10노선 72대	✓ GTX 연계노선 : 3노선 23대

▲ (기존노선) 이용수요와 민원을 고려해 노선변경보다 연장 위주로 GTX 연계

▲ (신설노선) 기존노선 개편으로도 GTX에 연계되지 못한 구역은 노선신설

#### ○ 노선계획

변경전			변경후		
노선	기종점	대수	변경사항	대수	신설·증차
7개 노선		36	9개 노선	72	36
070AB	신설	-	운정순환(A/B노선)	12	12
075	야당역~초롱꽃	8	GTX 경유	8	-
076	야당역~해오름	4	GTX, 해오름 경유	7	3
077	야당역~지산중	3	GTX 연장	8	5
081	야당역~운정고	4	GTX 연장	6	2
082	운정역~동패고	3	GTX 연장	5	2
072	신설	-	금촌~GTX	6	6
089	조리~교하	10	GTX, 교하지구 경유	10	-
037	탄현~운정중앙역	4	해오름, GTX 경유	7	3
037-1	신설	-	해오름, GTX 경유	3	3

### 6 관련자료

○ 해당없음

### 7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	버스정책과	과장	박한수	☎ 940 - 5760
			팀장	김장희	☎ 940 - 5768
				김정은	☎ 940 - 5297
			주무관	임지산	☎ 940 - 5761
				이명백	☎ 940 - 5296

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> <li>경제적으로 취약한 아동·청소년들의 교통비 부담 완화</li> <li>청소년의 이동권 보장으로 삶의 질 개선</li> </ul>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>청소년버스이용료 단계적 지원</div> </div>

1

사업개요

- 사업내용 : 경기도 청소년 교통비 활용을 통한 확대 지원
- 지원대상 : 6세 ~ 18세 저소득 청소년

기존	확대
(2023년) 지원금액 : 年 12만원 (도70, 시30) (현행) 지원금액 : 年 24만원 (도70, 시30)	<div>⇒</div> 지원금액 : 年 32만원(현행 + 8만원)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표		보건복지부 협의를 추진	사업추진	사업지속	사업지속	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	342				152	82	108
국비							
도비							
시비	342				152	82	108
민자							

4

## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
3,600	342	342			152	82	108			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
342			342		170			95	75	

5

## 추진현황 및 계획

- 2023. 2. 방침 결재
- 2023. 5. 道 시스템 사용 협조 요청(市 → 道)
- 2023. 5. 사회보장제도 협의 요청(市 → 보건복지부)
- 2023. 5. 道 시스템 사용 조건부 승인(道 → 市)
  - 조건부 승인 : 사회보장제도 협의 결과에 따라 승인 여부 결정
- 2023. 8. 사회보장제도 협의 완료
- 2023. 9. 2024년 본예산 요구
- 2024. 1. 사업 시행

6

## 관련자료

- 해당없음

7

## 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항  
정책실명제

주관부서

버스정책과

과장  
팀장  
주무관

박한수  
김수환  
정동운

☎ 940 - 5760  
☎ 940 - 2488  
☎ 940 - 2482

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표	공약달성목표
<div>【 파주병원~금촌IC/봉일천~금촌IC 도로 확장(L=0.8km) 】</div> <div> <div>▶ 서울문산고속도로 금촌IC 교통량 증가에 따른 도로확·포장 추진(지정체 해소)</div> </div>	<div>달성연도</div> <div>2024</div> <div>달성목표</div> <div>파주병원~금촌교차로 (파주병원~금촌IC/봉일천~금촌IC) 도로 확장 착공</div>

1

사업개요

- 사업명 : 서울-문산고속도로 금촌IC 개선
- 위치 : 파주시 금릉동 일원 (파주병원~금촌교차로)
- 사업량 : 도로확포장 L=0.8km
 

\* (금촌C 방면) 1개차로씩 도로확포장
 

①파주병원~금촌C<0.3㎞>

②봉일천방향~금촌C<0.5㎞>
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 25억원 (공사비 23, 설계비 2)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	예산확보	실시설계용역, 도로관리계획 (변경)결정	공사 착공 및 공사 완료			

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,500			200	2,300		
시비	2,500			200	2,300		

## 4

## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
2,500	2,500	2,500		200	2,300			

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,500			2,500		2,499		159	1,765	575	

## 5

## 추진현황 및 계획


- 2020. 11. 20. 금촌IC 개선 건의(市→국토부)
- 2020. 11. 23. 금촌IC 개선 시장건의문 전달(市→국토부장관비서실)
- 2020. 11. 24. 금촌IC 개선 협조 요청(市→서울문산고속도로)
  - \* (서울문산고속도로) 수익성이 부족하여 '재정사업'으로 국토부에 협조 요청
- 2020. 11. 24. 금촌IC 개선 건의에 대한 회신(국토부→市)
  - ① 개통 초기인 바 교통량 변화추이와 나들목 신설의 경제적 타당성 검토 필요
  - ② 운영노선에 IC 추가할 경우 관련지침에 따라 요구자가 타당성 조사용역 수행해야 함
- 2021. 4. 29. 금촌IC 개선 관련 국토교통부 방문
- 2021. 5. 4. 금촌IC 교통정체 대책회의 (市, 북부경찰청, 파주경찰서, 서울문산고속도로)

〈기시행〉 고속도로 진입구간 좌회전 교통신호 확대 시험운영 (150→200초) ➡ “지정제 일부 해소”

- 2023. 2. 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 9. 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 고시
- 2024. 1. 실시설계용역 완료 및 공사발주
- 2024. 3. 공사 착공
- 2024. 9. 임시 개통
- 2024. 12. 공사 완료

6

## 관련자료

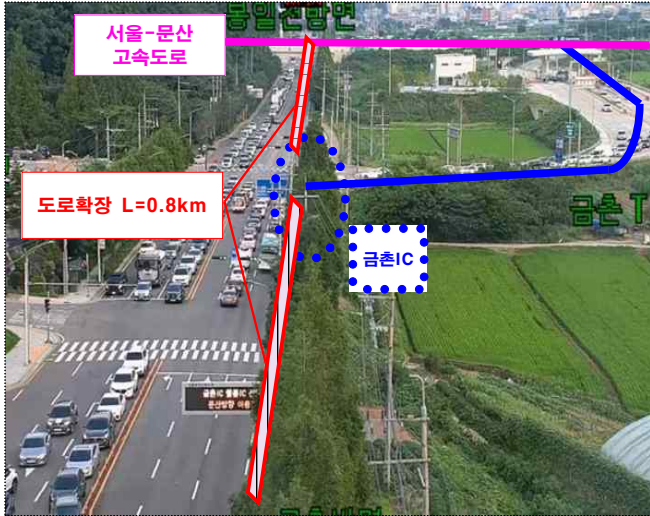

<공사 전>



<공사 후>

7

## 문제점 및 대책

○ 해당 없음

공약사항  
정책실명제

주관부서

도로건설과

과  
팀  
주

장  
장  
무  
관

이  
이  
강  
종  
형  
규  
신  
구

☎ 940 - 4640  
☎ 940 - 4658  
☎ 940 - 4652



제2자유로 소음방지시설 설치

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
<b>【 제2자유로 소음저감을 통한 주민불편 해소 】</b> ▶ 파주시 입주민 및 방문객이 증가하며, 이에 따른 제2자유로 차량통행량 증가로 인해 발생한 소음을 저감하여 주변 입주민의 불편을 해소		달성연도	달성목표
		2024	공사완료

1

사업개요

- 지방도357호선 복층저소음포장 공사
- 사업명 : 지방도357호선 복층저소음포장 공사
  - 구간 : 산내교차로 ~ 한울마을1단지(아이파크)
  - 사업량 : 기존도로 파쇄 및 복층 저소음포장 L=2km, B=4~6차로
  - 사업비 : 5,648백만원(LH 54억, 파주시 2.48억)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	-	-	사업착공 및 사업완료	-	-	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	5,648	-	-	-	5,648	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	248	-	-	-	248	-	-
LH	5,400	-	-	-	5,400	-	-

## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
2,300	5,648	5,648	-	-	5,648	-	-	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
5,648	-	-	248	5,400	5,648	-	-	5,648	-	-

## 추진현황 및 계획

- 복층저소음포장공사 협의 및 완료
- 2024. 3. 복층저소음포장공사 일정 협의  
(과주시: 폐기물처리, LH: 포장공사)
  - 2024. 7. 폐기물처리 착수(과주시) / 공사착공(LH)
  - 2024. 11. 폐기물처리 준공(과주시) / 공사완료(LH)

## 관련자료

- 해당 없음

## 문제점 및 대책

- 해당 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로관리과	과 팀 주 무	장 장 관	류 박 김	기 연 광	섭 진 률	☎ 940 - 5390
								☎ 940 - 4848
								☎ 940 - 4841

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 <b>계속</b>	<b>도</b>	파주	기타	<b>임기내</b>	임기후	<b>예산</b>	비예산	불요	제도	<b>재정</b>	권한	검토	추진	<b>완료</b>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 임월교~내포IC 구간 확장으로 병목구간 차량정체를 해소하고 편리한 도로교통 제공</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>공사준공</div> </div>

1

사업개요

- 사업명 : 문산~내포 도로확포장(지방도 359호선)
- 위치 : 파주시 문산읍 임월교 ~ 내포IC
  - \* (1단계) 문산읍 문산리 140-10~내포리 454-2, (2단계) 내포리454-2~내포리 548-10
- 사업량 : 도로확포장 L=1.98km, B=20m(왕복4차로), 교량 1개소(240m)
- 사업기간 : 2015. ~ 2024.
- 사업비 : 358억원 (공사비 286, 보상비 72)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사진행	공사준공 (1단계)	공사완료			

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	35,809	20,910	6,397	8,502			
국비	1,000	1,000					
도비	34,809	19,910	6,397	8,502			

4

## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
35,809	35,809	35,809	27,307	8,502						
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
35,809	1,000	34,809			35,809	27,307	8,502			


5

## 추진현황 및 계획

- 2015. 2. 지방재정 투자심사 완료
- 2015. 7. (1단계) 실시설계 착수
- 2017. 9. (2단계) 실시설계 착수
- 2018. 6. (1단계) 실시설계 완료
- 2019. 3. (2단계) 실시설계 완료
- 2019. 8. (1단계) 도로구역 결정 고시
- 2019. 6. (1단계) 공사 착공
- 2019. 10. (2단계) 도로구역 결정 고시
- 2021. 11. (2단계) 공사 착공
- 2023. 6. 공사 준공 및 개통 (1단계 / 임월교~방촌교차로, L=0.82km)
- 2024. 10. 공사 준공 (2단계 / 방촌교차로~내포IC, L=1.16km)

6

## 관련자료

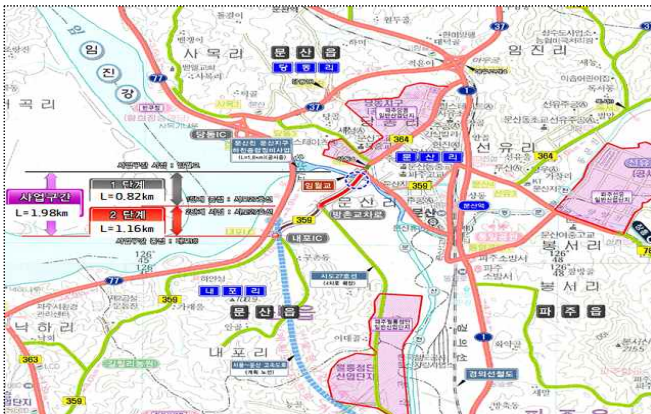

&lt;위 치 도&gt;



&lt;현장사진&gt;

7

## 문제점 및 대책

- 해당 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로건설과	과	장	이	종	호	☎ 940 - 4640
			팀	장	이	민	우	
			주	무	관	구	경	☎ 940 - 4657
						모		☎ 940 - 4654

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계			
신규 <b>계속</b>	국가·도	파주	<b>기타</b>	<b>임기내</b>	임기후	예산	<b>비예산</b>	<b>불요</b>	제도	재정	권한	검토	추진	<b>완료</b> 불가

사업목표	공약달성목표	
<ul style="list-style-type: none"> <li>기존 운정역 공중보행데크(300m)를 정비하고 가람마을 라온공원(문화공원)까지 보행육교를 신설(183m)하여 안전하고 편리한 보행환경 조성</li> </ul>	달성연도	달성목표
	2024	공사 착공

1

사업개요

- 사업규모 : 보행데크 L=483m (정비 300m, 신설 183m)
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 사업비 : 250 ~ 300억원
- 시행자 : (주)하나자산신탁 [P1·P2블록 시행사]

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	기존 보행데크 실시설계 착수	신설 보행데크 실시설계 착수	공사착공	공사추진		공사준공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	민간시행사 공공기여 방안(비예산 사업)						

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
		민간시행사 공공기여 방안(비예산사업)						



## 5 추진현황 및 계획

- 2019. 12. 운정역 앞 특별계획구역 세부개발계획 수립 고시
  - 공중보행데크 정비·신설 관련 사업시행자 공공기여방안 반영
- 2021. 4 P1·P2블록 주택건설사업계획 승인
- 2022. 9. 기존 보행데크 실시설계 착수
- 2024. 2. 신설 보행데크 실시설계 착수
- 2024. 9. 실시설계 완료 및 행정절차 이행
- 2024. 12. 공사발주 및 착공
- 2026. 8. 준공

## 6 관련자료



위치도



조감도



구분	1구간	2구간	3구간	4구간
위치	운정역~P1P2경계	P1P2 사업구역	P1P2경계 ~ 운정 복합용지	운정 복합용지 ~ 라온공원
길이	140m	160m	300m	183m
내용	기존 보행데크 정비		실시설계 반영 (공사 제외)	보행데크 신설
비고	공공기여 구간	특별계획구역	-	공공기여 구간

- 운정역 앞 특별계획구역(P1·P2블록) 사업시행자 보행육교 공공기여 사업이 적기에 완료될 수 있도록 관계부서(균형개발과, 도시관리과, 도로관리과), 민간시행사 간 적극적인 업무협력추진

공약사항  
정책실명제

주관부서

균형개발과

과장  
팀장  
주무관

황인배  
이창원  
강예린

☎ 940 - 5720  
☎ 940 - 5328  
☎ 940 - 5321

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표								공약달성목표			
<b>【경기미래교육캠퍼스를 활용한 창의적 인재 양성】</b> ▶ 청소년이 급변하는 미래사회에 대응할 수 있도록 경기미래교육캠퍼스의 '창의 및 영어 교육 프로그램'과 연계한 체험프로그램 운영 지원								달성연도	달성목표		
								2024	경기미래교육 파주캠퍼스 활성화		

1

사업개요

- 사업명 : 창의 및 영어프로그램 위탁교육 사업
- 위치 : 창의과학키움센터(경기미래교육캠퍼스 內)
- 사업주체 : 경기도평생교육진흥원
- 사업대상 : 파주시 관내 초·중등 학생
- 지원근거 : 파주시 창의인성 및 발명교육 지원 조례
- 기관별 역할
  - (파주시) 창의 및 영어프로그램 위탁교육비 지원
  - (경기미래교육캠퍼스) 프로그램 운영

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	사업협의를	운영계획수립	프로그램 운영			

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	240				80	80	80
국비							
도비							
시비	240				80	80	80
민자							



## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
600	240	240	-	-	80	80	80	지속추진		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
240	-	-	240	-	160	-	-	80	80	-

## 추진현황 및 계획


- 2025. 2. ~ 4. 영어교육 및 창의체험 프로그램 참여 안내  
(경기미래교육과주캠퍼스 → 각 학교)
- 2025. 4. ~ 12. 프로그램 운영 추진
- 2026. 2. 위.수탁 협약 체결(파주시↔경기미래교육과주캠퍼스)

구 분	대 상	사업예산	비 고
합 계		80,000천 원	
영어교육(숙박교육)	초, 중 학생	30,000천 원	
창의교육(당일교육)		50,000천 원	챗GPT, AI, 드론

## 관련자료



경기미래교육 파주캠퍼스 지도

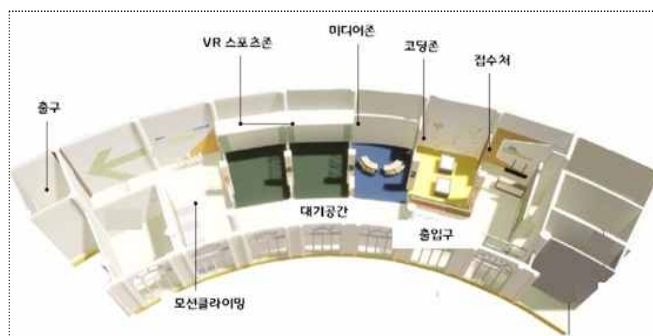

창의과학키움센터 평면도

## 문제점 및 대책

- ### ○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	평생교육과	과 팀 주 문	장 장 관	최 심 정	희 명 혜	진 자 지	☎ 940 - 5250
								☎ 940 - 5035
								☎ 940 - 5034

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
【 조리 청소년 자유공간 조성 】		달성연도	달성목표
		2024	조리 청소년 자유공간 조성 착공

1

사업개요

- 위치 : 조리읍 공릉장터길 46, 1층
- 사업량 : 연면적 291.12㎡내외
- 사업비 : 4억원(시설비 3억원, 임대료 및 자산취득비 1억원)
- 사업기간 : 2023. 10 ~ 2024. 10. ※ ‘23. 11. 보증금 계약
- 주요시설 : 북카페, 동아리실, 댄스연습실, 미디어실 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	위치선정	임차계약	착공 및 준공	운영		

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	400			50	350		
국비							
도비	90				90		
시비	310			50	260		
민자							

4

## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
700	400	400		50	350			

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
400		90	310		374		51	323		

5

## 추진현황 및 계획

- 2023. 6. 재정지출 수반사업 사전협의
- 2023. 11. 임차계약
- 2024. 2. 실시설계
- 2024. 8. 착공
- 2024. 11. 준공

6

## 관련자료

- 해당없음

7

## 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항  
정책실명제

주관부서

청년청소년과

과장  
팀장  
주무관

김지숙  
김명기  
김영숙

☎ 940 - 8650  
☎ 940 - 5228  
☎ 940 - 5221

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>           ▶ 문화정책의 연속성 및 전문성을 확보하여 파주의 지역문화 역량 강화         </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>파주문화재단 설립</div> </div>

1

사업개요

- 명칭 : 재단법인 파주문화재단
- 설립형태 : 출연기관(비영리 재단법인)
- 설립시기 : 2024. 10. 8.(출범일 2024. 11. 15.)
- 기본재산 : <sup>출범시</sup>3억원 / 총 8억원
- 운영재원 : 출연금, 보조금, 재단수익금 등
- 운영주체 : 시 주관 법인 설립 후 자체 운영
- 재단 사업범위 및 내용

사업범위	내용
문화예술진흥사업	생활문화사업, 문화예술교육사업, 지역문화예술 인력 양성
문화복지사업	취약계층 문화복지 지원, 예술인 창작지원 등
지역문화 콘텐츠 사업	문화유산 활용사업, 문화자원 활용 축제·공연
문화시설 운영	공연장 운영·관리, 음향기술기계 및 무대감독 등

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	설립기본계획 연구용역착수	사전절차	재단 설립 준비 및 출범	재단 운영	재단 운영	재단 운영

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026
계	11,488		50	80	933	5,051	5,374
시 비	11,488		50	80	933	5,051	5,374

※ 사업수입 미포함

### 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
1,130	11,488	11,488	50	80	933	5,051	5,374	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
11,488	-	-	11,488	-	6,114	50	80	933	5,051	-

### 5 추진현황 및 계획

- 2022. 8. 파주문화재단 설립 추진계획 수립
- 2022. 12. 기본계획 수립 연구용역 계약 및 착수
- 2023. 4. 경기도 출자출연기관 심의위원회 심의 완료(1차)
- 2023. 5. 기본계획 수립 연구용역 최종보고회 및 용역 종료
- 2023. 6. 재단설립계획 경기연구원 타당성 검토 의뢰
- 2024. 3. 재단설립계획 경기연구원 타당성 검토 완료 및 결과 공개
- 2024. 4. 경기도 출자출연기관 심의위원회 심의 완료(2차)
- 2024. 5. 조례제정안, 출연동의안 원안 가결,  
1회 추가경정예산 편성(파주문화재단 설립)
- 2024. 7. 파주문화재단 임원추천 위원회 구성 및 회의 개최
- 2024. 8. 파주문화재단 임원 구성 완료,  
2회 추가경정예산 편성(파주문화재단 운영)
- 2024. 9. 파주문화재단 창립총회 개최, 사무실 및 전산시스템 구축 완료
- 2024. 10. 파주문화재단 직원채용, 비영리법인 설립 허가 및 등기 완료,  
파주문화재단 설립 완료
- 2024. 11. 파주문화재단 출범식 개최

## 비영리법인 설립허가증

제2024-01-69호

문화의 중심  
기회의 광장

**비영리법인 설립허가증**

- 법인명칭: 재단법인 파주문화재단
- 소재지: 경기도 파주시 시민회관길 33, 바동 3층(금촌동)
- 대표자
  - 성명: 김영준
  - 생년월일: 1965년 9월 20일
  - 주소: 경기도 파주시 송화로 13, 104동 301호(아동동, 팜스프링아파트)
- 사업내용
  - 문화예술 창작·보급·활동의 지원 및 전문인력 양성
  - 문화예술·관광 진흥을 위한 정책개발 지원 및 사업추진
  - 지역문화예술단체 및 예술인 지원
  - 생활문화 활성화 관련 사업
  - 지역문화 협력 및 연계·교류에 관한 업무
  - 축제·공연·행사 사업 기획 및 운영
  - 문화예술 시설의 관리 운영
  - 문화예술 진흥을 위하여 파주시장이 위탁하는 사업
  - 그 밖의 재단 목적 달성에 필요한 사업
- 허가 조건: 뒷면 기재 및 허가공문 참조

「민법」 제32조 및 「문화체육관광부 및 국가유산청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제4조에 따라 위와 같이 법인 설립을 허가합니다.

2024년 10월 7일

경기도지사인

## 파주문화재단 출범식



○ 해당없음

공약사항  
정책실명제

주관부서

문화예술과

과  
팀  
주  
무장  
장  
관유  
초  
윤  
은  
홍  
미  
진☎ 940 - 4350  
☎ 940 - 4358  
☎ 940 - 4352

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <b>계속</b>	국가·도 <b>파주</b> 기타	<b>임기내</b> 임기후	<b>예산</b> 비예산	<b>불요</b> 제도 재정 권한	검토 추진 <b>완료</b> 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 노후화된 교하중앙공원을 리모델링하고 광장, 휴게 시설, 주차장 등의 휴양 및 편의시설을 보강하여 시민들에게 힐링과 소통의 장을 제공</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> <div>달성목표</div> <div>공사준공</div> </div>

1

사업개요

- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2024. 7.
- 사업위치 : 동패동 1692번지 교하중앙공원(83,126㎡)
- 사업량
- 시설정비 : 한국정원, 물소리원(이탈리아정원), 진입광장, 꽃산책길, 주차장 확충(34면→59면), 야간조명 개선

- 시설변경 : 다목적광장, 시니어놀이터, 잔디언덕, 잔디광장 등

- 신 설 : 어린이숲놀이터, 숲속쉼터, 맨발걷기 산책로
- 사업비 : 6,477백만원(시비 100%)

(단위: 천원)

구분	용역비	공사비	위탁수수료	기술지도계약	부대비	계
금액	461,000	5,500,000	495,000	6,800	15,000	6,477,800

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	실시계획인가 고시	공사착공	공사준공	-	-	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	6,477	461	1,012	4,994	10	-	-
시 비	6,477	461	1,012	4,994	10	-	-



## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
6,477	6,477	6,477	1,473	4,994	10	-	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
6,477	-	-	6,477	-	6,477	1,473	4,994	10	-	-

## 추진현황 및 계획

- 2020. 11. 30. 교하중앙공원 시설개선 타당성조사 용역 완료
- 2021. 11. 12. 교하중앙공원 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 1. 17. ~ 24. 주민의견 수렴(비대면 설문조사)<sup>※970명</sup>
- 2022. 5. 13. 공원조성계획(변경) 결정 고시
- 2022. 10. 31. 시설개선공사 위·수탁 협약(과주시-과주도시관광공사)
- 2022. 12. 28. 실시계획인가 고시
- 2023. 2. 24. 경기도 계약심사 완료 및 사업비 전도
- 2023. 5. 31. 착공식 개최
- 2024. 3. 14. 맨발걷기 산책로 구간 확정 및 추진
- 2024. 7. 2. 공사 준공

## 관련자료



기존 교하중앙공원



## 개선후 교하중앙공원

## 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시관리과	과 장 주 문 과	임 상 범 박 준 미 주	☎ 940 - 8700
					☎ 940 - 8708
					☎ 940 - 8703

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>사업완료</div> </div> </div> <div> <div> <div>▶</div> <div>도심 속 산림휴양공간인 등산로에 조성된 각종 편의시설 및 안전시설 유지·관리로 안전하고 쾌적한 산림문화서비스 제공</div> </div> </div>	

1

사업개요

- 대 상 지 : 월릉산 정상 철쭉동산 및 월릉시민공원 일원
- 사 업 비 : 350백만원(시비 100%)
- 사업기간 : 2024. 5. ~ 2024. 11.
- 사업내용 : 월릉산 숲공원 정비
  - 월릉산 정상부 : 철쭉 7천주 보식
  - 월릉시민공원 : 맨발걷기 산책로 조성 1개소, 노후시설 정비(코르크·경화토 포장 등)

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	조사 및 계획수립	사전절차 이행	시설 정비 및 확충	-	-	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	350	-	-	-	350	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	350	-	-	-	350	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-

## 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
300	350	350	-	-	350	-	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
350	-	-	350	-	350	-	-	350	-	-

## 5 추진현황 및 계획

- 2024. 1. 사업계획 재수립(정상부 파주월룡산성지 정비)  
※ 2018년, 2022년, 2023년 총 3회 문화재 심의 협의 진행
- 2024. 3. 월룡면 주민자치센터·주민 동반 현장조사 등 확인
- 2024. 3. 사업비 산출 및 재정지반 수반사항 사전협의 제출
- 2024. 5. 2024년 제1회 추가경정예산 확정
- 2024. 6. ~ 8. 월룡산 숲공원 정비 실시설계 용역 추진
- 2024. 10. ~ 11. 사업착수 및 조성 완료

### 사업계획 재수립 내용

(위 치) 월룡산 정상 → 월룡시민공원 및 정상부(철쭉동산)  
(사업내용) 전망대의자 등 휴게시설 설치 및 안전시설 보강 → 맨발걷기 산책로 조성 및 시설정비, 철쭉 보식  
(사업비) 300백만원 → 350백만원

## 6 관련자료



월룡산 정상



철쭉 보식완료



월룡시민공원



사업완료

## 7 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	산림정원과	과	장	김 수 태	☎ 940 - 4610
			팀	장	최 현 회	☎ 940 - 4618
			주	무	관	조 혜 진



### 3 연도별 투자계획

#### ① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당(버스킹존) 조성

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
계	600							600
국비								
도비								
시비	600							600
민자								

#### ② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,000		479	2,500	21		
국비	2,400		383	2,000	17		
도비							
시비	600		96	500	4		
민자							

### 4 재정 집행실적

#### ① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당(버스킹존) 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
3,000	600	600						600

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
-					-					

#### ② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
3,000	3,000	3,000	479	2,500	21			

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,000	2,400		600		1,961	293	1,668			



## 5 추진현황 및 계획

### ① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당(버스킹존) 조성

- 2023. 3. 사업위치 확정 등 공영개발과 협의 완료
- 2023. 4. ~ 12. 공원조성계획 결정(변경)용역
  - ▶ 공영개발과: 캠프하우스 근린공원 조성사업 도시관리계획 및 \*공원조성계획 결정(변경)용역 추진 (공연장 조성 예정지: \*당초중앙분수대▶ 변경야외공연장)
- 2024. 5. 유희공간 문화재생 사업(2차) 공모신청(미선정)
- 2025. 관련 공모사업 발굴

### ② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

- 2021. 8. 지방재정 투자심사 완료(야구장)
- 2021. 10. 공유재산관리계획 승인(야구장)
- 2022. 4. 공사 착공
- 2023. 12. 공사 중지(문화재 현상변경)
- 2024. 6. 문화재 현상변경 심의 완료 및 재착공
- 2024. 12. 공사 준공
- 2025. 3. 준공식 개최

## 6 관련자료

### ① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당 조성



(수원) 일월공원 야외공연장




(밀양) 당말리공원 야외공연장

### ② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립



위치도

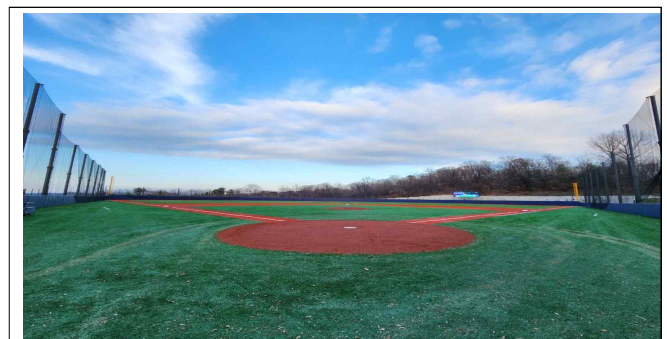

현장사진

## 7 문제점 및 대책

### ① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당 조성

- 최근 버스킹 등 공연문화 활성화로 소규모 공연장 조성 필요성이 커짐에 따라 ‘경기도 유희공간문화재생 공모사업’ 과 연계하여 버스킹존(약 1,582㎡)을 조성 할 예정이었으나 공연장 접근성 및 시설 적합성 불충분으로 미선정
- 관련 공모사업 지속 발굴 및 신청 예정

### ② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

- 의견 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	①문화예술과	과	장	유	초	자	☎ 940 - 4350 ☎ 940 - 4358 ☎ 940 - 4355
			팀	관	윤	은	주	
			주	무	이	지	연	
		②체육과	과	장	이	창	우	☎ 940 - 4830 ☎ 940 - 5238 ☎ 940 - 5231
			팀	관	이	길	호	
			주	무	박	준	호	



## 국제규격 인공암벽장 건립

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

### 사업목표

- ▶ 국제규격 인공암벽장 건립을 통하여 국제대회 개최 및 클라이밍 운동 저변확대

### 공약달성목표

달성연도	달성목표
2024	착공

## 1 사업개요

- 위치 : 파주시 금릉동 186-5번지(파주스타디움)
- 사업량 : 국제규격 인공암벽장 조성
- 사업비 : 35억원(국비 10.5 / 시비 24.5)※ 토지비 제외
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.

## 2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 1.	임기후
목표		계획수립	설계/착공		준공	

## 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,500			3,500			
국비	1,050			1,050			
도비							
시비	2,450			2,450			
민자							

#### 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026		
3,500	3,500	3,500		3,500					

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,500	1,050		2,450		3,267		61	61	3,145	

#### 5 추진현황 및 계획

- 2022. 11. 국제규격 인공암벽장 건립 방안 수립
- 2023. 1. 확정 예산 통지(국비 10.5)
- 2023. 8. 지방재정 투자사업 심사 완료
- 2023. 9. 예산편성(3차 추경 편성 / 국 10.5 / 시 24.5)
- 2023. 10. 실시설계용역 착수
- 2024. 11. 실시설계용역 완료
- 2024. 12. 공사 착공
- 2026. 1. 공사 준공
- 2026. 2. 개장식 개최 예정

#### 6 관련자료



위치도



현장사진

#### 7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	체육과	과	장	이	창	우	☎ 940 - 4830
			팀	장	이	길	☎ 940 - 5238	
			주	무	관	김	형	빈



## 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
7,000	3,234	894		300	330	64	200	2,340

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
894	184	90	620		694		300	330	64	

## 5 추진현황 및 계획

- 2021. 3. 스마트관광도시 공모사업 신청(미선정)
- 2022. 7. 임진각 ICT·VR활용 가상동화체험관 설치 및 운영(완료)
- 2022. 12. 스마트관광도시 조성 공모 TF팀 구성(관광과, 정보통신과)
- 2023. 1. 2023 스마트관광도시 공모사업 신청(미선정)
- 2023. 5. (공약이행) 거북선 디지털 실감콘텐츠 조성완료(문화예술과)
  - ▶한반도 생태평화 종합관광센터 편익동 1층 / 사업비 3억원
- 2023. 12. (공약이행) 지역관광개발사업 컨설팅 완료
  - ▶한반도 생태평화 종합관광센터 구조개선(안) 도출
- 2024. 6. (공약이행) DMZ평화관광 온라인 예약시스템 1차 운영개시
  - ▶DMZ평화관광 온라인 예약시스템 구축 / 사업비 2.3억원
- 2024. 7. (공약이행) 2024 관광안내소 신설 및 개보수 지원사업 착수
  - ▶종합관광센터 휴게공간 조성공사 / 사업비 1억원
- 2024. 8. (공약이행) 관광안내소 신설 및 개보수 사업완료
- 2025. 7. 관광안내소 공간개선 사업완료
- 2025. 12. 무장애 차량 보관소 설치 완료

## 6 관련자료



공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과장	한윤자	☎ 940 - 4360
			팀장	김길모	☎ 940 - 4727
			주무관	이철	☎ 940 - 4726

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <b>계속</b>	국가·도	<b>파주</b>	기타	<b>임기내</b>	임기후	<b>예산</b>	비예산	불요	제도	<b>재정</b>	권한	검토	추진	<b>완료</b>	불가

사업목표	공약달성목표
<b>【 수변관광지 개발 추진 】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 천혜의 자연환경인 수변자원을 활용하여 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여</li> </ul>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div> <b>애룡호수 힐링명소 조성 착공</b> </div> </div>

1

사업개요

- 애룡호수 힐링명소 조성사업
- 위 치 : 법원읍 삼방리 500번지(애룡호수 일원)
  - 사업기간 : 2022년~2026년(5년)
  - 총사업비 : 5,540백만원
  - 사업내용 : (1단계) 데크로드 / (2단계) 주차장, 산책로, 보도교

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	실시계획 용역 착공	실시설계 완료	<b>데크로드 공사 착공 (1단계)</b>	데크로드 공사 준공 (1단계)	주차장, 산책로 등 조성 (2단계)	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	5,540		500	710	2,230	2,100	
국비	4,000			568	1,784	1,648	
도비							
시비	1,540		500	142	446	452	
민자							

#### 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
5,500	5,540	5,540	500	710	2,230	2,100	-	-


3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
5,540	4,000	-	1,540	-	5,482	269	122	2,986	2,105	-

#### 5 추진현황 및 계획

- 2022. 3. 애룡호수 힐링명소 조성 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 4. 25. 행안부 공모사업 (특수상황지역 개발사업) 신청
- 2022. 5. 30. 착수보고
- 2022. 12. 28. 시의회보고
- 2023. 5. 파주 도시관리계획 (도시계획시설 : 수변공원) 입안신청
- 2023. 6.~9. 관계기관 협의
- 2023. 9. 5. 시의회 의견청취
- 2023. 10. 4. 파주 도시관리계획(수변공원) 농지분야 협의 반려
- 2023. 11. 사업 추진방향 수정
  - 당 초: 전체 사업부지 ⇒ 도시관리계획(수변공원) 시설 결정
  - 변 경: 산책로, 광장 ⇒ 농어촌공사 목적외 사용승인
- 주차장 ⇒ 도시관리계획(주차장) 시설 결정
- 2024. 2. 6. 위·수탁협약 체결(파주시 ↔ 한국농어촌공사 파주시사)
- 2024. 2. 16. 공공디자인 자문요청
- 2024. 2. 27. 관계기관 사전협의요청(道 하천과,市 친수하천과)
- 2024. 3. 25. 파주 도시관리계획(주차장)결정 신청
- 2024. 4. 24. 도시관리계획 결정(변경)열람 공고
- 2024. 5. 23. 소규모 환경영향평가서 제출(市→한강유역환경청)



- 2024. 6. 10. 도시관리계획 결정(변경) 협의의견 알림(도시계획과)
- 2024. 6. 12. 경기도 계약심사 요청
- 2024. 6. 25. 위탁사업비 지급
- 2024. 7. 16. 경기도 계약심사 관련 현장방문
- 2024. 7. 23. 경기도 계약심사 결과 알림(道→市)
- 2024. 8. 5. 농업생산기반시설 사용허가 승인 알림 (테크로드 부분)
- 2024. 9. 30. 법원읍 주민설명회
- 2024. 11. 1. 산책로 공사 착공
- 2025. 7. 18. 홍수면부지(농업생산기반시설) 일부 폐지 승인
- 2025. 9. 12. 농업생산기반시설 사용허가(2단계 사업구간)
- 2025. 12. 10. 2단계 공사 착공
- 2025. 12. 20. 1단계 공사 완료

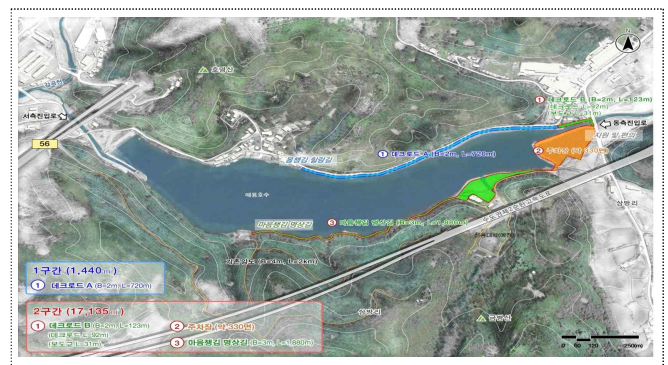

## 7 문제점 및 대책

- 해당없음

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>착공</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>착공</div> </div>

1

사업개요

- 사업명 : 감악산 국립 자연휴양림 조성사업
- 대상지 : 적성면 객현리 산148 외 4필지(총 33ha)
- 사업비 : 86억원(국비 100%)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년)
- 사업내용 : 자연휴양림 조성 1개소(주관 : 산림청)
  - 주요시설 : 숲속의집, 산림휴양관, 야영장, 산책로 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	기본계획· 기본설계	실시설계	착공	토목공사	건축,조경	준공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	8,600	-	500	1,000	1,100	1,000	5,000
국비	8,600	-	500	1,000	1,100	1,000	5,000
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-



## 4

## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
8,600	8,600	8,600	500	1,000	1,100	1,000	5,000	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
8,600	8,600	-	-	-	2,911	-	1,057	969	885	-

## 5

## 추진현황 및 계획


- 2019. 5. 자연휴양림 신규조성 요청 파주시 → 산림청
- 2022. 1. 자연휴양림 지정·고시 완료
- 2022. 4. 자연휴양림 최종 대상지 선정
- 2022. 5. 기본계획 및 기본설계 수립 용역
- 2023. 12. 실시설계용역 완료 산림청
- 2024. 7. 객현리사격장 폐쇄 및 비전술훈련장 전환 확정 국방부
- 2024. 9. 토목공사 착공 파주시산림조합
- 2024. 12. 감악산자연휴양림 진입도로 개설공사 노선 및 단지내도로 연결을 위한 용역 변경 추진 도로건설과
- 2025. 12. 자연휴양림 건축, 전기 계약 완료
- ~ 2027. 국립 감악산자연휴양림 조성 완료 및 개장

## 6

## 관련자료



위치도

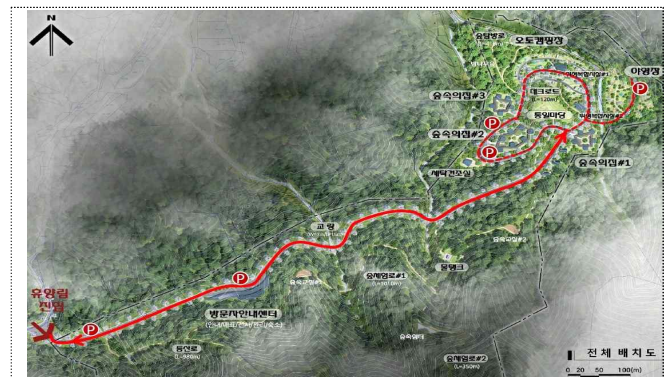

조성계획도

공약사항  
정책실명제

주관부서

산림정원과

과장  
팀장  
주무관김수태  
최현회  
조혜진☎ 940 - 4610  
☎ 940 - 4618  
☎ 940 - 4611

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
▶ 고령사회 북파주지역 노인의 질병 예방과 여가 문화를 one-stop으로 제공하여 건강증진 및 노인 여가 문화 환경 조성		달성연도	달성목표
		2024	공사착공

1사업개요

- 위치 : 파주시 문산읍 개포대로 34
  - 규모 : 대지면적 9,299㎡ / 연면적 4,158.36㎡(지하 1층 ~ 지상 3층)
  - 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(준공 목표)
  - 사업비 : 225.29억원(국비 9.29억원, 도비 12.32억원, 시비 203.68억원)
- ※경기도 특별조정교부금: 10억원

2추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 8.	임기후
목표	행정절차 수행		공사업체 선정 및 공사착공	공사추진	준공	개소

3연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	22,529		1,393	91	8,827	9,510	2,707
국비	929		929				
도비	1,232		232			1,000	
시비	20,368		232	91	8,827	8,510	2,707

## 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
27,903	22,529	22,529	1,393	91	8,827	9,510	2,707	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
22,529	929	1,232	20,368		10,186	-	162	3,999	6,025	-

## 추진현황 및 계획

- 2021. 11. 건축설계 등을 위한 국·도비 및 시비 13.9억원 예산 수립
- 2022. 3. 문산보건지소 및 노인복지관 복합센터 건립 계획 수립
- 2022. 9. 중앙지방재정계획 수립 및 공유재산관리계획 제출
- 2023. 3. 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인
- 2023. 9. ~ 2024. 8. 설계 공모 및 설계 완료
- 2024. 9. 총사업비 변경 보고(206억→225억, ↑19억)
- 2024. 9. 추경예산 편성, 계약심의위원회 심의, 조달청 원가계산 및 계약 요청
- 2024. 11. 문산보건지소 일대 건축물 철거공사 완료
- 2024. 12. 조달청 공사 계약 및 착공
- 2024. 12. 경기도 특별조정교부금 확보(10억원)
- 2025. 3. 건립 공사 착공식
- 2026. 8. 준공
- 2026. 12. 개소(예정)

## 관련자료



조감도

공약사항 정책실명제	주관부서	문산보건센터	과	장	김영미	☎ 940 - 5600
			팀	장	유연	☎ 940 - 5605
			주	무	박원	☎ 940 - 5614

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
<div> <div>【 산후조리 공공지원 사업 확대를 통해 출산 장려 】</div> <div> <div>▶ 산후조리 지원사업 확대로 산후조리 사업의 공공성 강화, 출산 가정의 경제부담 완화</div> </div> </div>		<div>달성연도</div> <div>2024</div>	<div>달성목표</div> <div> <div>산후조리 공공지원사업 확대</div> </div>


1

사업개요

- 기간 : 2025년 1월 ~
- 대상 : 파주시 주민등록을 두고 6개월 이상 거주 중인 출산모
- 내용 : 「산모·신생아 건강관리 지원」사업의 서비스 가격 중 본인 부담금의 90% 지원 (최소 63,000원 ~ 최대 3,838,500원)

※ 소득기준(차상위층, 중위소득 150% 기준) 및 태아형태(단태아, 쌍태아 등), 출산순위별, 인력 수 등에 따라 차등 지원

○ 지원절차



- 소요예산 : 3,430백만원<sup>시비</sup>

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026	임기이후
목표	현황조사	조례제정	사업시행	지원	지원	지원

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,530				933	697	900
국비							
도비							
시비	2,530				933	697	900
민자							

### 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
5,418	2,530	2,530	-	-	933	697	900	지속추진

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,630			1,630		1,300			603	697	

### 5 추진현황 및 실적

#### 1. 추진 현황

- 2023. 7. 25. 보건복지부 협의 완료 산모신생아 건강관리 지원(본인부담금90%)
- 2023. 8. 4. 예산재정과 사전협의 완료
- 2023. 8. 14. 「파주시 산모·신생아 건강관리 지원에 관한 조례」 일부개정 계획 수립
- 2023. 8. 18. 「파주시 산모·신생아 건강관리 지원에 관한 조례」 일부개정조례안 입법예고
- 2023. 11. 1. 「파주시 산모·신생아 건강관리 지원에 관한 조례」 공포
- 2023. 11. 9. 3차 주민배심원회의 공약사항 내용변경 승인
- 2023. 11. 10. 2024년 산모·신생아 건강관리 지원<sup>본인부담금 90% 지원</sup> 계획 수립  
관내 제공기관 간담회 개최
- 2023. 11. 13. 2024년 산모·신생아 건강관리 지원<sup>본인부담금 90% 지원</sup> 언론 홍보
- 2023. 12. 15. 공약이행평가단 평가 및 심의
- 2024. 1. 사업 시행





어린이 장난감도서관 설치

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>▶ 영유아의 놀 권리 보장을 위한 장난감도서관 설치 및 운영으로 다양한 장난감을 접할 수 있는 환경조성 및 가정의 경제적 부담을 경감</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>장난감도서관 설치</div> </div>

1사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024. 9.
- 추정예산 : 93백만원 (시비100%)
- 위치 : 금촌 민·군 복합커뮤니티센터(금촌동 947-28) 內
- 사업량 : 연면적 263㎡ (장난감도서관 108㎡, 아이러브맘카페 155㎡)
- 주요시설 : 장난감도서관, 아이러브맘카페 놀이치료실, 놀이체험실, 상담실 등
- 사업내용 : 영유아의 건강한 놀이에 필요한 자료 및 정보 제공, 다양한 놀이프로그램 개발 수행을 위한 장난감도서관 설치
- 기대효과 : 장난감 대여 서비스를 통한 가정의 경제적 부담 경감 및 육아 인프라 확충으로 부모와 아이 모두 행복한 양육환경 조성

2추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사착공	설치계획수립 재원확보	준공			

3연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	93				93		
시비	93				93		

#### 4 재정 집행실적


(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
300	93	93			93					
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
93			93		93			93		

#### 5 추진현황 및 계획

- 2021. 10. 금촌 민·군 복합커뮤니티센터 내 장난감도서관·아이러브맘카페 설치 협의 완료
- 2022. 5. 실시설계 인테리어 포함 의견 제출 및 반영 공공건축컨설팅추진단(TF)
- 2023. 6. 놀이시설, 수납장 포함 설계변경 요청 및 반영 공공건축과
- 2023. 9. 예산편성 요구(기자재 구입 등)
- 2024. 9. 장난감도서관·아이사랑놀이터 금촌관 개소

#### 6 관련자료

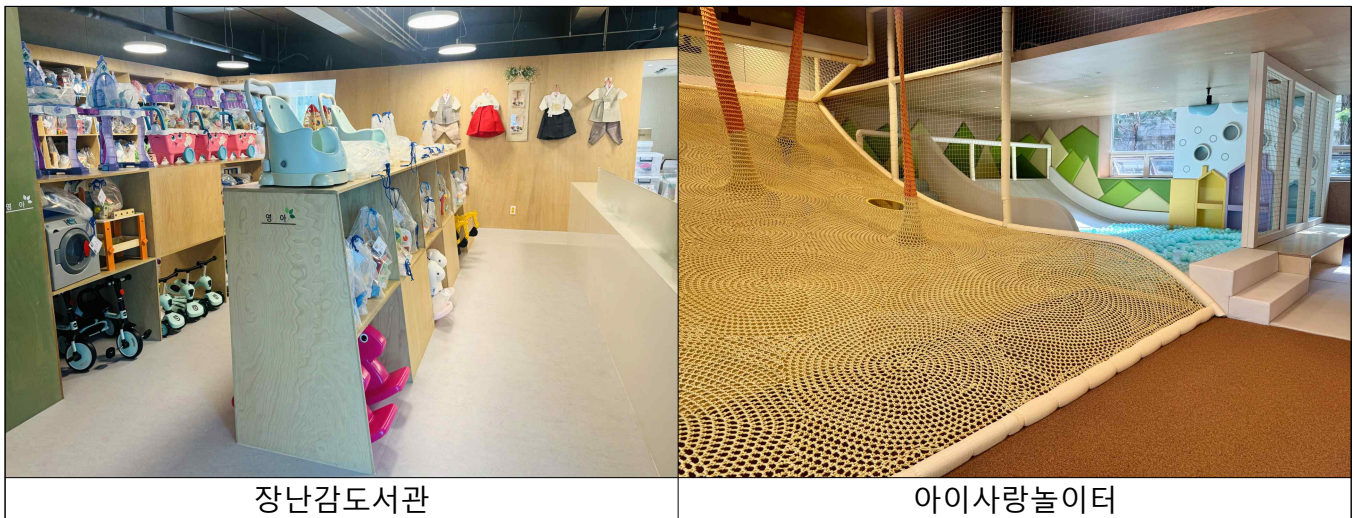

#### 7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	보육아동과	과 팀 주 무	장 장 관	김진아 박연숙 이다은	☎ 940 - 4410 ☎ 940 - 4418 ☎ 940 - 4412



## 안전한 등·하굣길 지원 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

## 사업목표

**【 어린이보호구역내 교통안전시설 확대 설치】**

- ▶ 어린이보호구역 내 바닥형 보행신호등, 무인교통 단속장비 등 교통안전시설 확대 설치를 통해 어린이 교통사고 예방

## 공약달성목표

달성 연도	달성목표
2024	어린이보호구역 바닥형 보행신호등 등 설치

1 사업개요

○ 어린이보호구역 바닥형 보행신호등 설치 사업

- 대 상 : 관내 초등학교 57개교 주변 횡단보도

\*관내 60개 초등학교 중 심학초(시도1호선<sup>공사중</sup>), 등 도로 여건상 어려운 학교, 군내초, 대성동초(민통선) 제외

- 총사업비 : 약 2,711백만원
- 사업내용 : 바닥형 보행신호등 설치

○ 어린이보호구역 무인교통단속장비 설치 사업

- 대 상 : 관내 초등학교 앞 30개교, 유치원 등 앞 15개소
- 총사업비 : 약 1,397백만원
- 사업내용 : 무인교통단속장비 확대 설치

## 2 추진계획

### ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

[단위 : 개소(바닥신호등 / 무인교통단속장비)]

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	4 / 64	36 / 56	6 / 37	11 / 28	3 / 20	-

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	6,059		1,458	2,400	250	1,046	905
국비	1,929		729	1,200			
도비	983				125	655	203
시비	3,147		729	1,200	125	391	702
민자							

### 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
8,100	6,059	6,059	1,458	2,400	250	1,046	905	-

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
6,059	1,929	983	3,147	-	4,158	1,268	1,650	237	1,003	-

### 5 추진현황 및 계획

- 2022. 3. '22년 무인교통단속장비 등 설치사업(국비) 예산 확보
- 2022. 5. '22년 무인교통단속장비 등 설치사업(국비) 예산 추가 확보
- 2022. 9. 바닥형 보행신호등 등 설치사업<sup>(1차)</sup> 추진 완료(2개소)
- 2022. 11. 무인교통단속장비 설치사업 추진 완료(29개소)
- 2023. 2. 2024년 어린이보호구역 개선사업 예산 확보(도비)
- 2023. 6. 바닥형 보행신호등 설치사업<sup>(2차)</sup> 착공(33개소)
- 2023. 1~ 12. 무인교통단속장비 설치사업 추진 완료(37개소)
- 2023. 8. 2024년 어린이보호구역 개선사업 1차 수요조사(도비)
- 2023. 11. 바닥형 보행신호등 설치사업<sup>(2차)</sup> 준공(33개소)
- 2024. 1. 2024년 어린이보호구역 개선사업 신청(도비)
- 2024. 3. 도비 예산 확보
- 2024. 4~ 5. 무인교통단속장비 설치사업 추진 완료(2개소)
- 2024. 7. 바닥형 보행신호등 설치사업<sup>(3차)</sup> 준공(3개소)
- 2025. 1~ 12. 무인교통단속장비 설치사업 추진 완료(28개소)
- 2025. 12. 바닥형 보행신호등 설치사업 준공(11개소)

6

## 관련자료



어린이보호구역 내 바닥형보행신호등

7

## 문제점 및 대책

- 도로여건에 따라 바닥형 보행신호등, 무인교통단속장비 설치가 어려운 현장은 기타 교통안전시설로 보강.

공약사항  
정책실명제

주관부서

교통정책과

과  
팀  
주 무

장  
장 관

우 상 완  
박 명 화  
정 호 영

☎ 940 - 5770  
☎ 940 - 5798  
☎ 940 - 5791

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <b>계속</b>	국가·도 <b>파주</b> 기타	<b>임기내</b> 임기후	<b>예산</b> 비예산	<b>불요</b> 제도 재정 권한	검토 추진 <b>완료</b> 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 농민거점 농산물가공센터의 설립으로 지역 농산물 수급안정과 농산물 가공상품화를 통한 농업인 조직체 소득 증대 및 지역경제 활성화</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>가공센터 착공</div> </div>

1

사업개요

- 사업위치 : 월릉면 영태리 442
- 사업기간 : 2024. ~ 2025.
- 사업규모 : 609㎡(약 184평)
- 사업비 : 3,275백만원
- 사업내용
  - 농산물종합가공센터에서 과수, 채소, 축산물 등을 활용하여 개발하고 있는 제품 중 경쟁력을 갖추거나 발전 가능성이 있는 품목을 집중 육성할 수 있는 농산물가공사업장 구축

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표		국비 사업신청 및 농업인 조직체 구성	농산물가공센터 착공	농산물가공센터 준공	운영지원	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,275	-	-	-	2,850	425	-
국비	1,250				1,250		
도비	387				175	212	
시비	1,638				1,425	213	

## 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
500	3,275	3,275	-	-	2,850	425	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,275	1,250	387	1,638	-	3,147	-	-	700	2,447	

## 5 추진현황 및 계획

- 2023. 1. 2024년 지역농촌지도사업활성화 지원(군특·자율계정) 국비사업 신청  
※사업비 : 2,500백만원(국비 1,250백만원 / 시비 1,250백만원)
- 2023. 3. ~ 5. 로컬푸드 공공조달체계 연계형 농민거점 가공센터 건립계획 수립
- 2023. 12. 중기지방재정계획 및 공유재산관리계획 반영
- 2024. 2. ~ 3. 기본설계, 실시설계, HACCP기준 레이아웃설계 용역 발주
- 2024. 7. HACCP 레이아웃 설계 완료 및 실시설계 진행
- 2024. 8. 계약심사 및 공사업체 선정
- 2024. 10. 농산물종합가공센터 착공(10. 23.)
- 2025. 6. 농산물종합가공센터 준공(6. 25.)
- 2025. 7. ~ 11. 농산물 가공장비 설치
- 2025. 12. 농산물종합가공센터 완공(12. 12.)

## 6 관련자료



농산물종합가공센터 외부



농산물종합가공센터 내부

## 7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시농업과	과	장	송 호 철	☎ 940 - 4810
			팀	장	양 소 정	☎ 940 - 5208
			주	무	박 혜 림	☎ 940 - 5201

## 원스톱 맞춤 행정서비스 체계 구축

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

## 사업목표

### 【민원콜센터 설치 및 운영】

- ▶ 시민과 소통 공감하는 고품질 민원서비스 제공

## 공약달성목표

달성 연도	달성목표
2024	콜센터 설치 및 운영

## 1 사업개요

- 목 적 : 다양한 전화민원의 효율적 대응 및 One-call, One-stop 서비스를 위한 상담채널 (콜센터) 구축

1단계	2단계	3단계
<b>기반 구축</b> ① 설계 용역 및 공간구축 ③ 운영근거 <sup>(조례)</sup> 제정	<b>콜센터 (단계적) 운영</b> ① 시범운영(표준상담DB중심) ② 상담분야 단계별 확대	<b>콜센터 안정화 (고도화)</b> ① 양방향 콜센터 운영확장

- 사업내용
- 구축기간 : 2023. 1. ~ 12. (2023. 11. 29. 시스템 구축 완료)
    - 정보시스템 구축, 상담프로그램 및 업무시스템 연계 서비스 구축
    - 상담실, 교육실, 회의실, 휴게실 등 인테리어 공사
  - 민원콜센터 운영 : 2023. 12. 7. ~
    - 상담원 운영규모 : 상담인력 14명 (관리자 2, 상담원 12)



- 위 치 : 파주시 시청로 36, 제2별관 2층
- 상담인력 : 14명 (관리자 2, 상담원 12)<sup>2026.1.현재</sup>
- 상담시간 : (평일) 09:00 ~ 19:00
- 대표전화 ☎ 031-940-4114

## 2 추진계획

- ## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	세부계획 수립	운영기반 마련	콜센터 운영			

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,920		22	1,330	748	905	915
국비							
도비							
시비	3,920		22	1,330	748	905	915
민자							

### 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
4,200	3,920	3,920	22	1,330	748	905	915	925

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,920			3,920		3,061	21	1,434	706	900	-

### 5 추진현황

- 2022. 7. ~ 9. 민원콜센터 정보화 전략계획 용역 완료
  - ▶ 파주시 민원콜센터 공간 및 인력규모 등 설계
- 2022. 10. 민원콜센터 구축 공간확정 및 세부계획 수립
- 2023. 2. 「파주시 민원콜센터 설치 및 운영에 관한 조례」 제정
- 2023. 3. ~ 4. 민원콜센터 시스템 구축을 위한 절차 이행
- 2022. 6 ~ 12. 민원콜센터 시스템 구축 사업 추진
- 2023. 4. ~ 9. 부서별, 업무별 표준상담 DB 구축 (855건)
- 2023. 1. ~ 5. 상담원 운영방안 검토 및 확정 → 민간위탁
- 2023. 5. ~ 10. 상담원 민간위탁 운영을 위한 사전절차 이행
  - 2023. 5. 25. 민원콜센터 상담원 민간위탁 운영 심의 (적정)
  - 2023. 9. 18. (제241회 임시회)민원콜센터 운영 민간위탁 의회 동의안 통과
  - 2023. 10. 13. 민간위탁 적격자심사위원회 (위탁사업자 (주)Ktis 선정)
- 2023. 11. ~ 12. 위탁사업자 상담원 구성 완료 및 기본업무교육 시행
- 2023. 11. 민원콜센터 시스템 구축
- 2023. 12. 7. 콜센터 시범 운영<sup>(단계별 운영)</sup> (2023. 12. 18. 개소)
- 2024. 1. ~ 민원콜센터 정식 운영 (상담 범위 단계적 확대)



## 파주시 민원콜센터 구축완료...시범운영 돌입

에너지경제신문 | 입력 2023.12.06 02:28



▲파주시 4일 민원콜센터 구축사업 완료보고회 개최. 사진제공=파주시

## 시민과 행정 연결...‘파주시 민원콜센터’ 정식 운영

| 지난 18일 개소식 개최

입력 : 2023-12-19 10:58



경기 파주시는 민원, 교통, 문화, 복지 등 시정에 대한 문의 및 민원 채널을 하나의 창구로 일원화한 ‘파주시 민원콜센터’의 운영을 시작했다고 19일 밝혔다.

지난 18일 열린 민원콜센터 개소식에는 김진기 파주시 부시장과 이성철 파주시의장, 시의원, 기관단체 대표와 상담실 관계자 등 40여명이 참석해 현판제막, 상담사와 소통의 시간을 가졌다.

시는 민원콜센터 운영을 위해 지난 11월까지 시스템 구축과 상담원 운영에 대한 준비를 마쳤고 지난 7일부터 시범운영을 시작했다. 시범운영 결과 등을 바탕으로 영상상담, 챗봇 상담 서비스, 1대 1 문자상담 등 상담 범위와 운영 경로를 단계적으로 확대·적용할 예정이다.

시민 누구나 파주시 민원콜센터를 이용하면 단순 민원 문의는 상담사가 직접 안내하고 담당 부서 상담이 필요한 경우, 상담사가 담당 부서를 확인하여 연결하고 있으며 상담과 동시에 필요한 정보를 문자로 받아 볼 수 있다. 민원콜센터에는 총 15명의 상담사가 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 근무한다.

김진기 부시장은 “상담사들이 소통의 최일선에서 자부심을 갖고 임해주기를 바라며, 파주시 민원콜센터가 시민과 행정을 연결하는 ‘더 편하고’ 더 가까운 행정의 결실로 이어지길 기대한다”라고 말했다.

공약사항  
정책실명제

주관부서

민원여권과

과장  
팀장  
주무관

서병권  
김경희  
유수연

☎ 940 - 4180  
☎ 940 - 4188  
☎ 940 - 4173



## 운정3동 행정복지센터 조기 착공 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

## 사업목표

- ▶ 행정구역 개편 및 운정3동 인구증가에 따른 행정. 민원편의를 위해 별도 행정복지센터 건립이 시급해 운정3동 행복센터 조기 착공

## 공약달성목표

달성 연도	달성목표
2024	공사 착공

## 1 사업개요

- 사업위치 : 야당동 1022번지-7번지 외 1필지 / 4,300㎡
- 시설규모 : 연면적 4,423.54㎡(1,300평) / 지하1층 ~ 지상4층
- 주요시설 : 행정복지센터, 주민자치센터, 청소년 휴카페
- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2026. 3.
- 예 산 : 180억원(시비 172, 특조비 8)
  - 공사비 160억원 / 설계·감리비 20억원

## 2 추진계획

- ## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 3.	임기후
목표	도시관리계획 등 변경 및 설계공모	설계 완료	착공	시공	준공	-

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	18,000	335		625	11,790	5,250	
국비							
도비							
시비	17,200	335		625	11,790	4,450	
민자							
특조비	800					800	

## 4

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
17,800	18,000	18,000	187	689	4,240	9,459	3,425	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	특조비	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
18,000	-	-	17,200	800	14,575	187	689	4,240	9,459	-

5

- 2020. 10. 운정3동 청사분리 계획수립 (자치행정과)
- 2021. 2. 지방재정 투자심사 완료 (경기도)
- 2021. 11. 행정복지센터 건립계획 변경(위치변경, 사업비 증액)
- 2022. 7. 공공건축 사업계획 사전검토 완료 (경기도 공공건설지원센터)
- 2023. 1. 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 4. 설계용역 중간보고 및 주민설명회
- 2023. 8. 건축인허가 접수
- 2023. 12. 기본 및 실시설계 완료
- 2024. 5. 공사 착공
- 2026. 3. 공사 준공 및 개청

## 6



.....  
 위치도



조감도

7

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과	장	배	성	진	☎ 940 - 5270
			팀	장	김	윤	☎ 940 - 5757	
			주	문	과	화	인	☎ 940 - 5754

금촌 민·군 복합커뮤니티센터  
조기 건립

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행 단계					
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

## 사업목표

▶ 금촌 민.군 복합커뮤니티센터 준공(24년)

## 공약달성목표

달성 연도	달성목표
2024	공사 준공

## 1 사업개요

- 사업위치 : 금촌동 947-28번지(3,842㎡ / 1,162평)
- 시설규모 : 연면적 5,658㎡(1,711평), 지하2층/지상4층, 주차50대
  - 기존건물 리모델링 및 수직·수평 증축
- 주요시설 : 청년창업 및 골목상권 컨설팅센터, 청년키움스토어, 청소년네트워크센터, 맘카페·장난감도서관, 도시재생지원센터, 사회적경제·마을공동체 지원센터, 여성커뮤니티센터 등
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 286억원(국비 94 / 도비 3 / 시비 189)
  - 총사업비 : 토지비 112억원, 공사비 149억원, 설계비·감리비 23억원, 기타 2억

## 2 추진계획

- ### ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사착공	공사진행	공사준공			

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	28,681	14,105	4,325	9,651	600		
국비	9,420	1,600	3,180	4,640			
도비	284		168	116			
시비	18,977	12,505	977	4,895	600		
민자							

#### 4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
30,300	28,681	28,681	18,430	9,651	600					
3) 확보금액				4)집행금액						
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
28,681	9,420	284	18,977		14,576	4,325	9,651	600		

#### 5 추진현황 및 계획

- 2020. 5. 지방재정 투자심사(자체) 심의(적정)
- 2020. 6. 舊 등기소·법원 부지매입
- 2020. 8. 특수상황지역개발사업 신규사업 선정(행안부)
- 2021. 3. 지방재정 투자심사(중앙) 심의(조건부)
- 2022. 6. 기본 및 실시설계완료, 계약심사(경기도)
- 2022. 7. ~ 8. 계약심사 및 공사입찰 등
- 2022. 10. 공사 착공
- 2024. 6. 공사 준공 및 시운전

#### 6 관련자료



보도자료



준공사진

#### 7 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과	장	배 성 진	☎ 940 - 5270
			팀	장	이 준 희	☎ 940 - 5278
			주 문	관	신 동 하	☎ 940 - 5274
