

포용사회 문화도시

-관광은 파주다-

관리번호	공 약 명	담당부서
[6 - 1]	DMZ평화관광 콘텐츠화 지속 지원	 관 광 과
[6 - 2]	마장호수 관광인프라 확충 및 무장애 관광시설 설치	 관 광 과
[6 - 3]	반려동물행복누리 조성	 동 물 관 리 과
[6 - 4]	통일동산 관광특구 활성화	 관 광 과
[6 - 5]	임진각 일대 한반도 스마트관광 거점화 지속 지원	 관 광 과
[6 - 6]	리비교~장파리 관광 활성화 추진	 관 광 과 균 형 개 발 과
[6 - 7]	수변관광지 개발 추진	 균 형 개 발 과
[6 - 8]	체류형 관광지 조성	 관 광 과 산 림 정 원 과
[6 - 9]	감악산 국립 자연휴양림 조기 조성	 산 림 정 원 과
[6 - 10]	운정 호수공원 불꽃 축제 브랜드화 추진	 문 화 예 술 과
[6 - 11]	DMZ 기억의 전당 건립 추진	 문 화 예 술 과
[6 - 12]	문산 자유시장 지역관광연계 및 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원	 민 생 경 제 과 관 광 과

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표				
【 DMZ평화관광 운영확대 】 ▶ 세계적인 안보관광 콘텐츠로 자리매김한 DMZ평화 관광의 운영 정상화 및 신규 관광코스 개발을 통해 파주시 관광산업 활성화 도모	<table> <tr> <th>달성 연도</th><th>달성목표</th></tr> <tr> <td>2023</td><td>운영 콘텐츠 확대</td></tr> </table>	달성 연도	달성목표	2023	운영 콘텐츠 확대
달성 연도	달성목표				
2023	운영 콘텐츠 확대				

1

사업개요

- 위 치 : 군내면 점원리 1082-1 일원
- 사 업 량 : DMZ평화관광 운영 및 콘텐츠 확대

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	정상운영	역사·평화	체험·생태	시설·운영 개선	시설·운영 개선	시설·운영 개선

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	11,120		1,987	1,397	2,016	3,076	2,644
국 비	500					500	
도 비							
시 비	10,620		1,987	1,397	2,016	2,576	2,644
민 자							

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
7,854	11,120	11,120	1,987	1,397	2,016	3,076	2,644	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
11,120	500		10,620		7,186	1,455	1,275	1,954	2,502	

5

추진현황 및 계획

- 2019. 10. 2. ASF 및 코로나19로 인해 운영 중단
- 2022. 5. 4. 시범운영 재개(평일 6회, 주말 12회)
- 2022. 6. 21. 단체관광 재개(1일 5회)
- 2022. 8. 16. 개인관광 정상화(평일 10회, 주말 14회)
- 2023. 1. 4. 단체관광 1차 확대(1일 10회)
- 2023. 4. 12. 市-軍 출입제한 단계적 정상화 합의 도출
- 2023. 4. 18. 단체관광 2차확대(1일 30회)
- 2023. 6. 3. 도라산역 연계 DMZ 평화관광 시범운영
※ 道 평화협력과, 파주시, 1사단, 파주도시관광공사, 코레일 협업
- 2023. 7. 1. 출입인원 정상화(1일 3,000명) 달성(개인 15대, 단체 50대)
- 2023. 7. 18. 문산자유시장 연계 DMZ 평화관광 재개
- 2023. 8. 31. 캠프그리브스 연계 DMZ 평화관광 시범운영(평화 D코스)
- 2024. 8. 9. 도라산역 셔틀열차 재개에 따른 DMZ 연계 관광 재개
※ 경기도, 파주시, 1사단, 코레일, 파주도시관광공사
- 2024. 8.~ 신규 조성 관광지 및 DMZ 내 미운영 관광자원 코스화 개발 추진
※ 한반도생태평화종합관광센터, 리비교 역사문화공원, 남북출입사무소 역사관, 덕진산성, 허준묘, 평화농장, 해마루촌 등
- 2025. 5.~ 문체부 열린관광지 조성 사업 대상지 선정(국비 5억원 확보), 제3땅굴 모노레일 교체, 도라전망대 전기 관람차 도입 추진중

○ 연도별 운영실적

(단위: 명)

총 계	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2002 ~ 2016
10,584,663	530,223	442,110	377,367	125,597	17,895	8,248	578,828	622,294	483,453	7,398,648

※ 2024년 11월 누적 관광객 1천만명 달성

○ 운영코스 정상화

구분	코 스	운 영 구 간	비고
현행	A코스	임진각▶제3땅굴▶도라전망대▶통일촌	운영
현행	B코스 (코레일 연계)	임진강역▶도라산역▶도라전망대▶통일촌 ▶제3땅굴▶도라산역▶임진강역	'24. 8. ~ 운영
현행	C코스	문산자유시장▶임진각▶제3땅굴 ▶도라전망대▶통일촌▶임진각	운영

○ 운영콘텐츠 확대 ※ DMZ 평화관광 1일 3천명 제한으로 여건에 맞는 다양한 프로그램 운영 확대

평화 · 역사 · 체험

구분	코 스	운 영 구 간	비고
평화	D코스	임진각▶캠프그리브스▶제3땅굴▶도라전망대▶임진각	시범운영 완료
역사	E코스	리비교역사문화공원▶허준묘▶덕진산성▶리비교역사문화공원	향후 수요 및 여건에 따른 운영 추진
	F코스	리비교역사문화공원▶허준묘▶황포돛배▶리비교역사문화공원	
체험	G코스	임진각▶한반도생태평화종합센터▶평화농장▶임진각	

체험 · 생태

구분	코 스	운 영 구 간	비고
체험	H코스	임진각▶한반도생태평화종합센터▶해마루촌▶임진각	향후 수요 및 여건에 따른 운영 추진
생태	I코스	임진각▶한반도생태평화종합센터▶평화공원▶임진각	

○ DMZ 평화관광 온라인 예약시스템 구축

- 현장매표의 한계를 개선하고 매표편의 증진을 위해 언제 어디서나 사전 예약이 가능한 온라인 예약시스템 구축(2024년)


○ 도라산역 셔틀열차 연계관광 확대

- 1일 참여인원 100명 ⇒ 200명으로 확대(2025년)

○ 문체부 열린관광지 조성 사업 대상지 선정(국비 5억원 확보)

- 제3땅굴 노후로 고장 잦은 모노레일 교체 추진(2026년 예정)
- 도라전망대 교통약자를 위한 전기 관람차 도입 추진(2026년 예정)

6

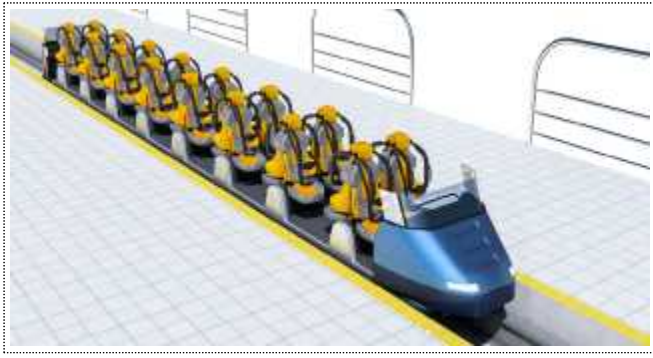

제3땅굴 모노레일 교체(예상도)



도라전망대 전기 관람차 도입

7

- DMZ 평화관광 출입인원 정상화에 따른 관광객 과밀집 방지를 위해 안전한 통제 시스템 확보
 - ➡ 도라전망대 진입 경사로 안전 가드레일 설치('23. 10. 추진완료)
- 제3땅굴 모노레일 노후화로 인한 잦은 운행 중단 관련 근본적 해결 위해 모노레일 신규 제작 및 교체
 - ➡ 문체부 열린관광지 조성 사업 대상지 선정(국비 5억원 확보), 모노레일 신규 제작 및 교체('26년 예정)
- 도라전망대 주차장~전망대 건물 사이 경사가 급해 교통약자 이동 어려움
 - ➡ 주차장~전망대 구간 교통약자 대상 전기 관람차 운행 추진('26년 예정)

공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과 팀 주 무	장 장 관	한 이 이	윤 국 정	자 희 민	☎ 940 - 4360
								☎ 940 - 8348
								☎ 940 - 8343

6-2

포용사회 문화도시

관광과

마장호수 관광인프라 확충 및
무장애 관광시설 설치

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표		공약달성목표	
마장호수 이용자의 편의 제공을 위해 주차장 확충, 교통약자를 위한 무장애 시설 및 보행로 확보 안전성 확보를 위한 출렁다리 주변 데크광장 확장을 통한 관광인프라 확충		달성연도	달성목표
		2023	관광인프라 확충 및 무장애 관광시설 설치

1

사업개요

- 위 치 : 광탄면 기산리 산 150-18 일원
- 사업량 : 관광인프라 확충(주차장 확장), 무장애 관광시설 설치 (보행데크 연장)
- 사업비 : 6,582백만원

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	주차장 확충	편의개선	편의개선	편의개선	편의개선	시설유지

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	6,582	75	2,990	1,393	720	1,000	404
국비							
도비	656.5			656.5			
시비	5,925.5	75	2,990	736.5	720	1,000	404
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	
6,582	6,582	6,582	75	2,990	1,393	720	1,000	404	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
6,178		656.5	5521.5		5,178	3,065	1,393	720	1,000	

5 추진현황 및 계획

○ 마장호수 제3주차장 조성

- 2022. 5. 마장근린공원 공원조성계획 결정(변경) 고시
- 2022. 7. 실시계획인가 신청
- 2022. 12. 공사착공
- 2023. 12. 공사준공

○ 마장호수 무장애 관광시설 설치(주차장 보행테크)

- 2022. 8. 마장호수 무장애 대행사업 제2회 추경 신청 (파주도시관광공사→파주시)
- 2022. 11. 마장호수 무장애 관광시설 확충사업 위·수탁 협약 체결
- 2023. 3. 공사착공
- 2023. 8. 공사준공

○ 마장호수 출렁다리 환경개선(데크광장, 쉼터 및 경사로)

- 2022. 4. ~ 9. 경기도 건의(3회)
- 2022. 10. 도비 보조금 가내시
- 2023. 2. 도비 보조금 교부²⁰²³ 문화관광자원 개발
- 2023. 2. 실시설계 완료
- 2023. 3. 공사 착공
- 2023. 12. 공사 준공


○ 마장호수 출렁다리 공간환경 개선(보행로)

- 2022. 4. ~ 9. 경기도 건의(3회)
- 2022. 10. 도비 보조금 가내시
- 2023. 2. 도비 보조금 교부²⁰²³ 무장애관광 환경 조성
- 2023. 11. 공사 착공
- 2024. 2. 공사 준공

6 관련자료



위치도

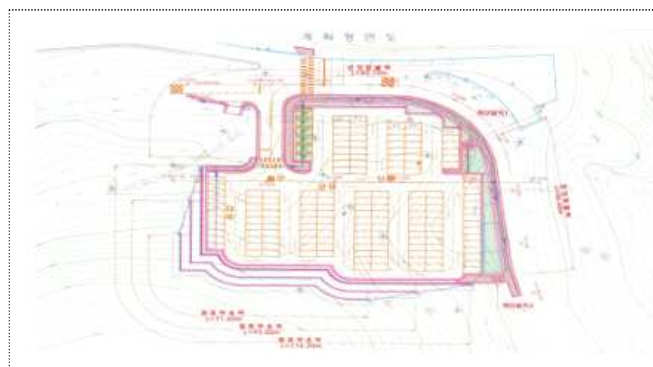

제1주차장 (확장)



현장사진(출렁다리 주변)



보행로 조성 현황

7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과 팀 주 무	장 장 관	한 윤 자 김 길 모 성 경 재	☎ 940 - 4360 ☎ 940 - 4727 ☎ 940 - 4724
---------------	------	-----	------------------	-------------	-------------------------	--

반려동물행복누리 조성

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 동물보호 및 생명존중가치 실현으로 사람과 동물이 함께 어울려 행복하게 살아갈 수 있는 환경 조성

공약달성목표

달성연도	달성목표
2025	기본 및 실시설계 추진

1 사업개요

○ 반려동물행복누리 조성

- 위치: 문산읍 내포리 산 120번지 일원 외 3개소
- 사업기간: 2022. ~ 2027.
- 사업비: 9,593백만원(국비600 도비696 시비8,297)
- 추진계획
 - 1단계_(24~27): 동물보호센터(보호실·사무실·교육장) + 동반 여가시설(산책로·카페)
 - 2단계_(24~26): 반려견 놀이터(반려견들을 위한 운동·놀이공간)
 - 3단계_(27~): 숲속 캠핑장

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

[동물보호센터]

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표	예산확보 (조성 기본계획 수립)	기본계획수립 용역, 지방재정투자심사 등 사전행정절차 이행	건축기획	기본 및 실시설계 추진	준공

[반려견 놀이터]

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.
목표	예산확보 (추진계획 수립)	관련기관·부서 사전협의 이행	실시설계 및 착공	준공	시설운영

※ 숲속 캠핑장은 '27년 이후 장기과제로 추진토록 함

○ 추진계획

[동물보호센터]

- 주요시설 : 보호실, 진료실, 입양상담실, 사무실, 훈련장 등
- 규모 : 동물보호센터 연면적 1,141㎡
- 추진일정 : 2024.~ 2027.
- 위치도(문산읍 내포리 산120)



[반려견 놀이터]

- 주요시설 : 놀이공간, 펜스, 파고라, 급수대 등
- 추진일정 : 2024. ~ 2026.
- 위치도



조리읍 캠프하우스



공릉천 하천부지



운정5동 공원부지

[숲속 캠핑장(장기추진사업)]

- 추진일정 : 2027년 이후
- 조성규모: 반려동물 테마놀이터 9,000㎡ / 숲속캠핑장 25,000㎡
- 조성계획



위치도(내포리 산122 일원)



전체계획도(안)

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	9,593		200	120	1,341	844	7,088
국 비	600				300	300	
도 비	696		60	36		300	300
시 비	8,297		140	84	1,041	244	6,788

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	
9,593	9,593	9,593		200	120	1,341	844	7,088	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
9,593	600	696	8,297		868	19	10	380	458	

5 추진현황 및 향후계획

- 2022. 10. 「과주시 반려동물 테마파크 조성 추진계획」 수립
- 2023. 2. '24년 국가균형발전특별회계 신청 및 선정
- 2023. 4. ~ 9. 반려동물테마파크 기본계획 용역 추진
- 2023. 9. 공약사업 목표 및 추진계획 변경
 - 공 약 명: 반려동물 테마파크 조성 ➡ 반려동물행복누리 조성
- 2023. 9. ~ 12. 지방재정투자심사, 공유재산 심의 등 사전절차 이행
- 2024. 2. '25년 국가균형발전특별회계 신청 및 선정
- 2024. 3. 「동물보호센터」 부지 현황측량 및 산림조사 용역
- 2024. 7. 「동물보호센터」 부지 지반조사
- 2024. 10. 「동물보호센터」 기초토목설계
- 2024. 12. 「반려견 놀이터」 준공(캠프하우즈, 공릉천)
- 2025. 1. 「반려견 놀이터」 보완조치(캠프하우즈)
- 2025. 1. 경기도 반려동물 동반 여가시설조성 공모 신청 및 선정(20억)
- 2025. 2. 「동물보호센터」 건축기획

- 2025. 3. 「동물보호센터」 경기도 지방재정 투자심사
- 2025. 4. 「반려견 놀이터」 개장(공릉천)
- 2025. 4. 「동물보호센터」 경기도 공공건축 사전검토
- 2025. 5. 「반려동물 행복누리」 마스터플랜 관련부서 사전검토
- 2025. 7. 「동물보호센터」 설계공모 관리용역
- 2025. 8. 「동물보호센터」 설계공모 운영위원회 및 공공건축위원회
- 2025. 9. 「반려견 놀이터」 보완공사 착수(캠프하우스)
- 2025. 9. ~ 12. 「동물보호센터」 기본 및 실시설계 공모
 - 9.17. 1차공고 / 10.10. 작품접수 / 10.14. 1차심사(62개 출품작중 5개 선정) / 11.28. 2차심사
- 2025. 11. 「반려견 놀이터」 보완공사 완료(캠프하우스)
- 2025. 12. 「동물보호센터」 기본 및 실시설계 착수
- 2026. 5. 「동물보호센터」 기본 및 실시설계 완료
- 2026. 7. ~ 2027. 5. 「동물보호센터」 착공 및 준공

6 관련자료



동물보호센터(고양시)



동물보호센터(용인시)



반려동물놀이터(성남시)



반려동물테마파크(오산시)

공약사항 정책실명제	주관부서	동물관리과	과	장	이	광	재	☎ 940 - 4910
			팀	장	임	혜	정	☎ 940 - 4827
			주	무	관	서	현	☎ 940 - 4825

통일동산 관광특구 활성화

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

- ▶ 관광특구 시설물 설치, 시티투어 등 운영 및 주변 관광자원과 연계한 프로그램 및 관광코스 개발을 통해 활성화

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	관광특구 활성화

1 사업개요

- 사업명 : 통일동산 관광특구 활성화 추진
- 위치 : 탄현면 성동리, 법흥리 일원(3,012,774.40㎡ / 약91만평)
- 사업량 : 무인계측기 설치·운영, 관광특구 활성화 추진 협의회, 관광교통 개선사업, 가족 아트캠핑 평화빌리지 조성 등
* ('19.4.30) 통일동산 관광특구 지정, (2020.4.10.) 통일동산 관광특구 활성화 조례 제정

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	활성화 사업	활성화 사업	활성화 사업	활성화 사업	활성화 사업	-

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	8,737	76	161	134	634	3,071	4,661
국비	6,400				400	2,370	3,630
도비							
시비	2,337	76	161	134	234	701	1,031
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026		
785	8,737	8,737	76	161	134	634	3,071	4,661		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
8,737	6,400		2,337		2,163	232	124	541	1,266	

5 추진현황 및 계획

○ 관광특구 활성화 추진협의회 구성^(임기:2년)

- 「통일동산 관광특구 조례」에 따라 사업종사자 및 주민과 전문가로 구성된 추진협의회 구성
 - * 구성현황 : 총16명(공무원 2, 시의원 2, 전문가 등 12)
- 협의회 개최·운영 : (2022년) 1회, (2023년) 2회, (2024년) 2회, (2025년) 3회

○ 스마트 관광객 계측 시스템 구축 : 관광객 통계 데이터 구축

- 통일동산 관광특구 내 주요 관광지별 출입로, 주차장 등 인구 유동량이 많은 구역 및 축제·행사가 개최되는 주요 지점에 안면인식 무인계측기 설치
 - * 설치현황 : (헤이리) 3개소, (웰빙마루) 2개소, (맛고을) 1개소

○ 2025년 통일동산 관광특구(삼도품) 대축제 개최

- 일 시 : 2025. 9. 20.(토)
- 장 소 : 통일동산 공영주차장(성동리 646)
- 내 용 : 주민참여 노래자랑, 주민자치회 공연 및 초대가수 공연 등

○ 2025년 통일동산 관광특구 방문주간

- 기 간 : 2025. 9. 20.(토) ~ 9. 27.(토) / 8일간
- 장 소 : 통일동산 관광특구 일원
- 내 용 : 영수증 및 SNS 이벤트, 거리공연, 시티투어 기획코스 운영 등

○ 道 관광특구 진흥계획 집행상황 평가 : 3년^{2023, 2024, 2025} 연속 1위 달성

- 평가근거 : 「관광진흥법」 제73조(관광특구에 대한 평가 등)
- 평가주체 : 경기도(관계분야 전문가 및 지역주민 등 평가단 구성)
- 평가결과 : 경기도(파주시, 동두천시, 평택시) 1위 (90점)

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
- 가상현실(VR), 인터랙티브, 프로젝션 맵핑 등 정보통신기술(ICT)로 구현한 DMZ실감미디어체험관 조성(22.7. 완료) - DMZ평화관광 온라인 예약 시스템 구축 및 한반도 생태평화 종합관광센터 개선으로 임진각관광지 일대를 거점으로, 관광자원을 보다 편리하게 접근·이용할 수 있도록 스마트 관광생태계 구축	달성연도 2024 달성목표 한반도 생태평화 종합관광센터 공간개선 및 스마트 관광자원 확충

1 사업개요

- 위 치 : 파주시 문산읍 마정리 1360-50번지 일원
- 사업량
 - 스마트관광도시 조성 (스마트 플랫폼, 통합스마트관광앱 개발 등)
 - 임진강 거북선 디지털 실감콘텐츠
- 사업비 : 3,234백만원 (관광안내소 개보수 24.72억, 거북선 실감콘텐츠 3억, 스마트관광 2.3억 등)

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공모준비	공모신청	사업완료	지속추진	지속추진	지속추진

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)								
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
계	3,234			300	330	64	200	2,340
국비	184					34	150	
도비	1,260				50	15	25	1,170
시비	1,790			300	280	15	25	1,170
민자								

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
7,000	3,234	894		300	330	64	200	2,340

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
894	184	90	620		694		300	330	64	

5 추진현황 및 계획

- 2021. 3. 스마트관광도시 공모사업 신청(미선정)
- 2022. 7. 임진각 ICT·VR활용 가상동화체험관 설치 및 운영(완료)
- 2022. 12. 스마트관광도시 조성 공모 TF팀 구성(관광과, 정보통신과)
- 2023. 1. 2023 스마트관광도시 공모사업 신청(미선정)
- 2023. 5. (공약이행) 거북선 디지털 실감콘텐츠 조성완료(문화예술과)
 - ▶한반도 생태평화 종합관광센터 편익동 1층 / 사업비 3억원
- 2023. 12. (공약이행) 지역관광개발사업 컨설팅 완료
 - ▶한반도 생태평화 종합관광센터 구조개선(안) 도출
- 2024. 6. (공약이행) DMZ평화관광 온라인 예약시스템 1차 운영개시
 - ▶DMZ평화관광 온라인 예약시스템 구축 / 사업비 2.3억원
- 2024. 7. (공약이행) 2024 관광안내소 신설 및 개보수 지원사업 착수
 - ▶종합관광센터 휴게공간 조성공사 / 사업비 1억원
- 2024. 8. (공약이행) 관광안내소 신설 및 개보수 사업완료
- 2025. 7. 관광안내소 공간개선 사업완료
- 2025. 12. 무장애 차량 보관소 설치 완료

6 관련자료



공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과장	한윤자	☎ 940 - 4360
			팀장	김길모	☎ 940 - 4727
			주무관	이철	☎ 940 - 4726

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행 단계					
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
▶ 6.25 전쟁 시 미군이 건설한 유일한 교량인 리비교를 역사적 의미가 담긴 관광명소로 탈바꿈하고 장파리의 주민자생적 관광프로그램 개발을 통해 리비교~장파리 연계 관광활성화 도모	달성연도 2025 달성목표 지역자원연계 관광프로그램 운영

1

사업개요

구분	리비교 관광자원화	장파리 희망마을 만들기 활성화
위치	파평면 장파리 826번지 일원	파평면 장파리 장마루로 일원
사업량	공원14,979㎡, 문화시설15,954㎡, 거점센터 2동(818.8㎡)	주민역량강화, 마을의제 발굴 등
사업비	14,190백만원 (기확보 11,474 / 미확보 2,716)	(공모선정시 지속추진)

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
리비교 관광자원화	부지조성	공원(1단계) 및 거점센터	공원(1단계) 및 거점센터 개장	지역자원연계 프로그램 운영	지역자원연계 프로그램 운영	공원2단계→ 문화시설변경
장파리 희망마을만들기	-	-	협업체 구성 신규사업 발굴	공모선정시 지속추진		사업운영

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
계	14,190	9,200	1,253	937	-	335	-	2,465
국비	6,500	5,800	700					
도비	835	600	235					
시비	6,855	2,800	318	937	-	335	-	2,465
민자								

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	
13,028	14,190	11,725	9,200	1,253	937	-	335	2,465

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	기집행	2022	2023	2024	2025
11,725	6,500	835	4,390		11,725	9,200	1,253	937	-	335

5 추진현황 및 계획

① 리비교 관광자원화

- 2018. 1. 리비교 관광자원화 계획 수립 완료(경기도)
- 2020. 10. 도시관리계획 결정(문화공원) 및 공원조성계획 결정
- 2021. 1. 공사 착공
- 2021. 10. 실시계획인가 완료
- 2022. 3. 손실보상협의 추진(보상율 98%)
- 2023. 6. 거점센터(체험동) 준공
- 2023. 12. 1단계 사업완료(공원) / 거점센터(편의동) 준공
- 2024. 7. 1단계 공원 및 거점센터 위탁운영 개시(파주도시관광공사)
- 2025. 4~11월 지역자원연계 관광자원프로그램 운영

※리비교 스토리텔링, 적벽길 걷기 프로그램 운영,DMZ평화의 길 팻크레킹,
천문 관측 프로그램(리비교 천문 시민 관측회, 청정지역 파주 별빛여행)

- 2026. 6. 공원조성계획 및 실시계획인가변경 1단계(공원) 완료
- 2027. 12. 2단계(공원) → 문화시설 변경
- 2027. 12. 군기부대양여 사업완료(하천관리과)
- 2028. 12. 문화시설 사업완료

② 희망마을 만들기

- 2024. 1. 사업 공고
- 2024. 2. 사업 신청, 심사 및 발표
- 2024. 3. ~ 11. 사업 선정 시 추진
- 2024. 12. 성과공유회 진행



DMZ평화의길 펫트레킹 행사



리비교~임진강 적벽길 걷기행사



별빛여행 시민관측회



리비교 별빛여행 천문관측회



○ 의견없음

공약사항 정책실명제	주관부서	①관광과	과	장	한	윤	자	☎ 940 - 4360
			팀	주	김	길	모	☎ 940 - 4727
		②균형개발과	무	관	성	경	재	☎ 940 - 4724
			과	장	황	인	배	☎ 940 - 5720
			팀	장	조	웅	휘	☎ 940 - 5728
			주	무	관	김	한비니	☎ 940 - 5325

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
【 수변관광지 개발 추진 】 ▶ 천혜의 자연환경인 수변자원을 활용하여 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여	달성연도 2024 달성목표 애룡호수 힐링명소 조성 착공

1

사업개요

- 애룡호수 힐링명소 조성사업
- 위 치 : 법원읍 삼방리 500번지(애룡호수 일원)
 - 사업기간 : 2022년~2026년(5년)
 - 총사업비 : 5,540백만원
 - 사업내용 : (1단계) 데크로드 / (2단계) 주차장, 산책로, 보도교

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	실시계획 용역 착공	실시설계 완료	데크로드 공사 착공 (1단계)	데크로드 공사 준공 (1단계)	주차장, 산책로 등 조성 (2단계)	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	5,540		500	710	2,230	2,100	
국비	4,000			568	1,784	1,648	
도비							
시비	1,540		500	142	446	452	
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
5,500	5,540	5,540	500	710	2,230	2,100	-	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
5,540	4,000	-	1,540	-	5,482	269	122	2,986	2,105	-

5 추진현황 및 계획


- 2022. 3. 애룡호수 힐링명소 조성 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 4. 25. 행안부 공모사업 (특수상황지역 개발사업) 신청
- 2022. 5. 30. 착수보고
- 2022. 12. 28. 시의회보고
- 2023. 5. 파주 도시관리계획 (도시계획시설 : 수변공원) 입안신청
- 2023. 6.~9. 관계기관 협의
- 2023. 9. 5. 시의회 의견청취
- 2023. 10. 4. 파주 도시관리계획(수변공원) 농지분야 협의 반려
- 2023. 11. 사업 추진방향 수정
 - 당 초: 전체 사업부지 ⇒ 도시관리계획(수변공원) 시설 결정
 - 변 경: 산책로, 광장 ⇒ 농어촌공사 목적외 사용승인
- 주차장 ⇒ 도시관리계획(주차장) 시설 결정
- 2024. 2. 6. 위·수탁협약 체결(파주시 ↔ 한국농어촌공사 파주시사)
- 2024. 2. 16. 공공디자인 자문요청
- 2024. 2. 27. 관계기관 사전협의요청(道 하천과,市 친수하천과)
- 2024. 3. 25. 파주 도시관리계획(주차장)결정 신청
- 2024. 4. 24. 도시관리계획 결정(변경)열람 공고
- 2024. 5. 23. 소규모 환경영향평가서 제출(市→한강유역환경청)

- 2024. 6. 10. 도시관리계획 결정(변경) 협의의견 알림(도시계획과)
- 2024. 6. 12. 경기도 계약심사 요청
- 2024. 6. 25. 위탁사업비 지급
- 2024. 7. 16. 경기도 계약심사 관련 현장방문
- 2024. 7. 23. 경기도 계약심사 결과 알림(道→市)
- 2024. 8. 5. 농업생산기반시설 사용허가 승인 알림 (데크로드 부분)
- 2024. 9. 30. 법원읍 주민설명회
- 2024. 11. 1. 산책로 공사 착공
- 2025. 7. 18. 홍수면부지(농업생산기반시설) 일부 폐지 승인
- 2025. 9. 12. 농업생산기반시설 사용허가(2단계 사업구간)
- 2025. 12. 10. 2단계 공사 착공
- 2025. 12. 20. 1단계 공사 완료

6 **관련자료**



위치도

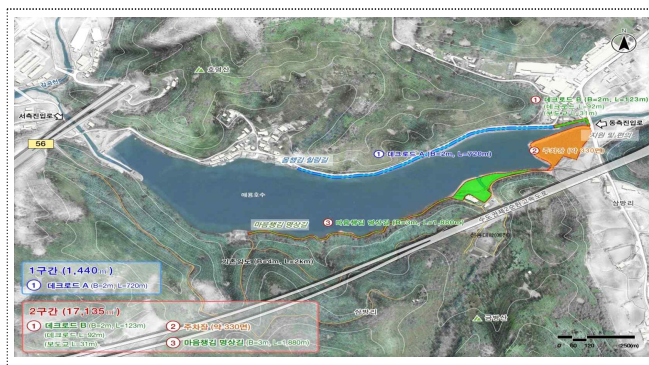

사업계획도

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	균형개발과	과 팀 주 무	장 장 관	황 박 김	인 재 은	배 훈 영	☎ 940 - 5720
								☎ 940 - 4634
								☎ 940 - 4637

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
【 체류형 관광지 조성 】 ▶ 관내 수려한 자연경관을 이용하여 생태관광지로 개발함과 동시에 관광객을 위한 야영장을 조성하여 지역자원과 연계된 체류형 관광활성화 추진	달성연도 2023 달성목표 체류형 관광지 조성

1

사업개요

구분	공릉 관광지	리비교 문화공원	법원 문화공원
위치	조리읍 장곡리 일원 ^{공릉관광지}	파평면 장파리 826번지 일원	법원읍 대능리 산18번지
사업량	산책로 조성 및 경관조명 설치, 캠핑장 확충, 기반시설 조성 등	휴식 및 체험데크 12면, 거점센터(체험동) 1동	산책로, 숲속쉼터, 주차장, 관리사무소, 화장실 등
사업비	111.5억원 (국비36.8억, 도비 24.35억, 시비 50.35억)	26억원 (국 8억, 도 8억, 시 10억)	53억 (전액시비)

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

구분	2022	2023	2024	2025.	2026.	임기후
공릉관광지	관광휴양시설	관광휴양시설	공공시설	관광휴양시설	시설정비	시설유지
리비교 문화공원	부지확보	체험동 완료	-	휴식데크 운영	체험동 운영	지속운영
법원문화공원	도시관리계획 결정추진	결정완료 및 묘지이장	묘지이장 실시설계 착수	실시설계 완료	착공 및 공원조성	준공

3 연도별 투자계획

[공릉관광지]

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
계	11,150	1,280	1,100	1,700	670	2,300		4,100
국 비	3,680					400		3,280
도 비	2,435	300	550	850	335	400		
시 비	5,035	980	550	850	335	1,500		820
민 자								

[리비교 문화공원]

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,600	1,000		1,600			
국 비	800	800					
도 비	800			800			
시 비	1,000	200		800			
민 자							

[법원 문화공원]

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	5,300		360	355	1,532	358	2,695
국 비							
도 비							
시 비	5,300		360	355	1,532	358	2,695
민 자							

4

재정 집행실적

① 공릉 관광지 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	
8,380	11,150	7,050	1,280	1,100	1,700	670	2,300	-	4,100

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
11,150	3,680	2,435	5,035	-	7,050	2,380	1,700	670	2,300	-

② 리비교 문화공원 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	
1,000	2,600	2,600	1,000		1,600	-		-	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
2,600	800	800	1,000		1,000	1,000				

③ 법원 문화공원 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
4,800	5,300	5,300	360	355	1,532	358	2,695	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,695	-	-	2,695	-	2,605	360	355	1,532	358	-

5 추진현황 및 계획

① 공릉 관광지 조성

- 2022. 11. 순환산책로(인도교Ⅰ L=114m) 조성 완료
- 2023. 10. 공릉관광지 캠핑장 기반조성공사 준공
 - 시설현황: 카라반 27대, 일반야영장 2면, 폴딩텐트 1대 등
- 2023. 10. 순환산책로(수변데크 L=685m) 설치 완료
- 2024. 8. 2025년 특수상황지역개발 신규사업 선정
 - 공릉 키즈캠핑랜드 조성(캠핑장 20면 확충, 기타시설 보수)
- 2024. 12. 순환산책로(인도교Ⅱ, 수변데크) 실시설계용역 준공
- 2025. 1. 순환산책로(인도교Ⅱ, 수변데크) 조성공사 착공
 - 인도교 L=44m, 수변데크 L=177m
- 2025. 2. 산책로 경관조명 설치사업 실시설계용역 착수
- 2025. 2. 키즈캠핑랜드 설계용역, 관광지 조성계획 변경 용역 착수
- 2026. 1. 순환산책로(인도교Ⅱ, 일반데크) 설치 완료, 산책로 경관조명 설치공사 준공
- 2027. 3. ~ 12. 공릉 키즈캠핑랜드 조성사업 시행

② 리비교 문화공원 조성

- 2020. 10. 도시관리계획결정 및 공원조성계획 결정
- 2021. 10. 실시계획인가 완료(경기도 도보 제2021-6858호)
- 2022. 3. 손실보상협의 추진(보상율 98%)
- 2023. 6. 거점센터(체험동) 준공
- 2023. 8. 공원조성계획 변경(휴식 및 체험데크)
- 2023. 12. 휴식 및 체험데크(12면) 조성완료

③ 법원 문화공원 조성

- 2020. 7. 법원읍 주민의견 수렴(마을이장 등 50명)
- 2021. 10. 사전절차 이행(재정계획 수립, 투자심사 완료 등)
- 2021. 11. 기본계획 수립
- 2023. 5. 도시관리계획(공원) 결정 고시
- 2025. 5. 공원테마변경(캠핑→숲길), 사업비 변경(48억원→53억원)
- 2025. 12. 표지이장용역·실시설계 완료
- 2026. 3. 착공
- 2026. 10. 준공

6 관련자료

① 공릉 관광지 조성



공릉캠핑장



순환산책로 조성사업

② 리비교 문화공원 조성



위치도(사업대상지)




조감도(휴식 및 체험데크)

③ 법원 문화공원 조성



위치도

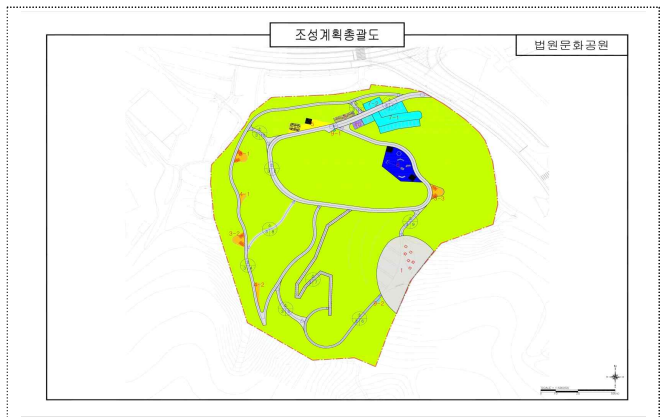

공원조성계획

7 문제점 및 대책

① 공릉 관광지 조성

○ 사유지 매입을 통한 체계적인 개발 관리로 관광지 활성화 필요

- 공릉관광지 내 (주)성원레저 부지 매입(110,820㎡, 약184억원)
- 캠핑장 추가조성과 노후된 유원시설 등 재정비로 남부지역 관광 활성화를 위한 현실적 개발 방향 검토

② 리비교 문화공원 조성

○ 1단계 공원조성은 2023년 12월되었으나, 2단계 공원조성은

군 협의(군 기부대양여사업)로 사업 추진 지연

- 친수하천과에서 25사단과 기부대양여 사업을 적극 협의 진행('27년말 완료 예정)

③ 법원 문화공원 조성

○ 인근 법원1산단 진입도로와 연계 등 관련부서 협조 필요

- 기업지원과 : 법원1산단 (북측)진입도로와 연계 협의
- 법원읍 : 시민의견 수렴 및 사업추진 홍보

공약사항 정책실명제	주관부서	①관광과	과 팀 주 무	장 장 관	한 윤 자 이 상 훈 이 지 우	☎ 940 - 4360 ☎ 940 - 5197 ☎ 940 - 5190
	주관부서	②관광과	과 팀 주 무	장 장 관	한 윤 자 김 길 모 성 경 재	☎ 940 - 4360 ☎ 940 - 4727 ☎ 940 - 4724
	주관부서	③산림정원과	과 팀 주 무	장 장 관	김 수 태 고 소 현 이 상 철	☎ 940 - 4610 ☎ 940 - 4638 ☎ 940 - 4631

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
달성연도 2024 달성목표 착공	달성연도 2024 달성목표 착공

1

사업개요

- 사업명 : 감악산 국립 자연휴양림 조성사업
- 대상지 : 적성면 객현리 산148 외 4필지(총 33ha)
- 사업비 : 86억원(국비 100%)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년)
- 사업내용 : 자연휴양림 조성 1개소(주관 : 산림청)
 - 주요시설 : 숲속의집, 산림휴양관, 야영장, 산책로 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	기본계획· 기본설계	실시설계	착공	토목공사	건축,조경	준공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	8,600	-	500	1,000	1,100	1,000	5,000
국비	8,600	-	500	1,000	1,100	1,000	5,000
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)


1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
8,600	8,600	8,600	500	1,000	1,100	1,000	5,000	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
8,600	8,600	-	-	-	2,911	-	1,057	969	885	-


5 추진현황 및 계획

- 2019. 5. 자연휴양림 신규조성 요청 파주시 → 산림청
- 2022. 1. 자연휴양림 지정·고시 완료
- 2022. 4. 자연휴양림 최종 대상지 선정
- 2022. 5. 기본계획 및 기본설계 수립 용역
- 2023. 12. 실시설계용역 완료 산림청
- 2024. 7. 객현리사격장 폐쇄 및 비전술훈련장 전환 확정 국방부
- 2024. 9. 토목공사 착공 파주시산림조합
- 2024. 12. 감악산자연휴양림 진입도로 개설공사 노선 및 단지내도로 연결을 위한 용역 변경 추진 도로건설과
- 2025. 12. 자연휴양림 건축, 전기 계약 완료
- ~ 2027. 국립 감악산자연휴양림 조성 완료 및 개장

6 관련자료

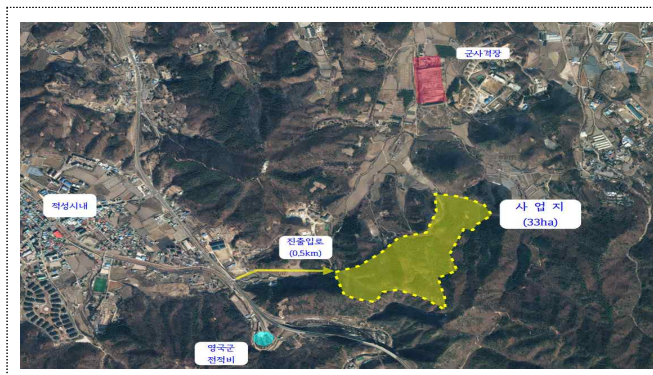

위치도

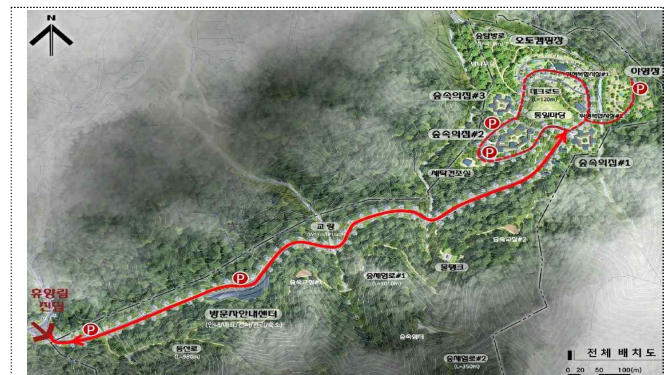

조성계획도

공약사항 정책실명제	주관부서	산림정원과	과	장	김 수 태	☎ 940 - 4610
			팀	장	최 현 회	☎ 940 - 4618
			주	무	조 혜 진	☎ 940 - 4611

운정호수공원 불꽃축제 브랜드화 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 파주의 문화·예술·평화를 접목한 테마 구성으로 축제 브랜드 이미지 제고 및 파주시 대표 축제로 발전

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	운정호수공원 불꽃축제 브랜드화

1 사업개요

- 일 시 : 매년 10월 중 개최
- 장 소 : 운정호수공원 일원
- 사업비 : 연 505백만원
- 주최/주관 : 파주시/파주문화재단
- 주요내용
 - 운정호수공원의 수변공간을 활용한 불꽃공연 및 빛조형물 설치, 주민참여 행사 등 시민들이 보고 즐길 수 있는 다양한 문화예술 콘텐츠 제공

2 추진성과

○ 주요 추진성과

- (2017) 제1회: 운정신도시연합회 추진
- (2018) 제2회: 제31회 율곡문화제 폐막행사 *2019~2020 행사취소(ASF, 코로나19)
- (2021) 제3회: 불빛축제로 대체 진행
- (2022) 제4회: 운정호수공원 불꽃축제 개최
- (2023) 제5회: 운정호수공원 불꽃축제 개최
- (2024) 제6회: 운정호수공원 불꽃축제 개최
- (2025) 제7회: 운정호수공원 불꽃축제 개최

○ 연차별 목표 및 실적

공약달성 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
운정호수공원 불꽃축제 브랜드화	계획	축제추진	축제추진	축제추진	축제추진	축제추진
	실적	축제개최	축제개최	축제개최	축제개최	
이행완료도	달성도%	100	100	100	100	
추진완료						

3 재정 집행실적

(단위: 백만원)


1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
1,270	1,948	1,948	150	280	508	505	505	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,948			1,948		1,374	150	280	439	505	-

4 향후계획

○ 2026. 제8회 운정호수불꽃축제 개최 예정

5 관련자료



[2025년 제7회 운정호수공원 불꽃축제]

공약사항 정책실명제	주관부서	문화예술과	과	장	유	초	자	☎ 940 - 4350 ☎ 940 - 4358 ☎ 940 - 4352
			팀	장	윤	은	주	
			주	무	관	홍	미	
							진	

DMZ 기억의 전당 건립 추진

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행단계					
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
▶ 파주의 역사와 문화를 포괄하는 지역의 정체성을 확보하고 파주의 상징이자 랜드마크로서의 DMZ 기억의 전당 건립	달성연도 2026 달성목표 DMZ 기억의 전당 착공

1사업개요

- 위 치 : 임진각(문산읍 마정리)
- 사업비 : 740억원(2019년 문체부 용역)^{*기본계획 수립 후 총사업비 확정}
- 사업기간 : 2022. ~ 2028.
- 사업규모 : 연면적 15,200㎡ 지하1층~지상3층
- 주요내용: DMZ 관련 유물 수집 및 전시, 기록물 전시관, 기념관 조성
 - DMZ 생태, 환경, 역사, 평화를 체험하는 복합문화공간 조성
 - DMZ 유물 수집·연구시설, 아카이빙 센터, 전시관 건립

2추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	기본계획 수립	기본계획 착수	기본계획 용역 준공	사전절차 및 설계 (투자심사 등)	착공	건설 및 준공

3연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
계	74,000		400				51,772	21,828
국비	37,000		200				25,886	10,914
도비								
시비	37,000		200				25,886	10,914
민자								

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
74,000	74,000	52,172		400			51,772	21,828

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
400	200		200		209		105	104		

5 추진현황 및 계획

- 2019. 12. DMZ 기억의 박물관^(가칭) 조성 기본구상 및 타당성 조사 완료(문체부)
- 2021. 12. DMZ 기억의 전당 기본계획수립 예산 확정 통보(문체부→과주시)
- 2022. 9. 기본계획수립 용역 시비 예산 확보^{국비2억원, 시비2억원}
- 2023. 11. DMZ 기억의 전당 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 1. DMZ 기억의 전당 기본계획 수립 용역 준공
- 2025. 4. DMZ 기억의 전당 국립시설 설립 건의(시→문체부)
- 2025. 4. 대한민국역사박물관 분관 설립 검토(문체부)
- 2025. 6. 대한민국역사박물관 분관 전략 연구용역(문체부)
- 2026. 국립박물관 타당성 종합계획 용역 추진(문체부)^{10억원}

※ DMZ 기억의 전당 건립 기본계획 수립용역 결과

- 시 설 명 : DMZ 기억의 전당
- 기본방향 : 생태, 문화, 평화를 체험하는 'DMZ 체험센터' 조성
- 검토부지 : 박물관클러스터(세관부지), 임진각(확대개발부지), 출판단지(문화시설 용지)
- 규 모 : 3층, 연면적 12,000㎡ / 전시실, 컨퍼런스룸, 공연장, 교육장 등
- 소요예산 : 건립비 596억원 / 운영비 연 28억원(인력 24명)

7 문제점 및 대책

- 문체부와 과주시 용역 결과 'DMZ 기억의 전당' 과주시 건립은 타당하나 DMZ의 특성상 지방자치단체 설립보다 최초 계획대로 국가차원에서 추진해야 할 사업으로 판단
- DMZ 기억의 전당 대한민국 역사박물관 분관 건립으로 문체부 지속 협의

공약사항 정책실명제	주관부서	문화예술과	과	장	유 초 자	☎ 940 - 4350
			팀	장	윤 은 주	☎ 940 - 4358
			주	무	관	장 지 현

문산 자유시장 지역관광 연계 및 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표

- ▶ 코로나19, 팬데믹 기간(2년)이 지나 일상생활 회복이 시작되면서 침체되어있던 지역 전통시장과 관광사업 연계로 “되찾고 싶은” 지역 고유 전통시장으로 자리매김 할 수 있는 기회 마련과 지역경제 활성화에 기여
- ▶ 인천국제공항 환승객 대상 DMZ평화관광 연계운영을 통한 파주 관광 홍보 및 지역경제 활성화

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	문산자유시장 - DMZ 지역관광 연계 추진
	인천공항 환승투어 운영

1 사업개요

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

- 추진기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업내용 : 문산자유시장에서 구매금액 1만 5천원 이상 소비자를 대상으로 DMZ통일관광명소 지역 무료 관광 투어
- 사업규모 : 문화관광해설사(1명), 관광버스 임차(1대)
- 소요예산 : 113백만원

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

- 인천공항 환승객*을 대상으로 DMZ평화관광 연계 운영

* 제3국에서 제3국으로 24시간 내에 환승하는 승객에 한하여 수도권 관광 허용

- 파주평화 환승투어 코스^{5시간}



2 추진계획

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	예산편성	계획 및 추진	시행	시행	시행	성과검토

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025.	2026.	임기후
목표	검토계획수립	운영	운영	운영	운영	운영

3 연도별 투자계획

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	113			29	29	29	26
국 비							
도 비							
시 비	113			29	29	29	26
민 자							

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
국 비							
도 비			비	예	산		
시 비							
민 자							

4 재정 집행실적

○ 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
122	113	113	-	29	29	29	26			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
113			113		87		29	29	29	-

5 추진현황

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

- 2023. 7. 문산자유시장-디엠제트(DMZ)지역 관광연계 사업 재개
- 2023. 8. “MBC뉴스투데이” 우수사례 방영(전통시장에서 장보고, DMZ관광까지)

※ 이용현황 : 2023. 7. ~ 12. 39회/ 573명 이용(1회 평균 14.6명 이용)

2024. 3. ~ 12. 70회/1,012명 이용(1회 평균 14.5명 이용)

2025. 3. ~ 12. 70회/1,193명 이용(1회 평균 17명 이용)

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

- 2022. 9. 환승투어 코스 운영 검토(시↔투어 운영사)
- 2022. 11. 환승투어 사전답사(인천공항공사 및 운영사)
- 2022. 12. 파주평화 환승투어 코스 운영 확정
- 2023. 1. ~ 파주평화 환승투어 코스 운영 개시
- 2024. 1. ~ 파주평화 환승투어 코스 지속 운영('25.1.1.~12.31. 1,651명 탑승)

6 관련자료

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계



[문산자유시장 DMZ 접수처]



[제3땅굴]

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원



[DMZ평화관광]



[오두산통일전망대]

7 문제점 및 대책

● 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

- 각종 현안 발생시 DMZ^(비무장지대) 출입 제한 → 현안발생시 군부대^(1사단) 사전협의 및 협의결과 홍보

공약사항 정책실명제	주관부서	①민생경제과	과장	장	이	이	구	☎ 940 - 4520
			팀	관	박	광	해	☎ 940 - 4528
			무		황	어	진	☎ 940 - 4550
	주관부서	②관광과	과장	장	한	윤	자	☎ 940 - 4360
			팀	관	이	제	은	☎ 940 - 8517
			무		김	규	진	☎ 940 - 8516
