

시민중심 자족도시

-안전이 먼저다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[9 - 1]	안전한 등·하굣길 지원확대 교 통 정 책 과
[9 - 2]	안전취약지대 CCTV보강 첨단도시정보과
[9 - 3]	1인가구 지원 전담부서 설치 여 성 가 족 과
[9 - 4]	재난예방 강화 체계 고도화 안 전 총 괄 과
[9 - 5]	생애주기별 먹거리 교육 제도화 및 '먹거리 시민학교'운영 도 시 농 업 과
[9 - 6]	조리 119안전센터 설치 지원 안 전 총 괄 과
[9 - 7]	민간요양병원 공공성 강화 보 건 행 정 과
[9 - 8]	달빛어린이병원 운영 보 건 행 정 과
[9 - 9]	대학병원 유치 추진 평 화 경 제 과
[9 - 10]	공공시설 우선 유니버설 디자인 확대로 이동권 보장 도 시 계 획 과

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표				
【어린이보호구역내 교통안전시설 확대 설치】 <ul style="list-style-type: none"> 어린이보호구역 내 바닥형 보행신호등, 무인교통단속장비 등 교통안전시설 확대 설치를 통해 어린이 교통사고 예방 	<table> <tr> <th>달성연도</th><th>달성목표</th></tr> <tr> <td>2024</td><td>어린이보호구역 바닥형 보행신호등 등 설치</td></tr> </table>	달성연도	달성목표	2024	어린이보호구역 바닥형 보행신호등 등 설치
달성연도	달성목표				
2024	어린이보호구역 바닥형 보행신호등 등 설치				

1

사업개요

○ 어린이보호구역 바닥형 보행신호등 설치 사업

- 대상 : 관내 초등학교 57개교 주변 횡단보도

*관내 60개 초등학교 중 심학초(시도1호선^{공사중}), 등 도로 여건상 어려운 학교, 군내초, 대성동초(민통선) 제외

- 총사업비 : 약 2,711백만원

- 사업내용 : 바닥형 보행신호등 설치

○ 어린이보호구역 무인교통단속장비 설치 사업

- 대상 : 관내 초등학교 앞 30개교, 유치원 등 앞 15개소

- 총사업비 : 약 1,397백만원

- 사업내용 : 무인교통단속장비 확대 설치

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

[단위 : 개소(바닥신호등 / 무인교통단속장비)]

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	4 / 64	36 / 56	6 / 37	11 / 28	3 / 20	-

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	6,059		1,458	2,400	250	1,046	905
국비	1,929		729	1,200			
도비	983				125	655	203
시비	3,147		729	1,200	125	391	702
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
8,100	6,059	6,059	1,458	2,400	250	1,046	905	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
6,059	1,929	983	3,147	-	4,158	1,268	1,650	237	1,003	-

5 추진현황 및 계획

- 2022. 3. '22년 무인교통단속장비 등 설치사업(국비) 예산 확보
- 2022. 5. '22년 무인교통단속장비 등 설치사업(국비) 예산 추가 확보
- 2022. 9. 바닥형 보행신호등 등 설치사업^(1차) 추진 완료(2개소)
- 2022. 11. 무인교통단속장비 설치사업 추진 완료(29개소)
- 2023. 2. 2024년 어린이보호구역 개선사업 예산 확보(도비)
- 2023. 6. 바닥형 보행신호등 설치사업^(2차) 착공(33개소)
- 2023. 1~ 12. 무인교통단속장비 설치사업 추진 완료(37개소)
- 2023. 8. 2024년 어린이보호구역 개선사업 1차 수요조사(도비)
- 2023. 11. 바닥형 보행신호등 설치사업^(2차) 준공(33개소)
- 2024. 1. 2024년 어린이보호구역 개선사업 신청(도비)
- 2024. 3. 도비 예산 확보
- 2024. 4~ 5. 무인교통단속장비 설치사업 추진 완료(2개소)
- 2024. 7. 바닥형 보행신호등 설치사업^(3차) 준공(3개소)
- 2025. 1~ 12. 무인교통단속장비 설치사업 추진 완료(28개소)
- 2025. 12. 바닥형 보행신호등 설치사업 준공(11개소)

6

관련자료



어린이보호구역 내 바닥형보행신호등

7

문제점 및 대책

- 도로여건에 따라 바닥형 보행신호등, 무인교통단속장비 설치가 어려운 현장은 기타 교통안전시설로 보강.

공약사항
정책실명제

주관부서

교통정책과

과
팀
주 무

장
장 관

우 상 완
박 명 화
정 호 영

☎ 940 - 5770
☎ 940 - 5798
☎ 940 - 5791

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>【방법 CCTV 600개소 신규 설치 (현 5,649대 운영)】</div> <div>▶ 2,400대 설치(93.7%완료) [설치2,250대 / 예정250대]</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>방법 CCTV 보강 (600개소)</div> </div>

1

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 12.
- 예산액 : 17,642백만원
- 사업내용 : 방법 CCTV 2,400대 추가설치

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	(단위, 대) 임기후
목표	500	600	809	250	250	-

3

연도별 투자계획

구분	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	17,642	3,694	6,976	3,852	1,560	1,560
국비	270	270				
도비	720	675		45		
시비	16,652	2,749	6,976	3,807	1,560	1,560
민자						

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
29,991	17,642	17,642	3,694	6,976	3,852	1,560	1,560	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
17,642	270	720	16,652	-	16,082	3,694	6,976	3,852	1,560	-

5

추진현황 및 계획

(단위: 백만원)

년도	사업명	사업기간	사업비	사업량
	계		1,560	250대
2026년	방범용 CCTV 신규 설치(도심지역)	2026. 1. ~ 10.	625	100대
	방범용 CCTV 신규 설치(비도심지역)	2026. 1. ~ 10.	625	100대
	방범용 CCTV 신규 설치(주민참여)	2026. 1. ~ 8.	200	40대
	방범용 CCTV 신규 설치 (어린이 등하굣길 안심구역 조성) ^{특교세}	2026. 1. ~ 5.	54	10대
	방범용 CCTV 설계, 감리 용역비	2026. 1. ~ 10.	56	-

○ 현장에 적합한 위치별 방범용 CCTV 구분 설치

6 **관련자료**

○ 2025년 방법용 CCTV 사업 추진결과

(기준: 2025. 12. / 단위: 백만원)

사 업 명	예산구분	사업비	사업량	비고
계		1,560	71개소 264대	
방법용 CCTV 설계	본예산	35	정보통신설계	
방법용 CCTV 설치 (도심 지역)	본예산	625	27개소 107대	
방법용 CCTV 설치 (비도심 지역)	본예산	625	32개소 113대	
주민참여 방법용 CCTV 설치	본예산	54	2개소 8대	
방법용 CCTV 설치 (운정·교하)	특별교부세 (2024년)	200	10개소 36대	
감리비	본예산	21	정보통신감리	

7 **문제점 및 대책**

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	첨단도시정보과	과 팀 주 무 관	장 장 무 관	양 성 원	☎ 940 - 8760
					김 환 태	☎ 940 - 8798
					김 우 현	☎ 940 - 8791

1인가구 지원 전담부서 설치

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>1인가구 지원 전담부서 설치</div> </div> </div>	

1사업개요

- 파주시 1인가구 현황

- 1인가구 통계

* 통계청 국가통계포털(2024년 기준)

일반 가구수	1인 가구수					비고
	합계	청년층 (39세 이하)	중장년 (40~59)	노년층 (60세 이상)	비율(%)	
201,200	59,018	18,277	19,499	21,242	29.3%	

1인가구 추이 : ('20년) 25.6% ▶ ('21년) 27.5% ▶ ('22년) 28.1% ▶ ('23년) 29.3% ▶ ('24년) 29.3%

- 경기도내 비율 : 경기도 31개 시군 중 23번째(1위 가평균 39.4%)

< 파주시 성별, 연령별 1인가구 현황 >

구분	1인 가구					
	합계	비중(%)	남자	비중(%)	여자	비중(%)
계	59,018	100	32,252	100	26,766	100
20세 미만	98	0.2	42	0.1	56	0.2
20~29세	6,635	11.2	3,704	11.5	2,931	11.0
30~39세	11,544	19.6	7,758	24.1	3,786	14.1
40~49세	8,752	14.8	5,897	18.3	2,855	10.7
50~59세	10,747	18.2	6,540	20.3	4,207	15.7
60~69세	10,636	18.0	5,276	16.4	5,360	20.0
70~79세	6,225	10.6	2,073	6.4	4,152	15.5
80세 이상	4,381	7.4	962	3.0	3,419	12.8

- 주요 추진사업

- (조례제정) ‘22.4.29. 「파주시 1인 가구 지원 조례」 제정

- (기본계획) ‘23년 1인 가구 지원을 위한 기본계획 수립

* (6개 분야) 사회안전망, 주거, 커뮤니티, 건강, 문화·여가 생활, 일자리 등

- (부서협업) 부서별 추진 중인 1인가구 사업에 대한 확대·개선 등 협업

- (정책발굴) 1인가구 특성을 반영한 맞춤형 지원정책 발굴·추진

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026	임기후
목표	'23년 예산편성	기본계획 수립	기본계획 추진	전담팀 설치	기본계획 추진	기본계획 추진

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	389			115	88	101	85
도 비	115			34	26	30	25
시 비	274			81	62	71	60

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
228	389	389		115	88	101	85	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액				
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025
389		115	274		304		115	88	101

5 추진현황 및 계획

○ 「파주시 1인 가구 지원 조례」 제정('22. 4. 29.)

- 1인 가구에 대한 지원근거 및 지원범위 등 규정

○ 1인가구 사업 전담인력 배치('23. 3.)

- 파주시 가족센터 내 전담인력 배치(1명)

○ 2023년 1인가구 지원사업 신규 추진 현황

- 1인가구 지원사업(57,000천원), 1인가구 심리정서 지원(9,000천원)
- 1인가구 여성 안심 패키지(49,980천원)

○ 2024년 1인가구 지원사업 추진계획


- 1인가구 지원사업(57,500천원), 1인가구 심리정서 지원(10,000천원)
- 1인가구 여성 안심 패키지 지원(20,580천원)

○ 2025년 1인가구 지원사업 추진계획

- 1인가구 지원사업(65,252천원), 1인가구 심리정서 지원(15,000천원)
- 1인가구 여성 안심 패키지 지원(20,600천원)

- 「1인가구 지원 추진단」 구성 여성가족과-7047(2025.4.2.)

- 운영기간 : 2025. 4. 2. ~ 계속
- 구성현황 : 단장(복지정책국장), 실과소, 읍면동 (8개 부서, 15개 사업)

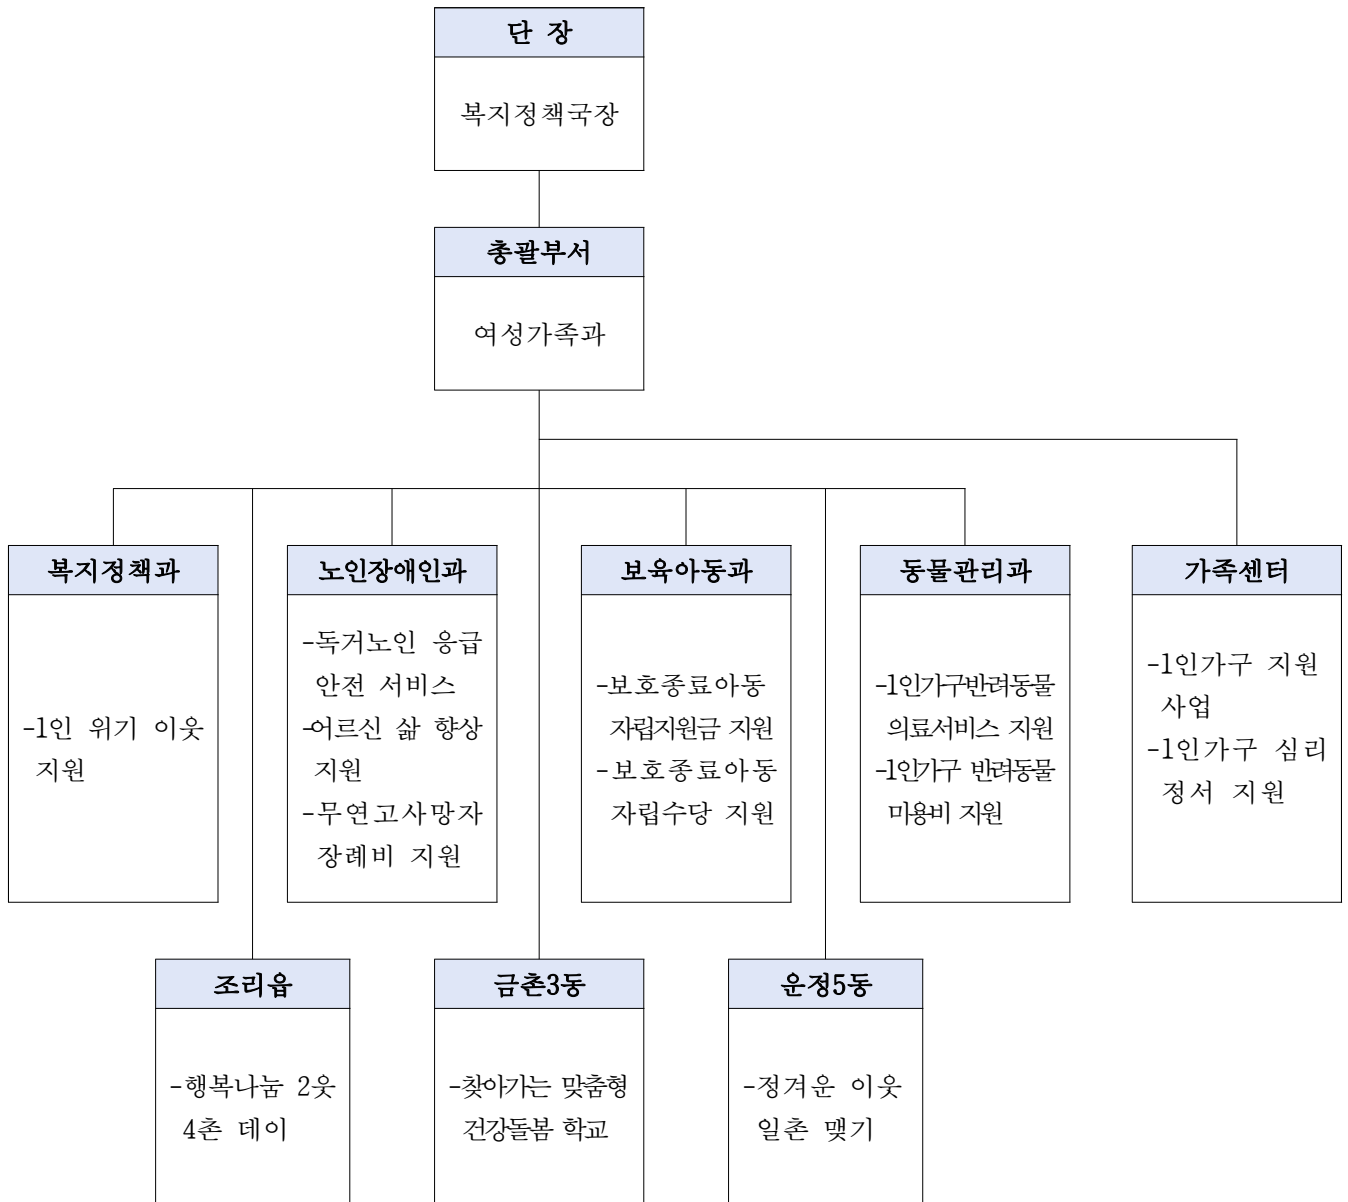

○ 2026년 1인가구 지원사업 추진 계획

- 1인가구 지원사업(67,700천원), 1인가구 심리정서 지원(10,000천원)
- 1인가구 여성 안심 패키지 지원(7,200천원)

(단위:천원)

구분		주요추진사항	예산액
실 과 소	여성가족과 (총괄부서)	- 1인가구 지원사업 총괄 - 1인가구사업(건강돌봄, 식생활개선, 재무교육, 동아리활동지원 등) - 1인가구 사회관계망 형성 지원을 위한 심리정서 프로그램운영 - 여성 1인가구의 안전한 일상을 돕기 위한 여성안심패키지 지원 - 여성 1인가구의 범죄 불안감 해소를 위한 무인택배보관함 운영	125,926
	복지정책과	- 복지 사각지대 위기이웃(1인가구 등) 발굴 활동을 위한 활동 지원비, 장려물품 지원	62,850
	노인장애인과	- 60세 이상 어르신을 대상으로 인생노트 프로그램, 법률 및 안전사고 예방교육 - 65세 이상 독거 어르신 가구에 상태정보 모니터링 및 안전교육 - 무연고 사망자에 대한 장례 및 추모의식 지원	315,850
	보육아동과	- 보호종료 자립준비청년 및 15세 이후 즉보호 종료자에게 자립 정착금 1,500만원 지급 - 자립준비청년(보호종료아동)에게 자립수당 월 50만원 5년간 지급	596,000
	동물관리과	- 사회적 배려대상(1인가구 등)의 반려동물에게 치료비, 백신 접종 등 최대 16만원 지급(최대 20만원의 80%) - 사회적 배려대상(1인가구 등)의 경제적 부담 완화를 위해 반려동물의 미용비 최대 8만원 지급(최대 10만원의 80%)	8,000
읍 면 동	조리읍	- 1인가구 취약계층 20가구와 1대1 일촌맺어 정기 방문, 말벗, 후원품 전달 등 지역사회 안전망 구축	4,400
	금촌3동	- 독거노인 식사 지원 및 만성질환 고령자 건강관리를 위한 찾아가는 의료서비스 제공	2,500
	운정5동	- 1인가구 15가구와 1:1결연을 통해 정기 가정방문 및 모니터링, 필요 서비스 연계지원	(비예산)

○ 해당없음

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	여성가족과	과 팀 주 무	장 장 관	한 정 김	경 은 혜	희 정 영	☎ 940 - 8680
								☎ 940 - 4498
								☎ 940 - 4491

재난예방 강화 체계 고도화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 자연재해 저감 및 시민의 생명과 재산피해 최소화 】

- ▶ 자연재난 정보수집 및 신속한 대처계획을 전파하여 인명·재산피해 예방
- ▶ 표준화된 재난 예·경보 전달체계 수립, ICT기반의 효율적 재난업무 수행

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	재난예측시스템 확충

1 사업개요

○ 재난 예측 시스템 확충

- 파주지역의 구조적 특성과 과거 재난이력, 재난발생 시 예상피해 등을 분석하여 적절한 재난 예경보 기준을 설정하고, 이를 통해 재난 예경보 발령 시점을 명확히 하여 인명 및 재산피해를 최소화하고 재난관리 업무의 효율성 제고
- 임진강 유역 비상대처계획 수립 용역 추진과 병행하여 기존 임진강 유역의 홍수피해 관련 모든 정보를 3차원 GIS기반 통합 상황관리 체계구축

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표	음성통보 4식 전광판 2식 재난CCTV 12식	음성통보 11식 전광판 10식 재난CCTV 13식	음성통보 2식 재난CCTV 14식 적설계 2식	음성통보 8식 재난CCTV 21식 적설계 11식 등	음성통보 12식 전광판 2식 재난CCTV 37식 침수알람 11식

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	4,816	473	1,240	659	1,451	993
국비						
도비	2,025	189	496	264	580	496
시비	2,791	284	744	395	871	497
민자						

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
4,672	4,816	4,816	473	1,240	659	1,451	993	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
4,816	-	2,025	2,791		3,505	374	1,084	602	1,445	-

5

추진현황 및 계획

(단위: 개소)

구분	합계	재난 CCTV	자동음성 경보장치	재해 전광판	출입통제 자동차단기	침수 알람장치	급경사지 관측계	자동기상 관측장비	강우량계	수위계	적설계
	561	211	93	41	8	33	9	8	104	41	13
~2021	302	113	44	19	7	0	0	8	67	31	13
2022	20	10	4	2	0	0	0	0	4	0	0
2023	76	14	26	10	0	0	0	0	26	0	0
2024	65	31	2	2	1	18	9	0	2	0	0
2025	46	21	5	6	0	9	0	0	5	0	0
2026	52	22	12	2	0	6	0	0	0	10	0

※ 2023년 임진강 유역 비상대처 계획 수립 용역에 따라 자동음성경보장치, 강우량계 15개소 설치 완료

6

관련자료



자동음성 경보방송시설



재해문자 전광판



재난감시CCTV



자동출입차단시설

7

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	안전총괄과	과 팀 주 무	장 장 관	임 공 빈 표 형 주 김 덕 인	☎ 940 - 4680 ☎ 940 - 5758 ☎ 940 - 5752
---------------	------	-------	------------------	-------------	---	--

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표		공약달성목표	
<div> <div> <div>▶ 도시에 거주하는 시민 중심으로 지역 농산물 소비 촉진을 위한 교육 및 먹거리 교육을 통해 미래 세대의 바른 식생활·식습관의 중요성 인식</div> </div> </div>		<div> <div>달성 연도</div> <div>2023</div> </div>	<div> <div>달성목표</div> <div>먹거리 시민학교 운영</div> </div>

1

사업개요

- 파주시 먹거리 시민학교 운영

○ 도시에 거주하는 다양한 계층의 파주시민을 대상으로 먹거리 교육

- 영·유아, 아동·청소년, 청·장년, 노년, 주부 등

○ 생애주기별 식생활 교육, 식생활 트렌드 정보제공, 요리교실, 로컬푸드 교육 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	‘23년 본예산편성	먹거리 시민학교 운영	먹거리 시민학교 운영	먹거리 시민학교 운영	먹거리 시민학교 운영	먹거리 시민학교 운영

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
계	240			50	50	70	70
국비							
도비							
시비	240			50	50	70	70
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
200	240	240	-	50	50	70	70	70		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
240	-	-	240	-	165	-	48	48	69	-

5 추진현황 및 계획

- 2024. 6. ~ 12.
 - 학교별 찾아가는 식생활 교육(25개 학교 3,270명 대상)
 - 식생활교육 전문강사 양성과정 운영(10회)
- 2025. 6. ~ 12.
 - 파주시민 식생활교육(63회 909명 대상)
 - 파주 로컬 식생활 체험(6회 105명 대상)
 - 식생활교육 전문강사 양성과정 운영(17회)
- 2026. 3. ~ 12.
 - 학교별 찾아가는 식생활 교육(150회)
 - 식생활교육 전문강사 역량강화 교육(10회)

6 관련자료



전문강사 양성과정



찾아가는 식생활 교육

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시농업과	과	장	송 호 철	☎ 940 - 4810
			팀	장	노 미 연	☎ 940 - 5207
			주	무	임 진 오	☎ 940 - 5284
			관			

조리 119안전센터 설치 지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표

- ▶ 119안전센터 신설은 소방서 자체사업으로, 파주 소방서에서 조리119안전센터를 조속히 설치할 수 있도록 적극 지원

공약달성목표

달성연도	달성목표
2026	조리 119안전센터 신설 지원

1 사업개요

○ 설치 필요성

- 관련 법령 : 「지방소방기관 설치에 관한 규정」(대통령령)

「지방소방기관 설치에 관한 규정」

【별표2】 3. 119안전센터의 설치기준

가. 소방업무의 효율적인 수행을 위하여 다음 기준에 따라 119안전센터를 설치할 수 있다.

2) 광역시, 인구 50만명 이상의 시 : 인구 3만명 이상 또는 면적 5km² 이상

※조리읍 인구수 : 29,063명('25. 12월말 기준) / 조리읍 면적 27.5km²

- 조리읍 인구수 기준으로는 119안전센터 설치가 불가하나 면적 기준으로는 설치 가능
- 조리읍 오산리, 등원리, 뇌조리, 능안리 등 일대 화재에 매우 취약한 영세공장이 밀집해 있어 각종 재난사고에 신속한 대응 필요

2 추진현황

- ('21. 4.) 경기도소방재난본부 '안전센터 신설 연구용역 3차 추진계획' 수립
- ('21. 4.) 파주시 조리 119안전센터 신설 요청

- ('22. 2) 경기도 총 25곳 안전센터 중 조리안전센터 22위 후순위로 안전센터 설치 시기 불투명
 - (후순위 사유) 근접 안전센터 거리(금촌 119안전센터 : 2.5km) 및 캠프 하우스 도시 개발사업 장기간 소요 등
- ('25. 3) 캠프하우스 근린공원 내 옛 소방서 부지 및 건물(1층 / 241㎡) 활용가능 회신^(평화경제과)에 따른 ‘안전센터 신설 제4차 연구용역’ 추진시 해당내용 반영 요청(→ 道 소방재난본부·과주소방서)

3 향후계획

- 2026년 중. 道 ‘안전센터 신설 연구용역 4차 추진계획’ 시 안전센터 신설 지원

공약사항 정책실명제	주관부서	안전총괄과	과 팀 주 문	장 장 과 문	임 공 빈 김 진 홍 정 박	☎ 940 - 4680
						☎ 940 - 4688
						☎ 940 - 4686

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계					
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	예산	<u>비예산</u>	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> ▶ 감염병 대응체계 구축과 종사자 처우개선을 통해 간호·간병 질적 향상 및 공공성 강화 도모 </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>민간요양병원 공공성 강화</div> </div>

1

사업개요

○ 파주시 병원급 의료기관 현황

(‘26. 1.현재)

총 계	병원급 의료기관						요양병원 비율
	종합병원	일반병원	요양병원	정신병원	치과병원	한방병원	
42	2	15	17	1	3	4	40.4%

○ 요양병원 종사자 처우개선 지원

- 요양병원 종사자 시설 개보수 등 지원

○ 의료법 및 감염병 대응 지도·점검 강화를 통한 공공성 제고

- 감염 발생 대책 훈련 및 감염담당자 역할 숙지 등 감염병 대응체계 구축 강화
- 요양병원 정기·수시 점검 확대

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표	처우개선 지원 검토	처우개선 지원	지속추진	지속추진	지속추진
	지도·점검 강화	지도·점검 강화	지속추진	지속추진	지속추진

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
국비							
도비							
시비		해	당	없	음		
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
			해	당	없	음		

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026

5 추진현황 및 계획

○ 요양병원 종사자 처우개선 지원 사업 추진

- 2022. 7. 도 내 요양병원 처우개선비 지원 사례 조사 : 사례 없음
- 2023. 3. 보건복지부 사회보장협의 대상 제외 통보

○ 「현장노동자 휴게시설」 지원 1개소 지원 소망요양병원

○ 요양병원 지도·점검 강화 : 연 1회 → 연 4회 확대 / 220회 실시

- ('23. 분기별 점검 실적) 100%(78회) / ('24. 분기별 점검 실적) 100%(74회)
- ('25. 분기별 점검 실적) 100%(68회)
- CRE 감염증 등 예방 교육 실시 : 22개소 / 506명

구 분	중점 점검 내용	비 고
1분기	- 호흡기 예방 대책, 감염관리실 및 감염담당자 유무 등	
2분기	- 여름철 대비 공기순환시설, 허가사항 외 용도변경 확인	
3분기	- 노인학대 등 결격사유 확인, 무면허 의료행위 점검	
4분기	- 중대 시민 재해 예방(실내 공기질, 건축물)이행 확인	

○ 민간 요양병원 종사자 처우개선 지원 등 지속 모니터링 추진

- 분기별 사회적 문제 및 계절별 중점 사항 점검 실시
- 요양병원 종사자 처우개선 사업 지속 모니터링

공약사항 정책실명제	주관부서	보건행정과	과	장	김진우	☎ 940 - 5560
			팀	장	박순아	☎ 940 - 5957
			주	문	관	김지은

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
		제도	재정	권한	검토
		추진	완료	불가	

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> 소아 경증 환자의 신속한 진료체계를 위한 외래진료체계 구축 파주시 소아환자의 진료권 보장으로 양질의 공공 의료서비스 제공 	<div> <div>달성연도</div> <div>달성목표</div> </div> <div> <div>2023</div> <div>달빛어린이 병원 지정 운영</div> </div>

1

사업개요

○ 어린이병원 현황

소아전문의(진료과목 포함)

(‘26.1.현재)

총 계	병원급 의료기관			의원급 의료기관		
	소 계	어린이병원	소아과 진료	소 계	소아과 전문 의원	소아과 진료 의원
217	9	3	6	208	19	189

- 지정기준
- 진료대상 : 소아 경증 환자
 - 운영형태 : 평일 주3일 이상 또는 휴일 포함 최소 주2일 이상
 - ※ 야간·토·일·공휴일 외래진료 포함
 - 운영시간 : 09:00 ~ 23:00시까지 운영 必

운영시간	평일	토·일·공휴일(명절 포함)	비고
표준운영시간	18시~24시	09시~22시	
최소운영시간	18시~23시	10시~18시	

※ (지침변경) 여러 병의원 당번제 운영 ➡ 개별 병의원 최소 주2일 이상 운영

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.
목표	수요조사	달빛 어린이병원 지정	달빛어린이병원 운영		

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	864	-	-	-	108	338	418
국 비	319	-	-	-	39	120	160
도 비	386	-	-	-	48	149	189
시 비	159	-	-	-	21	69	69
민 자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
-	864	864	-	-	108	338	418	209


3) 확보금액					4)집행금액				
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025
864	319	386	159	-	444	-	-	108	336

5 추진현황 및 계획

○ 달빛어린이병원 참여 의료기관 보건복지부 인증 완료

구 분	지정기간	주 소	협력약국	비 고
VIC365병원	'24.5.27.~ '26.5.26.	책향기로 836, 3~5층	로이약국, 참약사꿈약국	
로데오소아 청소년과의원	'24.6.24.~ '26.6.23.	금빛로 24-18	금릉곰돌이약국	
365삼성i 소아청소년과의원	'26.1.1.~ '27.12.31.	교하로 87, 8층	운정일반약국	

6 관련자료

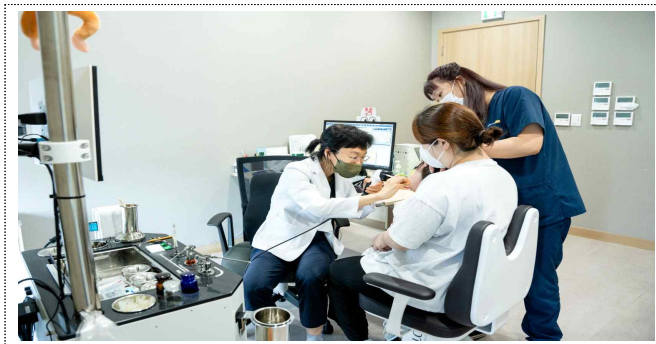

공약사항 정책실명제	주관부서	보건행정과	과	장	김 진 우	☎ 940 - 5560
			팀	장	박 순 아	☎ 940 - 5957
			주	무	관 김 지 은	☎ 940 - 5571

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	<u>기타</u>	<u>임기내</u>	임기후	예산	<u>비예산</u>	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	<u>추진</u>	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> 메디컬클러스터 내 차질 없는 대학병원 유치 및 적기 건립 추진 	<div> <div>달성연도</div> <div>2026</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>대학병원 유치 확정</div> </div>

1

사업개요

- 위치/면적 : 종합의료시설 용지 / 39,968㎡
- 병원규모 : 500병상 이상 (추후 700병상 증축 계획)
- 건립비 : 약 5,000억원 (예상)
- 건립시기 : 2031년 (예상)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	행정절차 이행	행정절차 이행	실시계획 인가	개발계획 및 실시계획 변경 / 대학병원 공모	대학병원 유치확정	건립공사

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	민간자본사업(비예산 사업)						

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
		민간자본사업(비예산 사업)						

5 추진현황 및 계획

- 2022. 3. 사업시행승인 고시 (도시개발구역 지정 및 개발계획 수립)
- 2022. 7. 중앙토지수용위원회 공익성 심사 통과 및 사업인정 고시
- 2024. 12. 사업시행(변경)승인 고시 (실시계획인가)
- 2025. 7. 사업시행(변경)승인 고시 (개발계획 및 실시계획 변경)
- 2025. 11. 대학병원 유치 공모(※사유 : 중토위 사업인정 협의 조건)
- 2026. 우선협상대상자 선정 및 실시협약 체결
- 2027.~2029. 건축설계 및 인·허가
- 2029.~2031. 공사 착공 및 준공

6 관련자료



7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	평화경제과	과 팀 주 무	장 장 관	정 해 오 김 성 태 최 상 기	☎ 940 - 5350 ☎ 940 - 5368 ☎ 940 - 5362
---------------	------	-------	------------------	-------------	-------------------------	--

공공시설 우선 유니버설 디자인 확대로 이동권 보장
- 심의·자문 시 유니버설디자인 적용 강화-

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
▶ 시민 중심의 모든이를 위한 유니버설디자인 확대로 주민이 체감할 수 있는 안전하고 편리한 생활환경 구축		달성연도	달성목표
		2023	유니버설 디자인 적용 심의, 자문 강화

1 사업개요

- 공공디자인 진흥위원회 경관 심의·자문 시 유니버설디자인 적용 강화
 - (근거규정) 경관법 28조, 경관조례 23조, 공공디자인 진흥조례 제8조
 - (사업대상) 공공건축물, 공간, 시설물, 사인 등 심의(자문)대상
 - (지원내용) 유니버설디자인 적용에 대한 준수여부 관리 및 컨설팅
 - (사업비) 공공디자인 진흥(분과)위원회 운영비 14,400천원

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.~2025.	2026.	임기후
목표	유니버설디자인 기반 구축	유니버설디자인 심화 확산 관리·지원	유니버설디자인 확대	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	81.6	-	19.2	19.2	14.4	14.4	14.4
시비	81.6	-	19.2	19.2	14.4	14.4	14.4

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
96	81.6	81.6	19.2	19.2	14.4	14.4	14.4	14.4

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
81.6			81.6		62	17.8	19.2	14.4	10.6	

5 추진현황 및 계획

○ 공공디자인 진흥(분과)위원회 운영

- 공공건축·공공디자인에 대한 경관 및 공공디자인 심의(자문)시 유니버설디자인 적용 강화^{체크리스트}, 심의 후 조치계획 반영 여부 확인

개최 횟수	2022	2023	2024	2025	안전 수	2022	2023	2024	2025
소 집	-	1	2	1	심 의	3	3	3	1
서 면	13	6	4	7	자 문	12	9	12	12
계	13회	7회	6회	8회	계	15건	12건	15건	13건

○ 도시디자인 컨설팅(자체 개발·자문) 추진

- 각 부서 추진사업에 대하여 디자인 컨설팅 시 유니버설디자인 적용

	개발		자문
건축물	1	건축물	8
공간	6	공간·조명	4
시설물	15	시설물	17
사인	27	사인	6
계	49건	계	35건

○ 보행환경 매뉴얼 개발(유니버설 디자인 적용 건기 편한 도시 만들기) '23. 11.

- 2023. 4. 5. 혁신동아리 1차 대면회의 : 역할분담 및 동아리 방향 설정
- 2023. 5. 18. 혁신동아리 2차 대면회의 : 주제, 사례, 대상지 공유
- 2023. 7. 6. 혁신동아리 3차 대면회의 : 전문가 교육, 현장조사 일정 논의
- 2023. 9. 혁신동아리 4~6차 대면회의 및 현장확인: 학령산·운정호수공원
- 2023. 9. 12. 혁신동아리 활동보고서 제출
- 2023. 9. 25. 혁신동아리 성과보고회 발표
- 2023. 11. 30. 보행권 확보 및 보행환경 개선 가이드라인 매뉴얼 개발

※ 경기도 공모사업 「2024년 교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업」 선정 및 추진

- 기 간 : 2024년 2월 ~ 2025년 12월
- 위 치 : 파주시 순못길 87 (다율동, 큰나무희망어린이집)
- 내 용 : 장애 아동과 비장애 아동의 통합 놀이공간 조성
(장애 아동 이동권 보장, 통합놀이·치료시설 지원)
- 사업비 : 총 500백만원 (도비 150백만원(30%), 시비 350백만원(70%))
- 대상지 선정사유 : 보육청소년과의 통합놀이터 조성 제안에 따른 협업


※ 유니버설디자인 조례 제정

- 목 적 : 공공공간을 비롯한 생활환경 전반에 유니버설디자인을 도입하여 모두가 차별 없이 이용할 수 있는 환경 조성
- 주요내용 : 유니버설디자인 적용범위, 기본계획·가이드라인 규정 등
- 추진사항 : '23. 11. 10. ~ 30. 입법예고(20일)
'24. 2. 8. 조례공포

6 관련자료

국·영문병기, 현위치 표기
문자크기 확대, 인지성 높은 서체사용

- ▶ 인지성, 가독성 강화
- ▶ 길찾기 이동편의

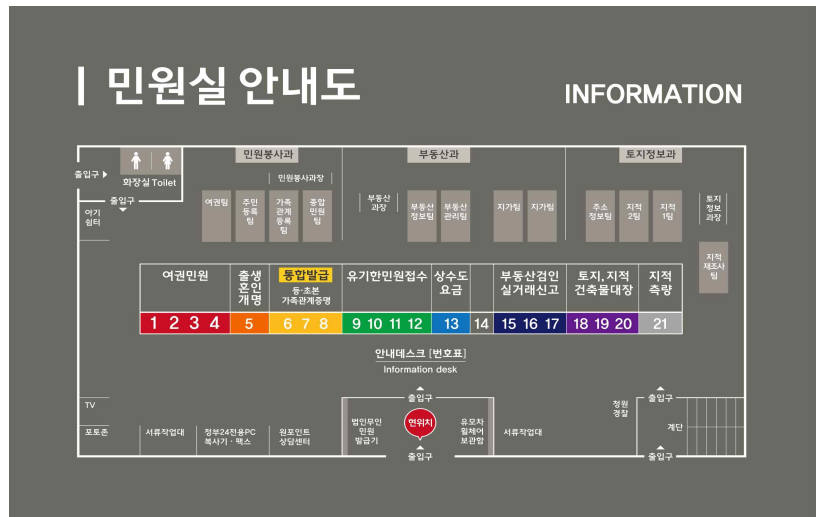

디자인 컨설팅(개발) - 민원실 안내도 변경 전·후

7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시계획과	과 장 팀 장 주 무 관	박 지 영 강 미 정 윤 혜 영	☎ 940 - 4700 ☎ 940 - 5378 ☎ 940 - 5371
---------------	------	-------	---------------------------------	-------------------------	--

시민중심 자족도시

-농촌은 뿌리다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[10-1]	농업 본예산 및 농업전문인력육성 기금 조성액 확대 농업정책과 도시농업과
[10-2]	로컬푸드 복합문화센터 건립 도시농업과
[10-3]	농산물 가공센터 지원 확대 도시농업과
[10-4]	민통선 지역 가뭄해결 농업정책과
[10-5]	스마트 농업 연구개발센터 운영지원 기술보급과
[10-6]	에너지 복지 확대 (도시가스 보급 확대 및 소형LPG저장탱크 보급) 에너지과
[10-7]	희망마을만들기 프로젝트 지속 지원 균형개발과
[10-8]	미군 반환 공여지(캠프에드워즈)개발 추진 평화경제과
[10-9]	캠프하우즈 주변지역 도시개발사업 조속 추진 평화경제과
[10-10]	탄현지구 공동주택 건설 적극지원 주택과
[10-11]	유승앙브와즈 주거문제 법적개선 주택과

농업 본예산 및 농업전문인력육성 기금 조성액 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 농업 본예산 확대를 통한 도농간 균형발전 도모
- ▶ 농업전문인력육성기금 확대를 통한 농업인 학습 단체 육성

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	농업 본예산 및 기금 조성액 확대

1 사업개요

① 농업 본예산

- 예산현황 : 70,004백만원^{2026년 본예산}
- 사업내용
 - 농업인 복지 증진 및 농촌 활성화
 - 고품질 농산물 생산을 위한 지속가능한 농업기반 조성
 - 경쟁력 있는 지속가능한 축·수산업 육성
 - 농촌 전문인력 육성 및 신기술 연구개발

② 농업전문인력육성 기금

- 설치목적 : 농·축산물 경쟁력 제고를 위한 농업인학습단체 지원 육성
- 설치년도 : 2000년
- 기금현황 : 총 3,543백만원(원금 3,000백만원 + 누적이자 543백만원)
- 기금사업내용
 - 농업인학습단체 기술연수 및 육성 지원사업 : 1개사업 / 50백만원
 - 학교4-H 및 청년4-H회 행사지원 : 1개사업 / 10백만원
 - 지역특화 작목 활력화 사업 : 1개사업 / 18백만원

2 추진계획

① 농업 본예산

(단위: 백만원)

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	계획 검토	예산편성 및 사업진행	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진

② 농업전문인력육성 기금

(단위: 백만원)

연도별	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
목표	농업전문인력육성 기금 조례 개정	기금조성액 증액 및 기금사업 진행	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진

3 연도별 투자계획

① 농업 본예산

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	363,884	70,923	73,939	71,102	77,916	70,004
국 비	113,482	19,717	22,717	23,776	23,531	23,741
도 비	63,285	14,400	14,327	11,568	12,903	10,087
시 비	187,117	36,806	36,895	35,758	41,482	36,176
민 자						

② 농업전문인력육성 기금

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,543	3,193	-	100	100	100	50
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	3,543	3,193	-	100	100	100	50
민 자	-	-	-	-	-	-	-

4

재정집행 실적

① 농업 본예산

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
124,247	363,884	363,884	70,923	73,939	71,102	77,916	70,004	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
363,884	113,482	63,285	187,117		260,432	63,901	62,372	63,233	70,926	

② 농업전문인력육성 기금

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2023	2024	2025	2026	
3,127	3,543	3,543	3,193	100	100	100	50	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,543	-	-	3,543	-	124.6	69	51.8	3.8		

5

추진현황 및 계획

① 농업 본예산

○ 친환경 농축수산업 육성을 기반으로 하여 안정적인 자립영농 기반 구축

- 선진 부자농촌 건설 분야 42,367백만원
- 지속가능한 축수산기반 강화 11,898백만원
- 농업인프라 구축 및 소비촉진 9,986백만원
- 스마트 첨단 농업 기반 조성 5,752백만원

② 농업전문인력육성 기금

- 2001. ~ 2005. 기금조성액 2,000백만원 조성
- 2015. 기금조성액 3,000백만원으로 확대
 - 농업인학습단체 선진농업 벤치마킹, 홍보, 전문기술 연수 등 지원
 - * 기금조성액의 수익금내에서 사업지원('22년 71백만원 지원)
- 2022. 기금조성액 3,127백만원
- 2022. 기금조성목표액 3,500백만원 변경(조례개정)
- 2023. 제2회 추가경정예산으로 기금조성액 100백만원 확보
- 2023. ~ 2025. 연 100백만원 기금 확대
- 2026. 50백만원 기금 확대

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 농업 본예산
 - 2027년 농림축산식품부 및 경기도 농업본예산 확대 · 증액요구
- 농업전문인력육성 기금
 - 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	농업정책과	과장	장	남명우	☎ 940 - 4560
			주무관	최승철	☎ 940 - 4568	
			조형준	송호철	☎ 940 - 4567	
		도시농업과	과장	장	송호철	☎ 940 - 4810
			주무관	김수진	☎ 940 - 4808	
			조형준	조형준	☎ 940 - 4805	

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>▶</div> <div>친환경 농산물 등 품질 좋은 먹거리를 관내에 공급하여 시민의 먹거리 복지를 증진하고 농업인의 소득 증대 등 지역 내 먹거리 선순환 체계 구축</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>로컬푸드 복합센터 착공</div> </div>

1

사업개요

- 위 치 : 와동동 1415번지
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 사 업 비 : 12,000백만원
- 사업규모 : 1개동 / 2층 건물(연면적 1,973㎡)
- 주요시설 : 로컬푸드 직매장, 교육장, 소비자 조리체험실, 사무실 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 9.
목표	-	로컬푸드 복합센터 사업비 확보	로컬푸드 복합센터 설계	로컬푸드 복합센터 착공	로컬푸드 복합센터 준공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	12,000				1,227	9,609	1,164
국비							
도비	1,000					1,000	
시비	11,000				1,227	8,609	1,164
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
29,299	12,000	12,000	-	-	1,227	9,609	1,164	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
12,000	-	1,000	11,000	-	3,298	-	-	112	3,186	-

5 추진현황 및 계획

- 2022. 4. 파주시 공공급식 지원에 관한 조례 제정
- 2023. 1. 로컬푸드TF팀 신설
- 2023. 2. 선도지역 벤치마킹(화성, 세종, 완주, 괴산)
- 2023. 3. 로컬푸드 공공조달체계 구축 추진계획 수립
- 2023. 6. 로컬푸드 공공조달체계 구축 변경 추진계획 수립
- 2023. 12. 로컬푸드 복합센터 사업비 확보
- 2024. 1.~2025. 3. 로컬푸드 복합센터 건축 설계공모 및 실시설계
- 2025. 7. 로컬푸드 복합센터 착공
- 2026. 9. 로컬푸드 복합센터 준공

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시농업과	과	장	송 호 철	☎ 940 - 4810
			팀	장	노 미 연	☎ 940 - 5207
			주	무	송 준 영	☎ 940 - 5204

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
500	3,275	3,275	-	-	2,850	425	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,275	1,250	387	1,638	-	3,147	-	-	700	2,447	

5 추진현황 및 계획

- 2023. 1. 2024년 지역농촌지도사업활성화 지원(균특-자율계정) 국비사업 신청
※사업비 : 2,500백만원(국비 1,250백만원 / 시비 1,250백만원)
- 2023. 3. ~ 5. 로컬푸드 공공조달체계 연계형 농민거점 가공센터 건립계획 수립
- 2023. 12. 중기지방재정계획 및 공유재산관리계획 반영
- 2024. 2. ~ 3. 기본설계, 실시설계, HACCP기준 레이아웃설계 용역 발주
- 2024. 7. HACCP 레이아웃 설계 완료 및 실시설계 진행
- 2024. 8. 계약심사 및 공사업체 선정
- 2024. 10. 농산물종합가공센터 착공(10. 23.)
- 2025. 6. 농산물종합가공센터 준공(6. 25.)
- 2025. 7. ~ 11. 농산물 가공장비 설치
- 2025. 12. 농산물종합가공센터 완공(12. 12.)

6 관련자료



농산물종합가공센터 외부



농산물종합가공센터 내부

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시농업과	과	장	송 호 철	☎ 940 - 4810
			팀	장	양 소 정	☎ 940 - 5208
			주	무	박 혜 림	☎ 940 - 5201

민통선 지역 가뭄 해결

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도·파주 <u>기타</u>	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	불요 제도 <u>재정</u> 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

【 민북지역 다목적 농촌용수개발 사업 착공】

- ▶ 천수답이 다수인 민북지역의 고질적인 물부족을 해소하고 항상 농업 용수 공급가능

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	민북지역 다목적 농업용수개발사업 착공

1 사업개요

- 위 치 : 파주시 군내면(5개리), 진동면(4개리), 장단면(1개리) 일원
- 수혜면적 : 625ha
- 사 업 비 : 46,871백만원(국비 100%)
- 사업기간 : 2021. ~ 2027.(7개년)
- 사업내용 : 양수장 1개소, 토출수조 1개소, 송수관로 L=0.76km, 용수관로 L=19.96km
- 시 행 자 : 한국농어촌공사

2 추진계획

- ## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	설계완료	착공	공사중	공사중	공사중	준공

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	2022	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년
계	46,871	1,225	5,500	10,333	9,250	9,000	11,563
국비	46,871	1,225	5,500	10,333	9,250	9,000	11,563
도비							
시비							
민자							

4

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
42,381	46,871	35,308	1,225	5,500	10,333	9,250	9,000	11,563		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
26,308	26,308				26,308	1,225	5,500	10,333	9,250	

5

- 2020. 4. 기본계획수립
- 2020. 6. 기본계획승인(농림축산식품부)
- 2021. 3. 최종 사업 확정(농림축산식품부)
- 2021. 5. 실시설계 착공
- 2022. 9. 민북지구 다목적 농촌용수 개발사업 주민설명회
- 2023. 3. 실시설계 완료 및 세부 일상감사 완료
- 2023. 7. 민북지구 다목적농촌용수개발사업 사업시행 승인(경기도)
- 2024. 1. 공사착공
- 2027. 12. 공사완료

6



위치도



현황도

7

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	농업정책과	과 팀 주 문	장 장 관	남 오 송	명 재 민	우 호 선	☎ 940 - 4560
								☎ 940 - 4598
								☎ 940 - 4592

스마트농업 연구개발센터 운영지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 거곡리 작물실증시험포장(평화농장)과 덕천리 미래농업시험포장(스마트팜 포장)을 고품질의 종자 공급과 중소농 맞춤형 스마트팜 교육 중심의 스마트농업 연구개발센터로 통합 운영

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	생산기반시설 착공

1 사업개요

- 사업위치
 - 작물실증시험포장(평화농장) : 장단면 거곡리 6번지 일원 / 21.7ha
 - 미래농업시험포장(스마트팜 농장) : 파평면 덕천리 481번지 일원 / 2.0ha
- 사업비 : 4,763백만원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년)
- 사업내용 : 작물실증시험포장(평화농장)과 미래농업시험포장(스마트팜농장)을 스마트농업 연구개발센터로 통합 운영
 - 대상부지 구역별 농림 생산 기반 조성 및 기초 토목공사 추진(농로, 용배수로 등)
 - 전략작물(벼·콩) 육성과 신소득 작목 발굴 및 스마트팜 농업인 양성

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	계획수립	설계/생산 기반착공	생산기반조성	기반조성완료	단계별 운영기반구축	운영지원 (계속)

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	4,763	350	451	657	1,143	1,410	752
국비	938	103		25	330	480	
도비	41					21	20
시비	3,784	247	451	632	813	909	732

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
6,415	4,763	4,763	801	657	1,143	1,410	752			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
4,763	938	41	3,784		3,587	422	652	1,108	1,405	

5 추진현황 및 계획

- 전략작목 벼·콩 육성을 위한 작물실증시험포장 운영
 - 벼·콩 보급종 농가 부족분 해결 및 우량종자 보급을 위한 채종포 조성
 - 전략작물 품종별 비교전시포 운영으로 지역에 맞는 품종 발굴
 - 무가온 온실 내 과수 및 약용작물 실증을 통한 신소득작목 육성
 - 파주 대표 토종콩 장단백목 복원을 위한 재배연구^{3년차}
 - 파주 장단콩 서리태 신품종 개발·보급(MOU) 추진^{4년차}
- 중소농 맞춤형 스마트팜 개발을 위한 미래농업시험포장 운영
 - 기후변화 대응을 위한 스마트농업 시설(스마트팜 실습교육장, 차세대 온실) 운영
 - 스마트농업 맞춤형 교육(기초과정·심화과정) 및 현장 컨설팅 추진
 - 파주형 스마트팜 내 신소득작목 발굴을 위한 실증 추진 : 고추냉이
 - 영농형태양광 재배모델 구축을 위한 실증시험포 운영
 - 지역에 맞는 특이 과채류 전시포 및 경관농업 실증재배
- 2023. ~ 2024. 농림 생산 기반 조성 및 기초 토목공사 추진※국비 신규 확보
- 2025. ~ 스마트농업 연구개발센터 조성 완료 및 운영
- 2026. ~ 농림축산식품부, 농진청 등 국비사업 공모 등 발전 추진

6 관련자료



파주시작물실증시험포장(평화농장)



스마트팜 농장

문제점 및 대책

○ 문제점

- 작물실증시험포장(평화농장) 및 미래농업시험포장(스마트팜 농장)은 구역별 농림 생산 기반 시설 미조성으로 체계적인 종자 생산, 작물 실증시험 연구 사업추진이 어려움(국도비사업은 부지 매입 및 기반 조성 예산지원 불가능)
- 피탄제거 부지는 작업 지연으로 공약 완료 후 추가 기반 조성 필요 ※2027년 이후 완료 예정

○ 대책

- 토지 기반 조성을 통한 구획 및 동선의 정비로 생산·관리 효율성 증진
- 기 기반조성을 근거로 농림축산식품부, 농촌진흥청 등 국비사업 유치 계속적 확대 발전 추진

공약사항 정책실명제	주관부서	기술보급과	과 팀 주 주 무 무	장 장 관 관 과	이 병 직 영 보 동 민 혜	☎ 940 - 4570
						☎ 940 - 4818
						☎ 940 - 4815
						☎ 940 - 4816

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 도시가스 미공급지역 도시가스 배관망 지원 및 LPG소형저장탱크 보급을 통한 연료비용 절감으로 보편적 에너지복지 확대</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> <div>달성목표</div> <div>에너지 복지 확대 (연 230가구↑)</div> </div>

1

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 파주시 관내 도시가스 미공급지역
- 사업내용 : 도시가스 배관망 및 LPG집단공급시설 설치
- 사 업 비 : 18,557백만원(도시가스 9,777 / LPG집단공급 8,780)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	230세대	230세대	230세대	230세대	230세대	230세대

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	18,557	3,690	3,480	3,460	3,800	4,127
국비						
도비	5,467	1,054	1,056	1,052	1,120	1,185
시비	6,345	1,212	1,236	1,232	1,300	1,365
민자	6,744	1,424	1,188	1,176	1,380	1,576

4 재정 집행실적

① 도시가스 보급

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
9,777	9,777	9,777	2,110	1,680	1,660	2,000	2,327	2,000

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
6,950		1,136	1,136	4,678	6,950	2,110	1,680	1,660	1,500	

② 소형LPG저장탱크 보급

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
8,780	8,780	8,780	1,580	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
9,352		3,741	4,676	935	9,352	1,480	3,652	2,580	1,640	

5 추진현황 및 계획

① 도시가스 보급 확대

- 2018.~ 2021. 파평 덕천리 등 11개 마을(913세대) / 58억원
- 2022. 적성 주월리(96세대), 광탄 용미4리(138세대) / 21억원
- 2023. 광탄 용미4리(155세대) / 16.8억원
- 2024. 광탄 용미4리(32세대), 용미3리(75세대) / 16.6억원
- 2025. 광탄 용미3리(69세대) / 15억원

② 소형LPG저장탱크 보급

- 2015.~2021. 문산 운천리 등 14개 마을(921가구) / 77.5억원
- 2022. 적성 객현1리(60세대) / 14.8억원
- 2023. 연다산동, 문산 사목1·3리, 마정2·3·4리(307세대) / 36억원
- 2024. 하지석동, 광탄 창만1리, 조리 뇌조3리(200세대) / 25억원
- 2025. 법원4리(80세대) / 16억원

6 관련자료

도시 가스		
	도시가스 관로 설치	정압기 설치
LPG 소형 저장 탱크		<div data-bbox="794 680 1086 1032"> <p>사업 전</p>  <p>우탈에 노출된 외부 화기안전판</p>  <p>용기 LPG저장시설</p> </div> <div data-bbox="1086 680 1469 1032"> <p>사업 후</p>  <p>배관시설 및 계량기 설치</p>  <p>저장탱크 및 보호시설 설치</p> </div>
	저장탱크 설치	사업 전후

7 문제점 및 대책

① 도시가스 보급 확대

○ 도시가스 공급을 원하는 마을수요 대비 사업비 부족

- 『경기도 도시가스배관망 지원사업』(도^{20%},시^{20%},도시가스사^{60%})으로 추진중으로 매년 총사업비 약15억원으로 1~2개 농촌마을을 선정하여 배관망 사업을 추진 중이나, 도시가스 공급을 원하는 마을 대비 사업비 부족

➡ 도에 사업비 지속 요구

② 소형LPG저장탱크 보급

○ 저장탱크 설치부지 확보 곤란

- 저장탱크를 설치할 수 있는 마을소유 부지 약 150㎡(45평)이 필요

➡ 대안으로 사업부지 내 국공유지 대체부지 지속협의

공약사항 정책실명제	주관부서	에너지과	과 팀 주 무 관	장 관 김 해 원 조 경 익 황 찬 혁	☎ 940 - 8499 ☎ 940 - 8468 ☎ 940 - 8431
---------------	------	------	-----------------	-----------------------------------	--

희망마을만들기 프로젝트 지속 지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 희망마을만들기 프로젝트 지속 지원 】

- ▶ 소도시 활성화
- ▶ 희망마을만들기 사업 추진

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	주민 주도적 소도시 활성화 추진

1 사업개요

① 소도시 활성화

- 사업기간 : 2026 1. ~ 12. (매년)
- 사업비 : 53.5백만원(시비 100%)
- 사업내용 : 도시재생 및 소도시 활성화 사업 추진

② 희망마을만들기 사업

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12. (매년)
- 사업비 : 120백만원(시비 100%)
- 사업내용 : 주민 스스로 마을의 문제점을 찾고 해결하는 주민주도형 희망마을만들기 사업을 통한 주민 및 지역역량 강화 및 단계별 공모 추진 역량 확보

2 추진계획

① 소도시 활성화

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	소도시 활성화	소도시 활성화	소도시 활성화	소도시 활성화	소도시 활성화	-

② 희망마을만들기 사업

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	마을만들기	마을만들기	마을만들기	마을만들기	마을만들기	-

3 연도별 투자계획

① 소도시 활성화

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	473.5	185	64	64	53.5	53.5	53.5
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	473.5	185	64	64	53.5	53.5	53.5
민 자	-	-	-	-	-	-	-

② 희망마을만들기 사업

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,341	-	882	100	120	119	120
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,341	-	882	100	120	119	120
민 자	-	-	-	-	-	-	-

4 재정 집행실적

① 소도시 활성화

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
505	473.5	473.5	249	64	53.5	53.5	53.5	지속추진		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
473.5			473.5		383	227	56	53	47	

② 희망마을만들기 사업

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
1,282	1,341	1,341	882	100	120	119	120	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,221			1,221		1,206	882	93	110	120	-

5 추진현황 및 계획

① 소도시 활성화

- 2020. 8. 특수상황지역개발사업 선정 ‘눈 내리는 초리골 조성’
- 2021. 12. 파주 눈내리는 초리골 축제 개최
- 2022. 10. ‘눈 내리는 초리골’ 주민역량강화 및 겨울 축제장 조성
- 2023. 4. 2023년 경기도 구석구석 관광테마골목 공모 선정
파주 돌다리 문화마을 골목(우수)
- 2025. 10. (돌다리 문화마을)모두의 골목축제 진행
- 2025. 11. 특화마을 환경개선 및 시설 유지보수
- 추진계획
 - 2026. 1. ~ 소도시 특화마을 환경개선 및 시설 유지보수
 - 2026. 1. ~ 소도시 특화마을 홍보지원

② 희망마을만들기 사업

○ 추진현황

사 업 현 황				(단위 : 백만원)
구 분	2023년	2024년	2025년	비 고
시 비	100	120	119	-
지원개소	5	4	6	-

- 2022. 1. ~ 12. 2022년 시민중심 마을만들기 사업 추진(18건)
 - * 사업유형별 (청년창작형 2개소, 농촌소득창출형 3개소, 정주환경개선형 7개소, 문화자원보존형 1개소, 생태자원관광형 5개소)
- 2023. 1. 2023년 희망마을만들기 사업 설명회 진행
- 2023. 2. ~ 12. 2023년 희망마을만들기 사업선정 및 추진(5개소)
- 2023. 10. 2024년 접경지역 주민자생적 마을활력 사업 선정(1개소)
- 2023. 12. 성과공유회 진행
- 2024. 4. 2024년 희망마을만들기 사업 설명회 진행
- 2024. 5. ~ 12. 2024년 희망마을만들기 사업 선정 및 추진(4개소)
- 2024. 12. 성과공유회 진행

- 2025. 2. 2025년 희망마을만들기 사업 설명회 진행
- 2025. 3. ~ 12. 2025년 희망마을만들기 사업 선정 및 추진(6개소)
- 2025. 12. 성과공유회 진행

6 관련자료

1 소도시 활성화



골목축제 사진

7 문제점 및 대책

1 소도시 활성화

- 해당없음

2 희망마을만들기 사업

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	균형개발과	과 팀 주무관	장 장 관	황인배 박재훈 조웅휘 조은수 조현철	☎ 940 - 5720 ☎ 940 - 4634 ☎ 940 -5728 ☎ 940 - 4635 ☎ 940 - 5347
---------------	------	-------	---------------	-------------	---------------------------------	---

미군 반환 공여지(캠프에드워즈)개발 추진

사업형태	사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

- ▶ 공여구역 및 주변지역 개발을 통한 낙후된 환경의
치유와 기반시설 설치로 지역경제 활성화 유도

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2026	사업착수

1 사업개요

- 위 치 : 월롱면 영태리 563-5번지 일원
- 면 적 : 686,615㎡(약 20.8만평)
- 사업기간 : 2021~2029
- 사 업 비 : 6,347억원(민자)
- 사 업 자 : 현대엔지니어링 컨소시엄

2 추진계획

- ### ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	인허가 행정절차	인허가 행정절차	인허가 행정절차	인허가 행정절차	실시계획인가 사업착수	사업준공

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	민간자본사업(비예산사업)						

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
		민간자본사업(비예산사업)						

추진현황 및 계획

- 2019. 3. 27. 민간 자유제안 공모
- 2020. 7. 5. 우선협상대상자 선정(현대엔지니어링 컨소시엄)
- 2020. 11. 30. 협약체결(市↔현대엔지니어링 컨소시엄)
- 2021. 10. 28. 사업시행승인 신청(현대엔지니어링 컨소시엄→市)
- 2021. 11. 10. 구역지정 및 개발계획 수립, 전략환경영향평가 주민의견 청취 공고
- 2022. 4. 1. 광역교통개선대책 협의 요청(사업자→道)
- 2022. 7. 6. 전략환경영향평가(본안) 의견 알림
- 2022. 12. 20. 발전종합계획 변경 확정
- 2024. 2. 19. 농림축산식품부 농지분야협의 완료
- 2026. 실시계획인가 및 사업착수
- 2029. 사업준공

관련자료



조감도



위치도

문제점 및 대책

- 군부대 협의 완료 후 市도시계획심의를 거쳐 사업시행승인을 위한 행정절차 신속 진행 필요

공약사항 정책실명제	주관부서	평화경제과	과 팀 장 문 장 과	정 해 오	☎ 940 - 5350
				오 창 용	☎ 940 - 5758
				유 정 여	☎ 940 - 5365

5 추진현황 및 계획

- 2020. 1. 16. 사업제안 및 민간사업자 공모 공고
- 2020. 6. 23. 우선협상대상자 선정(교보증권컨소시엄)
- 2020. 10. 20. 미군공여구역법령 개정(시행 2021.04.21.)
* (개정내용) 민간사업자는 재무건전성을 갖추어야 함.
- 2021. 5. 25. 도시개발사업 기본협약체결(파주시↔교보증권컨소시엄)
- 2021. 5. 25. 미군공여구역법 시행령 개정 <시행자 재무건전성 기준 마련>
- 2021. 7. 30. 제도개선 건의(파주시→국무조정실, 경기도)
- 2021. 10. 14. 제도개선 건의(경기도→행정안전부)
- 2021. 12. 28. 사업시행승인 신청 보완 통보(시행자 요건 충족 서류 제출)
- 2022. 2. 28. 행정안전부 지역균형발전과 방문 제도개선 건의
- 2022. 3. 25. 행정안전부 균형개발팀장 현장 방문(하우즈 외 4개소)
- 2022. 4. 21. 국무조정실 주한미군기지지원단 부단장 현장 방문(하우즈)
- 2022. 4. 29. 경기도 균형발전기획실장 현장 방문(하우즈)
- 2022. 5. 25. 국무조정실 반환공여지 워크숍 제도개선 발표
- 2022. 9. 23. 행안부 방문 시행령 개정 건의
- 2022. 9. 28. 캠프하우즈 도시개발사업 사업시행 승인 신청
- 2022. 10. 17. 행안부 시행령 개정 관련 전문가 자문회의 개최 참석
- 2022. 12. 8. 미군공여구역법 시행령 개정(안) 입법예고(~23.1.17.)
- 2023. 3. 7. 미군공여구역법 시행령 개정 공모 및 시행
- 2023. 5. 12. 사업시행자 지정(헤라파크도시개발PFV(주)*교보증권 수행법인)
- 2023. 9. 25. 市 도시계획심의 안전상정 요청
- 2023. 10. 12. 市 도시계획심의 개최(조건부 의결)
- 2023. 11. 28. 도시계획심의 조치계획 완료
- 2023. 2. 2. 중앙토지수용위원회 사업인정 협의 요청
- 2024. 3. 14. 중앙토지수용위원회 사업인정 심의 완료(조건부 동의)
- 2024. 4. 15. 사업시행(변경)승인
- 2025. 8. 29. 市 도시계획심의 개최(조건부 의결)
- 2026. 실시계획인가 및 사업착수
- 2029. 사업준공

6

관련자료



조감도



위치도

7

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

평화경제과

과
팀
주
무
장
장
관

정
오
백
해
창
상
오
용
호

☎ 940 - 5350
☎ 940 - 5358
☎ 940 - 5352

탄현지구 공동주택 건설 적극지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도·파주 <u>기타</u>	<u>임기내</u> 임기후	예산 <u>비예산</u>	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 탄현면 도시지역은 낙후되고 인구가 감소되는 추세로 축현리 일원상 공동주택 공급으로 인구 유입 및 지역 활성화 도모

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2025	민간분양아파트 준공 및 입주

1 사업개요

- 사업주체 : (주)신한자산신탁 / 대표 배일규
- 공급유형 : 민간분양 아파트 / 1,057세대, 8개동 / 시공사: 디엘건설
- 건축규모 : 170,706㎡ / 지하3층 ~ 지상25층 / 84㎡형
- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2025. 4.^{입주예정 '25. 5.}
- 사 업 비 : 2,500억원

2 추진계획

- ## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사착수	공사진행	공사진행	준공·입주	-	-

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	민간사업(비예산사업)						

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
		민간자본사업(비예산사업)						

추진현황 및 계획

- 2019. 12. 4. 건축·경관·교통 공동위원회 심의완료
- 2020. 9. 18. 주택건설사업계획 승인(공공지원 민간임대)
- 2021. 4. 30. 사업계획 변경 승인(공공지원 민간임대 → 일반분양)
- 2021. 5. 7. 구조심의 완료
- 2022. 5. 11. 감리자 선정 완료
- 2022. 8. 31. 착공신고 수리
- 2022. 9. 29. 사업계획 변경 승인(사업주체: 제영산업개발(주) → 신한자산신탁(주))
- 2022. 10. 13. 입주자모집공고 승인
- 2025. 4. 준 공 5월 입주

관련자료



조감도



위치도

문제점 및 대책

- 아파트 단지 개발로 소음·비산먼지 피해예상을 호소하는 민원 발생
- (대책) 사업시행자로 하여금 소음·비산먼지 피해를 예방할 수 있는 조치계획 마련 조치
- ※ 기존현황도로 일부 단절로 인한 통행불편사항은 지구단위계획변경으로 민원해소 완료

공약사항 정책실명제	주관부서	주택과	과 팀 주 문	장 장 과	김민섭	☎ 940 - 4750
					홍지범	☎ 940 - 4758
					김정삼	☎ 940 - 4751

유승앙브와즈 주거문제 법적개선

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	예산 <u>비예산</u>	불요 <u>제도</u> 재정 권한	<u>검토</u> 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 탄현면 유증앙브와즈의 용도변경(노유자시설 → 아파트) 통해 주거안정 도모

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2026	용도변경

1 사업개요

구 분	1 단지	2 단지
규 모 (동 / 층)	570세대(16/5)	510세대(14/5)
건 축 연 면 적	77,418m ²	70,974m ²
건 폐 율 / 용 적 률	24.9%/104.7%	24.6%/102.7%
허 가 (준 공) 일	2002. 6. 28. (2003. 12. 6.)	2002. 6. 28. (2004. 5. 21.)
용 도	노유자시설 (노인복지시설)	

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026~
목표	용도변경 추진	용도변경 추진	용도변경 추진	용도변경 추진	용도변경

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
국 비							
도 비							
시 비							
민 자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
			해	당	없	음				
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026

5 추진현황 및 계획

- 2016. 5. 통일동산 지구단위 변경(토지) 노인주택용지 → 공동주택용지
- 2016. 4. 국토부 관원질의 회신(現 주택건설기준에 적합해야 용도변경 可)
- 2020. 1. 파주시 감사관(옴부즈만) 고충민원 조사
 - * 현행 주택건설기준에 미달되어 아파트로 용도변경 불가.
 - * 관련법 기준 개정(특례조항)은 부동산 가격상승 특혜시비 우려
 - * 국민권익위에 조사결과 이송하여 재조사 검토 및 민원 종료
- 2022. 7. 유승 1,2단지 회장 방문, 서울 노원구 사례 접목하여 용도변경 요청
- 2022. 8. 유승양브와즈1단지 입주자대표회의 시청 방문 면담
- 2022. 9. 유승양브와즈1단지 입주자대표회의 면담

(주차장 증설 계획 검토 요청, 노원구 변경 사례 자료 협조 관련)
- 2022. 10. 노원구 용도변경 사례(중앙하이츠아쿠아) 절차 및 관련 법 적용 사항 확인을 위한 벤치마킹
- 서울 노원구 사례(중앙하이츠아쿠아 용도변경) 검토 결과
 - 노원구 사례는 「주택법」을 준용하여 사업계획승인 처리됨
 - 유승양브와즈는 「건축법」에 따라 건축허가를 득한 건축물로 사례분석 결과 참고대상이 될 수 없어 향후 검토대상에서 제외
- 「주택법」에 따른 사업계획승인 등 절차 이행 여부 검토
 - 현행 주택건설 기준 계획수립 방안 마련
 - 일부 반대 입주자를 포함한 소유자 100% 동의 추진
- 광역교통시설부담금 부과 대상 및 소방시설 추가 설치 여부 등 기타 관련법에 의한 필수 이행사항 검토



위치도



전경

○ 유승앙브와즈 공동주택(아파트)으로 용도변경 이행

- 「주택법」에 따른 주택건설사업 사업계획승인 절차를 이행하여야 하나, 슬라브 두께, 대피공간 확보, 동간 이격거리, 대지 안 공지, 단지 및 주동 계획 등 건물의 배치 및 구조 기준이 현행 주택건설기준에 미달

※ 추가 시공 불가능한 현행 주택건설기준 존재

○ 전체 입주민 의견 수렴 및 의견 일치 조율 과정 필요

- 소유자 100% 동의 시 주택건설사업계획승인 절차 진행
 - 1가구 2주택, 부동산 중과세, 아파트 청약 등의 사유로 반대 입주자 존재

공약사항
정책실명제

주관부서

주택과

과
팀
주

장
장
무

김민섭
홍지범
김정삼

☎ 940 - 4750
☎ 940 - 4758
☎ 940 - 4751

시민중심 자족도시

-환경은 길이다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[11-1]	생태친수공간 조성도 시 관 리 과
[11-2]	환경순환센터 현대화 사업자 원 순 환 과
[11-3]	폐기물처리시설 주변 지역주민 인센티브 확대자 원 순 환 과
[11-4]	파주북부주민에게 안전한 수돗물 제공상 수 도 과
[11-5]	공공하수처리시설 확충하 수 도 과
[11-6]	파주형 공유자전거 도입교 통 정 책 과

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,970	20	1,950	-	-	-	-
국비	700	-	700	-	-	-	-
도비	300	-	300	-	-	-	-
시비	970	20	950	-	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026		
1,970	1,970	1,970	1,970	-	-	-	-	-	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	기집행	2022	2023	2024	2025
1,970	700	300	950	-	1,814	20	809	985		

* 정부, 경기도 직접 시행 사업비 제외

5 추진현황 및 계획

- (공 룡 천) 환경부 시행
 - 2021. 12. 공룡지구 착공
 - 2025. 7. 공룡지구 준공
- (문 산 천) 파주시 시행
 - 2022. 12. 물놀이장 착공
 - 2023. 6. 개장식 및 운영 개시
- (갈 곡 천) 경기도·파주시 시행
 - 2023. 6. 친수하천 마스터플랜 수립 완료
- (금 촌 천) 경기도 시행
 - 2021. 5. 상류부 신속 공사 요청
 - 2022. 2. 실시설계 착수(금촌천 하천정비 사업)
 - 2024. 11. 실시설계 준공(금촌천 하천정비 사업)
 - 2025. 1. 보상 협의 진행
- (금 촌 천) 파주시 시행
 - 2023. 8. 금촌천 산책로 조성 공사 착공
 - 2024. 12. 금촌천 산책로 조성 공사 완료
- (청룡두천) LH 시행
 - 2023. 11. 건천 방지 대책 실시설계 착수
 - 2025. 12. 청룡두천 친수공간 조성 실시설계 완료
 - 2026. 1. 공사 발주

6

관련자료

< 문산천 물놀이장 조성 >



7

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

도시관리과

과
팀
주 무

장
장 관

임 상 범
김 경 준
박 상 혁

☎ 940 - 8700
☎ 940 - 8408
☎ 940 - 8405

환경순환센터 현대화 사업

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행단계						
신규	<u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	임기내	<u>임기후</u>	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표

- ▶ 유기성 폐자원을 이용해 생산된 재생에너지(바이오가스)를 생산함으로써 탄소중립에 기여하고, 악취를 개선하여 지역 주민에게 쾌적한 생활환경 제공

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	공사 착공

1 사업개요

- 위 치 : 파주읍 봉암리 1038-4번지 일원(환경순환센터)
- 사업량 : 통합바이오가스화시설 160톤/일(가축분뇨 90, 음식물 70)
 - 유기성폐자원(가축분뇨, 음식물)을 혐기소화하여 생산된 바이오가스 활용
 - 발생폐수 파주LCD공공폐수처리시설에 연계처리하여 문산천 수질 개선
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2027. 2.
- 사업비 : 437억원(국비 312 / 도비 23 / 시비 102)

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	실시설계	환경영향평가 공사착공	시설공사	시설공사	시설공사	정상운영

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	43,749	1,404	250	1,043	6,970	16,057	18,025
국비	31,176	350	200	800	3,240	12,166	14,420
도비	2,338	44	25	60	243	912	1,054
시비	10,235	1,010	25	183	3,487	2,979	2,551
민자	-	-	-	-	-	-	-

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026		
47,619	43,749	43,749	1,404	250	1,043	6,970	16,057	18,025		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	기집행	2022	2023	2024	2025
43,749	31,176	2,338	10,235		25,724	1,404	250	1,043	6,970	16,057

5 추진현황 및 계획

- 2019. 1. 타당성 조사 용역 착수
- 2020. 4. 타당성 조사 적정 의견 통보(한강유역환경청)
- 2020. 7. 지방재정중앙투자심사 통과(행정안전부)
- 2020. 8. 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
- 2021. 5. 경기도 기술심의위원회 심의결과 통보(설계·시공 일괄입찰^{탄키방식})
- 2021. 10. 시설공사 입찰공고
- 2022. 6. 기본설계 적격심의(적격 : 97.7점)
- 2022. 7. 실시설계 적격자 통보(금호건설(주) 컨소시엄)
- 2023. 6. 실시설계도서 제출(금호건설(주) 컨소시엄)
- 2023. 10. 환경영향평가 협의 완료
- 2023. 11. 우선시공분 착공
- 2024. 5. 재원협의 및 실시계획인가
- 2024. 11. 본공사 착공
- 2027. 2. 시설공사 준공 및 시운전 완료

6 관련자료



조감도



착공식('23.12.6.)

문제점 및 대책

- 환경순환센터 주변지역 피해 보상 및 주민편익시설 설치 요구
 - 파주시 환경순환센터 주변지역 지원에 관한 조례 제정(2024. 4. 공포)
 - ☞ 시설 가동 이후 유기성폐자원 처리 수수료의 10%에 해당하는 금액을 주민지원사업 재원으로 조달하여 주변지역 지원사업 실시

공약사항 정책실명제	주관부서	자원순환과	과 팀 주 문	장 장 문 과	심재우 경형구 차지수	☎ 940 - 4730
						☎ 940 - 4778
						☎ 940 - 4772

폐기물처리시설 주변 지역주민 인센티브 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 신설 소각장 주변지역 주민에 대한 혜택을 확대하여 주민친화적인 자원순환시설 건립

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2026	주민편익시설 설치 사업 추진

1 사업개요

- 위 치 : 탄현면 낙하리 산 12-1번지 일원
- 사 업 량 : 시설용량 700톤/일(광역), 400톤/일(단독) 중 택1
- 사업내용 : 소각장 신·증설에 따른 주변영향지역 주민지원 확대
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2030. 12.

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	입지선정	입지선정	입지선정	전략환경영향평가	입지결정고시	폐기물처리시설 설치계획승인

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년 미	'23년	'24년 정	'25년	'26년
계	-						
국 비	-						
도 비	-						
시 비	-						
민 자	-						

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
미정	미정							미정

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
-					-					

5 추진현황 및 계획

- 2021. 4. 폐기물처리시설 입지선정계획 결정·공고
- 2021. 7. 입지후보지 선정 결과 알림 (신청지 3개소 중 2개소)
- 2021. 11. 입지선정위원회 회의 실시(1차)
- 2022. 3. 타당성조사 용역 착수
- 2023. 11. 입지선정위원회 회의 실시(2차)
- 2023. 12. 입지선정위원회 회의 실시(3차)
- 2024. 2. 입지선정위원회 회의 실시(4차)
- 2024. 3. 입지선정위원회 입지후보지 현장답사
- 2024. 5. 입지선정위원회 회의 실시(5차)
- 2024. 7. 입지선정위원회 회의 실시(6차)
입지타당성 조사과정 및 결과개요 공고
- 2024. 9. 입지선정위원회 회의 실시(7차)
전략환경영향평가 초안 제출
- 2024. 10. 전략환경영향평가 초안 주민설명회 개최
- 2025. 12. 전략환경영향평가 본안 협의
- 2026. 6. 입지결정고시
- 2027. 12. 폐기물처리시설 설치계획 고시(주민지원사업 포함)
- 2029. 6. 폐기물처리시설 주변영향지역 고시
- 2031. 9. 시설운영 및 주변영향지역 지원 실시

6

위치도(신청부지)



탄현면 낙하리 산12-1번지 일원

7

문제점 및 대책

- 소각장 입지 결정 및 환경상 영향조사 결과에 따라 주변영향지역 지정·고시 후 주민지원사업 실시

공약사항
정책실명제

주관부서

자원순환과

과 팀 주 무
장 장 관

심 재 우
경 형 구
김 현 기

☎ 940 - 4730
☎ 940 - 4778
☎ 940 - 4766

파주북부 주민에게 안전한 수돗물 제공

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 파주 북부 주민의 수질확보 및 급수체계 변경 (배수지), 용수량 확보로 안전한 수돗물 제공

공약달성목표

달성
연도

2025

달성목표

공사준공

1 사업개요

■ 수돗물의 수질 안정성 확보 및 강화

(원 수) 수소이온농도 등 주기별 수질검사
(정 수) 일반세균 등 58항목 검사 글로벌 수질기준
(급 수) 수돗물 안심확인제 운영 개인급수 수질검사

■ 급수체계 변경 (⇒ '덕은배수지 신설')

북부지역의 수돗물 공급의 안정적 수량 확보를 위해
'LCD산단' 및 '주변지역' 급수체계 변경

■ 용수배분 확보

- 광역상수도 - (교하) 65.5천톤/일 (월릉) 97천톤/일
- 원수대체 - 96천톤/일 【문산정수장】
- ※ 운정신도시 등 용수공급을 위하여 생활용수 27.3천톤/일, LCD 등 공업용수 35.1천m³/일 추가 확보 계획

☞ "2035년까지 용수확보(배분계획) 완료"

《 덕은배수지 건설 》

- 사 업 명 : 파주시 상수도 6단계 확장사업 (덕은배수지 신설)
- 위 치 : 월릉면 덕은리 산14-4번지 일원
- 사 업 량
 - ▶ 배수지 1개소(V=7,000m³)
 - ▶ 가압장 1개소(Q=12,500m³/일)
 - ▶ 송·배수관로 L=7.3km
- 사 업 비 : 230억원(시비)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 6.
- 급수구역 : 문산읍, 탄현면, 월릉면 등
- 수 혜 도 : 28,256명 / 12,115톤

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사착공	공사추진	공사추진	공사준공		

3 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	23,000		10,220	6,600	6,180		
국비							
도비							
시비	23,000		10,220	6,600	6,180		
민자							

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
23,000	23,000	23,000	10,220	6,600	6,180					
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
23,000			23,000		22,788	3,336	3,266	9,992	6,194	

추진현황 및 계획

- 2019. 5. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 11. 도시관리계획(수도공급설비) 결정 및 실시계획인가
- 2022. 1. 일반수도사업 인가(한강유역환경청)
- 2022. 7. 공사 착공
- 2023. 3. 토지보상 완료
- 2023. 12. 배수지 토목공사(보강토 옹벽 설치)
- 2024. 7. 진입도로(콘크리트 옹벽 설치), 송·배수관로 L=3.7km
- 2025. 6. 공사 준공

관련자료



위치도



조감도

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	상수도과	과 팀 주 문	장 장 문 관	정	정	희	☎ 940 - 5510
					강	재	경	☎ 940 - 5488
					도	성	환	☎ 940 - 5482

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	27,353	4,775	-	210	6,534	6,367	9,467
국비	18,452	3,204	-	100	4,409	4,296	6,443
도비	3,954	686	-	21	945	921	1,381
시비	4,947	885	-	89	1,180	1,150	1,643

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026	
9,302	27,353	24,353	4,775	210	6,534	6,367	6,467	3,000

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
27,353	18,452	3,954	4,947		14,902	840	251	6,791	7,020	

5 추진현황 및 계획

- 2016. 6. 위·수탁 협약 체결(과주시 ↔ 한국환경공단)
- 2016. 8. 설계용역 착수
- 2018. 10. 하수도정비기본계획 변경 승인 완료
- 2020. 12. 공법선정(H-SBR)
- 2022. 3. 환경부 재원협의 승인(9,302백만원 → 27,353백만원)
- 2023. 10. 도시관리계획 결정(변경) 고시(도시계획과)
- 2023. 11. 공공하수도 설치인가(道→市), 감정평가 의뢰
- 2023. 12. 건설사업관리용역(건설기술심의 완료) 및 공사 발주
- 2024. 1. 건설사업관리용역 착수
- 2024. 5. 공사착공(24개월)
- 2024. 12. 공사중지(동절기, 2024.12.23.~2025.02.28.)
- 2025. 3. 공사 재착공
- 2025. 7. 도시계획시설(소로2-광탄11) 실시계획인가 고시
- 2025. 10. 공사 1차분 준공
- 2025. 11. 공사 2차분 착공
- 2025. 12. 공사중지(동절기, 2025.12.22.~2026.02.28.)
- 2026. 8. 공사준공

6

관련자료



위치도



조감도

7

문제점 및 대책

- 광탄 공공하수처리시설 증설부지 공사 반대(신산5리 주민 일원)
 - 지속적인 주민들의 요구 사항 협의를 통해 “공사 반대” 민원 해소 완료

공약사항
정책실명제

주관부서

하수도과

과
팀
주 무

장
장 관

윤 주 영
배 진 국
안 원 회

☎ 940 - 5530
☎ 940 - 5528
☎ 940 - 5522

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>▶ 파주시와 공유 이동장치(전기자전거·전동킥보드) 민간사업자간 업무협약을 통해 공유 이동장치 관리·운영의 효율성을 제고하고, 운영 구역 확대 추진.</div> </div> </div>	<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>파주형 공유 이동장치(운영체계) 도입</div> </div> </div>

1

사업개요

○ 관내 공유자전거 현황

구분	일레클	카카오T바이크	지쿠	비고
업체명	나인투원	카카오모빌리티	지바이크	
운영구역	운정·금촌·문산	운정	운정	비도시제외
배치장소	철도역, 상업지역, 학교 등			

○ 공약이행 검토사항

- 파주시는 택지개발 등으로 인구가 집중되어 있는 운정·금촌·문산 지역을 대상으로 이미 (민간)공유자전거 운영 중. ^{3개사업자}
- 이에 따라 상당규모의 예산과 운영인력은 물론 민간과의 경쟁이 요구되는 (공공)공유자전거를 새롭게 도입하기 보다는 현재 도입되어 있는 (민간)공유자전거에 대한 효율적인 운영·관리 등 서비스 개선을 통해 시민들에게 쾌적한 자전거 이용환경을 제공하는데 집중할 필요. ^(효과성)
- 공약의 개념을 (공공)공유자전거를 도입한다는 취지보다는 현재 운영 중에 있는 공유자전거에 대해 파주시와 민간사업자간 업무협약을 통해 파주형 공유자전거 운영체계 도입으로 정립하고자 함.

※ 친환경 교통수단인 개인형 이동장치(전동킥보드) 사업자를 포함하여 협약 체결

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	계획수립	협약 체결 및 운영	운영서비스 개선	운영서비스 개선	운영서비스 개선	

3 연도별 투자계획

○ 해당없음

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
			해	당	없	음				
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026

5 추진현황 및 계획

- 2023. 7. 공유자전거 사업자 사전 협의
- 2023. 8. 파주시 공유 이동장치 간담회 1차
- 2023. 10. 파주시 공유 이동장치 간담회 2차
- 2023. 12. 파주시 공유 이동장치 간담회 3차
- 2023. 12. 파주형 공유 이동장치 운영체계 도입, 상호협력 업무협약 체결
- (참여업체) 나인투원, 더스윙, 디어코퍼레이션, 빔모빌리티, 지바이크,
카카오모빌리티, 피유앰피 ▶ 총 7개사
- 2024. 2. 공유 이동장치 주차구역 설치계획 수립
- 2024. 4. 파주시 공유 이동장치 간담회 4차
- 2024. 6. 공유 이동장치 주차구역 확충(17개소)
- 2024. 11. 파주시 공유 이동장치 간담회 5차
- 2024. 12. 공유 이동장치 주차구역 확충(13개소)
- 2025. 1. 파주시 공유 이동장치 간담회 6차
- 2025. 1. 공유 이동장치 주차구역 확충(2개소)

- 2025. 3. 파주시 공유 이동장치 간담회 7차
- 2025. 6. 파주시 공유 이동장치 간담회 8차
- 2025. 9. 파주시 공유 이동장치 간담회 9차
- 2025. 11. 파주시 공유 이동장치 간담회 10차
- 2025. 12. 공유 이동장치 주차구역 확충(25개소)

6 관련자료

- 파주형 공유 이동장치 운영체계 도입, 상호협력 업무협약서

파주형 공유 이동장치(운영체계) 도입을 위한 상호협력에 관한 업무협약서

파주시와 나인투원, 더스윙, 디어코퍼레이션, 빔모빌리티, 지바이크, 카카오모빌리티, 피유엠피(이하 '운영체제')는 파주형 공유 이동장치(운영체계) 도입을 위해 다음과 같이 업무협약을 체결한다.

※ 공유 이동장치란 운영사가 민간에 (대여)서비스하고 있는 전동킥보드와 전기자전거를 의미.

제1조(목적) 본 협약은 파주시와 운영사간 긴밀한 협조체계를 구축하여 파주형 공유 이동장치(운영체제) 도입을 추진함으로써 친환경 교통수단 이용 활성화에 기여하고, 탄소중립 실천을 위해 노력하는 것을 목적으로 한다.

제2조(협력분야) 각 기관은 다음 각호의 사항이 원활히 수행될 수 있도록 긴밀히 협력한다.

- 1. 파주시**
자전거 이용 활성화 정책 수립(정책제정) 및 행정 지원
개인형 이동장치 이용 활성화를 위한 행정 지원
- 2. 운영사**
공유 이동장치 사업구역내 기반시설 확충(정비)
공유 이동장치 관련 시민불편 최소화 및 서비스 개선

제3조(비밀유지) 협약 체결기관은 본 협약에 외거한 업무를 수행함에 있어 취득한 일체의 사실이나 자료를 상호 간 사전 합의 없이 다른 목적에 사용하거나 외부에 공개 또는 제공하지 아니한다.

제4조(협약의 변경) 각 기관은 상호 협의하여 본 협약의 내용을 변경할 수 있다.

제5조(효력발생 및 협력기간) 본 협약서의 효력은 서명한 날로부터 발생하며, 유효기간을 1년으로 하되 상호간의 이의제기가 없을 경우 자동적으로 1년씩 연장한다. 본 협약에 명시되지 아니한 사항은 상호 협의하여 추진한다.

각 기관은 협약내용을 확인하고 이를 증명하기 위해 본 협약서를 8부 작성하고 각각 서명한 후 1부씩 보관한다.

2023년 12월 13일

파 주 시 시 장	나인투원 대표이사 alecio	더스윙 대표이사 SWING	디어코퍼레이션 대표이사 deer
빔모빌리티 대표이사 beam	지바이크 대표이사 GCOO	카카오모빌리티 대표이사 T	피유엠피 대표이사 영웅

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	교통정책과	과장 모빌리티팀장 주무관	우 상 완 강 민 구 김 나 연	☎ 940 - 5770 ☎ 940 - 5628 ☎ 940 - 5625
---------------	------	-------	---------------------	-------------------------	--

시민중심 자족도시

-행정은 새롭다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[12-1]	원스톱 맞춤 행정서비스 체계 구축 민 원 여 권 과
[12-2]	청년·여성 명예시장제 운영 자 치 협 력 과
[12-3]	시장직속 시민사회소통관 신설 행 정 지 원 과
[12-4]	파주시정연구원 설립 미 래 전 략 관
[12-5]	파주시 시청사 증축 공 공 건 축 과
[12-6]	파주시 행정융합지원센터 건립 추진 공 공 건 축 과
[12-7]	운정3동 행정복지센터 조기 착공 추진 공 공 건 축 과
[12-8]	[조리·광탄]행정복지센터 조기 증축 완료 공 공 건 축 과
[12-9]	금촌 민·군 복합커뮤니티센터 조기 건립 공 공 건 축 과

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	세부계획 수립	운영기반 마련	콜센터 운영			

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,920		22	1,330	748	905	915
국비							
도비							
시비	3,920		22	1,330	748	905	915
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
4,200	3,920	3,920	22	1,330	748	905	915	925

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,920			3,920		3,061	21	1,434	706	900	-

5 추진현황

- 2022. 7. ~ 9. 민원콜센터 정보화 전략계획 용역 완료
 - ▶ 파주시 민원콜센터 공간 및 인력규모 등 설계
- 2022. 10. 민원콜센터 구축 공간확정 및 세부계획 수립
- 2023. 2. 「파주시 민원콜센터 설치 및 운영에 관한 조례」 제정
- 2023. 3. ~ 4. 민원콜센터 시스템 구축을 위한 절차 이행
- 2022. 6 ~ 12. 민원콜센터 시스템 구축 사업 추진
- 2023. 4. ~ 9. 부서별, 업무별 표준상담 DB 구축 (855건)
- 2023. 1. ~ 5. 상담원 운영방안 검토 및 확정 → 민간위탁
- 2023. 5. ~ 10. 상담원 민간위탁 운영을 위한 사전절차 이행
 - 2023. 5. 25. 민원콜센터 상담원 민간위탁 운영 심의 (적정)
 - 2023. 9. 18. (제241회 임시회)민원콜센터 운영 민간위탁 의회 동의안 통과
 - 2023. 10. 13. 민간위탁 적격자심사위원회 (위탁사업자 (주)Ktis 선정)
- 2023. 11. ~ 12. 위탁사업자 상담원 구성 완료 및 기본업무교육 시행
- 2023. 11. 민원콜센터 시스템 구축
- 2023. 12. 7. 콜센터 시범 운영^(단계별 운영) (2023. 12. 18. 개소)
- 2024. 1. ~ 민원콜센터 정식 운영 (상담 범위 단계적 확대)

파주시 민원콜센터 구축완료...시범운영 돌입

에너지경제신문 | 입력 2023.12.06 02:28



▲파주시 4일 민원콜센터 구축사업 완료보고회 개최. 사진제공=파주시

시민과 행정 연결...‘파주시 민원콜센터’ 정식 운영

| 지난 18일 개소식 개최

입력 : 2023-12-19 10:58



경기 파주시는 민원, 교통, 문화, 복지 등 시정에 대한 문의 및 민원 채널을 하나의 창구로 일원화한 ‘파주시 민원콜센터’의 운영을 시작했다고 19일 밝혔다.

지난 18일 열린 민원콜센터 개소식에는 김진기 파주시 부시장과 이성철 파주시의장, 시의원, 기관단체 대표와 상담실 관계자 등 40여명이 참석해 현판제막, 상담사와 소통의 시간을 가졌다.

시는 민원콜센터 운영을 위해 지난 11월까지 시스템 구축과 상담원 운영에 대한 준비를 마쳤고 지난 7일부터 시범운영을 시작했다. 시범운영 결과 등을 바탕으로 영상상담, 챗봇 상담 서비스, 1대 1 문자상담 등 상담 범위와 운영 경로를 단계적으로 확대·적용할 예정이다.

시민 누구나 파주시 민원콜센터를 이용하면 단순 민원 문의는 상담사가 직접 안내하고 담당 부서 상담이 필요한 경우, 상담사가 담당 부서를 확인하여 연결하고 있으며 상담과 동시에 필요한 정보를 문자로 받아 볼 수 있다. 민원콜센터에는 총 15명의 상담사가 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 근무한다.

김진기 부시장은 “상담사들이 소통의 최일선에서 자부심을 갖고 임해주기를 바라며, 파주시 민원콜센터가 시민과 행정을 연결하는 ‘더 편하고’ 더 가까운 행정의 결실로 이어지길 기대한다”라고 말했다.

공약사항
정책실명제

주관부서

민원여권과

과장
팀장
주무관

서병권
김경희
유수연

☎ 940 - 4180
☎ 940 - 4188
☎ 940 - 4173

청년·여성 명예시장제 운영

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	예산	<u>비예산</u>	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표

- ▶ 다양한 분야에서 활동 중인 시민들에게 시정참여 기회를 제공하고 의견을 수렴함으로써 소통·참여행정 실현

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	명예시장 운영

1 사업개요

- 운영기간 : 1월~12월(월2회 / 둘째, 넷째 수요일)
 - * 위촉식 : 당일 09:30 시장 접견실
- 신 분 : 일일 명예직 ※ 단, 오찬 및 출장 교통편의 제공
- 대 상 : 파주시에 주소지 또는 사업장을 두고 있는 모든 시민

(기존) 청년·여성 → (변경) 모든 시민으로 위촉 대상 확대

※ 2024. 6. 27. 개최된 「2024 시민대토론회」 시민 건의사항 반영

- 역 할 : [정책제안] 시정 의견 제시 [회의참석] 시장주재, 위원회 등
[시정홍보] SNS, 언론 등 [현장방문] 시책사업 현장 등
- 추진실적 : 총 51명 위촉(2025. 12. 31.기준)

2 추진계획

- ## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	연간계획 수립	일일 명예시장제 운영				

3 연도별 투자계획

- 해당없음

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
			해	당	없	음		

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
	해	당	없	음		해	당	없	음	

5 추진현황

○ 명예시장 위촉현황

연도	위촉 분야(회)							비고
	계	농업	문화	복지	교육	기술	학생	
계	51	5	10	14	8	8	6	
2023	20	1	3	7	3	3	3	제1대~제20대
2024	15	1	4	5	3	2	0	제21대~제35대
2025	16	3	3	2	2	3	3	제36대~51대

○ 명예시장 간담회: 5회 개최

6 관련자료



위촉식



간담회

7 문제점 및 대책

○ 제9회 전국동시지방선거 실시 관련, 공직선거법 제86조 2항을 준수하여 4.4.~6.3. 기간 미운영

공약사항 정책실명제	주관부서	자치협력과	과 팀 주	장 장 무	이 창 우 차 병 호 김 민 지	☎ 940 - 2970 ☎ 940 - 4968 ☎ 940 - 4962

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	90		30	60			
시 비	90		30	60			


재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
270	90	90	30	60				

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
90			90		90	30	60			

추진현황 및 계획



- 2022. 8. **시민사회소통관 임용(자치협력과)**
- 2023. 1. **시민소통 역할의 확대·강화를 위해 시장 직속 소통홍보관 설치**
(조직개편 완료 및 시민사회소통관 재배치)
- 2024. 1. **시민사회소통관 폐지^(의원면직) 후 SNS소통팀을 활용한 업무 수행**
(시민사회소통관 → 팀단위 업무수행 / 소통업무 고도화)

관련자료

- 해당없음

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	행정지원과	과 팀 주 무	장 장 관	최 연 안 현 박	경 정 호	☎ 940 - 4100
							☎ 940 - 8607
							☎ 940 - 8604

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도·파주·기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한
					검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>▶ 전문적인 분석을 통한 체계적인 정책개발로 책임 있는 정책수립에 기여하고 나아가 지속가능한 시정 발전을 도모코자 함</div> </div> </div>	<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2026</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>파주시정연구원 설립</div> </div> </div>

1

사업개요

- 사업명 :

(가칭)파주시정연구원 설립
- 설립기준 :

인구 50만^(「주민등록법」에 따른 주민 수) 이상의 市
- 내용 :

정책연구 전담 연구원 설립으로 체계적 연구지원 시스템 구축

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표	시정연구 기반 조성	타당성 검토 연구용역 완료	타 지자체 모니터링	타 지자체 모니터링, 자체 정책연구	연구원 설립

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,250	-	-	50	-	-	2,200
국비							
도비							
시비	2,250	-	-	50	-	-	2,200
민자							

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
2,250		2,250	-	50	-	-	2,200			-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
50	-	-	50	-	50	-	50	-		

5

추진현황 및 계획

- 2022. 10. 타지역 시정연구원 벤치마킹 실시(고양시, 화성시)
- 2023. 1.~6. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 추진
- 2023. 5. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 중간보고(시의회)
- 2023. 6. 시의회 행정사무감사 결과 (→시정 · 개선 요구)
- 2023. 8.~9. 타 지자체 현장방문 및 운영사례 파악 (→문제점 확인)
- 2024. ~ 타 지자체 연구원 운영현황 지속 모니터링
- 2025. ~ 정책현안 여론조사 · 컨설팅 강화
- 2026. ~ AI과 신설 등 인공지능을 활용한 정책 연구 수행

6

문제점 및 대책

- 타 시정연구원 운영사례 조사 결과, 인재 채용의 어려움과 잦은 이직으로 인한 업무 연속성 저해 등 구조적 인력운영 문제가 확인되어, 이에 대한 근본적 개선 방안 마련 전까지는 설립 시기 조정이 불가피함.
- ⇒ 정책현안 여론조사 · 컨설팅을 통해 시민의견 수렴, 전문가 컨설팅을 활용한 정책 방향 설정 및 정책 고도화
- ⇒ AI과 신설 등 조직 개편을 통해 인공지능을 활용한 정책 연구 수행

공약사항
정책실명제

주관부서

미래전략관

과장
팀장
주무관

이성호
신민철
이준

☎ 940 - 4230
☎ 940 - 2958
☎ 940 - 2951

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
220	190,275	660			275	385		189,615

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
660			660		274			274		

5 추진현황 및 계획

- 2022. 10. 파주시 시민주도형 신청사 건립 추진계획 수립
- 2022. 12. 「파주시 공론화 추진에 관한 조례」 제정
- 2023. 5. 파주시 신청사 건립 공론화 추진계획 수립
- 2023. 6. ‘파주시 공론화위원회’ 구성 및 위촉
- 2023. 8. 공론화 제안 및 공론화 실시 의결
- 2024. 4. 공론화 설계 용역 추진
- 2024. 8. 후보지 평가모형 개발 및 평가 연구 용역 추진
- 2024. 9. ‘파주시 시청사 공론화 실행단’ (시민추진단) 구성
- 2024. 10. 공론화 실행용역 추진
- 2024. 11. ‘시민참여단’ 구성
- 2024. 12. 공론화 토론회 개최 및 결과 정책권고(공론화위원회→파주시)
- 2025. 7. 정책권고 사항 검토 및 증축 사업계획 수립
- 2025. 8. 용역과제 사전심의 및 정례보고회(타당성조사 및 기본계획 용역)
- 2025. 9. 시청사 증축 기자회견
- 2025. 11. 타당성조사 및 기본계획 용역 착수
- 2025. 11. ~ 2027. 6. 타당성 조사 용역 및 의뢰(LOMAC)
- 2027. 투자심사 및 도시계획 시설결정
- 2028. 설계공모
- 2029. 기본 및 실시설계
- 2030. 계약심사 및 공사입찰
- 2030. ~ 2032. 착공 및 준공

6

관련자료



위치도



조감도(안)

7

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

공공건축과

과
팀
주 무 관

장
장 관

배 성 진
김 윤 성
김 예 림

☎ 940 - 5270
☎ 940 - 5757
☎ 940 - 5759

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
115,300	115,300	162	162					115,138		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
162			162		162	162				

5 추진현황 및 계획

- 시민주도 청사건립 방향 결정에 따라 사업추진
 - 2020. 3. 공유재산관리계획 의회 승인
 - 2021. 3. 도시관리계획(공공청사) 결정(변경) 고시
 - 2022. 3. 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 행정융합지원센터는 시청사 증축 진행상황에 따라 사업계획 변경이 수반되는 사업으로 타당성조사 재심사 등 행정절차 재추진 필요

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과	장	배 성 진	☎ 940 - 5270
			팀	장	이 준 희	☎ 940 - 5278
			주	무	관 신 동 하	☎ 940 - 5274

운정3동 행정복지센터 조기 착공 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 행정구역 개편 및 운정3동 인구증가에 따른 행정·민원편의를 위해 별도 행정복지센터 건립이 시급해 운정3동 행복센터 조기 착공

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2024	공사 착공

1 사업개요

- 사업위치 : 야당동 1022번지-7번지 외 1필지 / 4,300㎡
- 시설규모 : 연면적 4,423.54㎡(1,300평) / 지하1층 ~ 지상4층
- 주요시설 : 행정복지센터, 주민자치센터, 청소년 휴카페
- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2026. 3.
- 예 산 : 180억원(시비 172, 특조비 8)
 - 공사비 160억원 / 설계·감리비 20억원

2 추진계획

- ### ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 3.	임기후
목표	도시관리계획 등 변경 및 설계공모	설계 완료	착공	시공	준공	-

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	18,000	335		625	11,790	5,250	
국비							
도비							
시비	17,200	335		625	11,790	4,450	
민자							
특조비	800					800	

4

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
17,800	18,000	18,000	187	689	4,240	9,459	3,425	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	특조비	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
18,000	-	-	17,200	800	14,575	187	689	4,240	9,459	-

5

- 2020. 10. 운정3동 청사분리 계획수립 (자치행정과)
- 2021. 2. 지방재정 투자심사 완료 (경기도)
- 2021. 11. 행정복지센터 건립계획 변경(위치변경, 사업비 증액)
- 2022. 7. 공공건축 사업계획 사전검토 완료 (경기도 공공건설지원센터)
- 2023. 1. 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 4. 설계용역 중간보고 및 주민설명회
- 2023. 8. 건축인허가 접수
- 2023. 12. 기본 및 실시설계 완료
- 2024. 5. 공사 착공
- 2026. 3. 공사 준공 및 개청

6



.....
 위치도



조감도

7

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과	장	배 성 진	☎ 940 - 5270
			팀	장	김 윤 성	☎ 940 - 5757
			주 문 과	화 인 대	☎ 940 - 5754	

조리읍·광탄면 행정복지센터 조기 증축 완료

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 노후된 조리읍 행정복지센터 및 광탄면 행정복지센터 조기 준공으로 민원업무 편리성 증대, 지역주민 문화 프로그램 이용 확대를 통한 시민의 삶의 질 향상에 기여

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	공사 준공

1 사업개요

① 조리읍 행정복지센터

- 사업위치 : 조리읍 봉일천로 64(봉일천리 188-6,-9)
- 시설규모 : 연면적 4,581.69㎡(지하1층 / 지상4층)
- 사업비 : 145억원(건축비 133 / 기타부대비 등 12)
- 사업기간 : 2019. 5. ~ 2022. 8

② 광탄면 행정복지센터

- 사업위치 : 광탄면 혜음로 1044 / 대지면적 6,611㎡(2,003평)
- 시설규모 : 연면적 1,194㎡(362평), 지상2층, 주차48대(법정18대)
- 주요시설 : 주민자치센터 1개동, 창고 1개동
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 8.
- 사업비 : 38.88억원(시비)

2 추진계획

① 조리읍 행정복지센터

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	준공	-	-	-	-	-

② 광탄면 행정복지센터

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	준공	-	-	-	-	-

3 연도별 투자계획

① 조리읍 행정복지센터

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	14,524	11,178	3,346				
국 비							
도 비							
시 비	13,924	10,578	3,346				
기 타	600	600					

② 광탄면 행정복지센터

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,888	1,030	2,858				
국 비							
도 비							
시 비	3,888	1,030	2,858				
민 자							

4 재정 집행실적

① 조리읍 행정복지센터

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
14,524	14,524	14,524	14,524							
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	기타	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
14,524			13,924	600	4,467	4,467				

② 광탄면 행정복지센터

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
3,888	3,888	3,888	3,888							
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
3,888			3,888		2,965	2,965				

5 추진현황

① 조리읍 행정복지센터


- 2019. 4. 지방재정 투자사업 심사
- 2019. 9. 건축설계공모
- 2019. 11. 중기지방재정계획 반영
- 2020. 5. 지방재정투자 재심사
- 2020. 10. 기존 청사 철거
- 2020. 12. 공사 착공
- 2022. 8. 공사 준공

② 광탄면 행정복지센터

- 2019. 8. 경기도 지방재정 투자심사 승인
- 2019. 12. 공유재산관리계획 승인
- 2020. 11. 설계공모 공고
- 2021. 9. 기본 및 실시설계 완료
- 2021. 12. 공사착공
- 2022. 8. 공사완료
- 2022. 12. 시설개선 공사

6 관련자료

① 조리읍 행정복지센터

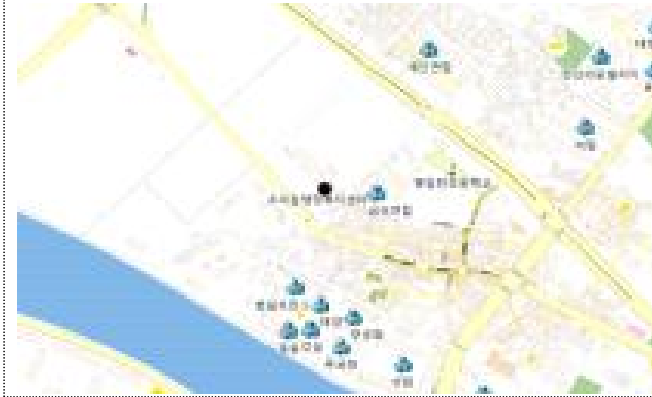

위치도



전경사진

② 광탄면 행정복지센터



위치도



현장사진

7 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과	장	배 성 진	☎ 940 - 5270
			팀	장	이 준 희	☎ 940 - 5278
			주 무 관		김 윤 성	☎ 940 - 5757
					이 선 미	☎ 940 - 5276
					황 인 대	☎ 940 - 5754

금촌 민·군 복합커뮤니티센터
조기 건립

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행 단계					
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표

▶ 금촌 민.군 복합커뮤니티센터 준공(24년)

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2024	공사 준공

1 사업개요

- 사업위치 : 금촌동 947-28번지(3,842㎡ / 1,162평)
- 시설규모 : 연면적 5,658㎡(1,711평), 지하2층/지상4층, 주차50대
 - 기존건물 리모델링 및 수직·수평 증축
- 주요시설 : 청년창업 및 골목상권 컨설팅센터, 청년키움스토어, 청소년네트워크센터, 맘카페·장난감도서관, 도시재생지원센터, 사회적경제·마을공동체 지원센터, 여성커뮤니티센터 등
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 286억원(국비 94 / 도비 3 / 시비 189)
 - 총사업비 : 토지비 112억원, 공사비 149억원, 설계비·감리비 23억원, 기타 2억

2 추진계획

- ## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사착공	공사진행	공사준공			

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	28,681	14,105	4,325	9,651	600		
국비	9,420	1,600	3,180	4,640			
도비	284		168	116			
시비	18,977	12,505	977	4,895	600		
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
30,300	28,681	28,681	18,430	9,651	600					
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
28,681	9,420	284	18,977		14,576	4,325	9,651	600		

5 추진현황 및 계획

- 2020. 5. 지방재정 투자심사(자체) 심의(적정)
- 2020. 6. 舊 등기소·법원 부지매입
- 2020. 8. 특수상황지역개발사업 신규사업 선정(행안부)
- 2021. 3. 지방재정 투자심사(중앙) 심의(조건부)
- 2022. 6. 기본 및 실시설계완료, 계약심사(경기도)
- 2022. 7. ~ 8. 계약심사 및 공사입찰 등
- 2022. 10. 공사 착공
- 2024. 6. 공사 준공 및 시운전

6 관련자료



보도자료



준공사진

7 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과	장	배 성 진	☎ 940 - 5270
			팀	장	이 준 희	☎ 940 - 5278
			주	무	관	신 동 하
